

기숙사 및 사택 7월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	B-A (차액)	A/B (요율)
					45,251,000	39,323,500	==>일성-일반(16 건)		-15%
					14,782,000	12,119,550	==>동운(5 건)		-22%
					60,033,000	51,443,050	7월 마감건(21 건)	- 8,589,950	-17%
1	07월31일	사택 5-103 화장실 건축 누수보수	활석,방수공 삭제 (직영->특별인부)	2023-06-30	4,774,000	3,796,900	일성건축	- 977,100	-26%
2	07월31일	사택 5-103 화장실 매립배관 교체	재질변경 (동관->PB변경)	2023-06-30	3,031,000	1,900,600	동운	- 1,130,400	-59%
3	07월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	상반기 긴급 누수건 정산	2023-06-30	7,356,000	6,343,575	동운	- 1,012,425	-16%
4	07월31일	사택 2동 현관 도어보수 및 캐노피 도장작업		2023-07-11	1,456,000	1,411,475	일성건축	- 44,525	-3%
5	07월31일	기숙사 및 사택 건물 외벽 보수		2023-07-11	4,020,000	3,695,850	일성건축	- 324,150	-9%
6	07월31일	기숙사 B동 702-4호 도배보수의 2건	기타보수 및 중복세대 제외	2023-07-11	4,521,000	1,658,725	일성건축	- 2,862,275	-173%
7	07월31일	사택 2-305 수장공사	기타보수 제외	2023-07-11	3,684,000	2,982,050	일성건축	- 701,950	-24%
8	07월31일	사택 8-205 수장공사	운반공 축소 (2인->1인)	2023-07-19	5,287,000	4,789,125	일성건축	- 497,875	-10%
9	07월31일	사택 8-205 썬크대 철거 타일 붙임후 재설치		2023-07-13	824,000	795,500	일성건축	- 28,500	-4%
10	07월31일	사택 8-205 주방벽 철거 및 타일교체		2023-07-12	1,325,000	1,284,625	일성건축	- 40,375	-3%
11	07월31일	기숙사 AB동 세대용 공동현관 방화문 보수		2023-07-20	2,050,000	1,966,175	일성건축	- 83,825	-4%
12	07월31일	사택 2-405 방충망틀 제작설치		2023-07-13	460,000	452,575	일성건축	- 7,425	-2%
13	07월31일	사택 5-103외 1세대 누수분배기 및 배관교체		2023-07-20	1,225,000	1,256,675	동운	31,675	3%
14	07월31일	기숙사 AB동 기계실 급수 펌프탱크 교체	운반공 축소 (2인->1인)	2023-07-20	2,170,000	1,898,450	동운	- 271,550	-14%
15	07월31일	기숙사 A동 903-3호 배수배관 통수 및 교체	배관공 축소 (2인->1인)	2023-06-30	1,000,000	720,250	동운	- 279,750	-39%
16	07월31일	기숙사 3동 1층 아름누리 휴게실 조성(건축)		2023-07-17	2,470,000	2,348,875	일성건축	- 121,125	-5%
17	07월31일	기숙사 3동 111호외 1세대 도배보수		2023-07-20	1,120,000	1,105,100	일성건축	- 14,900	-1%
18	07월31일	기숙사 A동 401-1호외 3세대 도배보수		2023-07-20	2,240,000	2,211,275	일성건축	- 28,725	-1%
19	07월31일	사택 101-202 수장공사		2023-07-20	5,050,000	4,954,675	일성건축	- 95,325	-2%
20	07월31일	사택 101-202 베란다 누수보수(전면)		2023-07-13	920,000	915,900	일성건축	- 4,100	0%
21	07월31일	사택 103-101 수장공사		2023-07-19	5,050,000	4,954,675	일성건축	- 95,325	-2%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.06.30- 2023.06.30
공 사 명	사택 5-103 화장실 건축 누수보수		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		철거(작업중)	철거(작업중)
작업사진				
내 용	방수(작업전)		방수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

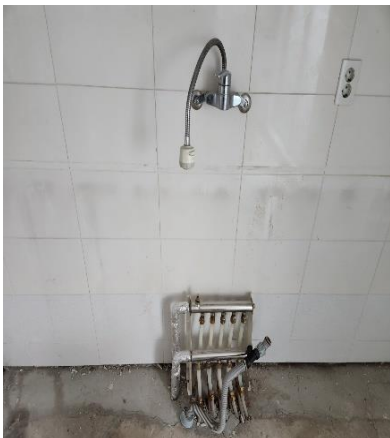
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.06.09-2023.06.17
공 사 명	사택 5-103 화장실 매립배관 교체		제출일자	2023.06.16
작업사진				
	내 용	작업위치	기존 배관 철거 전	기존 배관 철거 전
작업사진				
	내 용	기존 배관 철거	기존 배관 철거	기존 배관 철거
작업사진				
	내 용	배관을 위한 터파기	급수,급탕 배관 작업	급수,급탕 배관 작업

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.06.09-2023.06.17
공 사 명	사택 5-103 화장실 매립배관 교체	제출일자	2023.06.16
작업사진			
내 용	급수,급탕 배관 작업	급수,급탕 배관 작업	기밀 테스트
작업사진			
내 용	기밀 테스트	기밀테스트	위생도기 설치
작업사진			
내 용	위생도기 설치	금구류 설치	금구류 설치

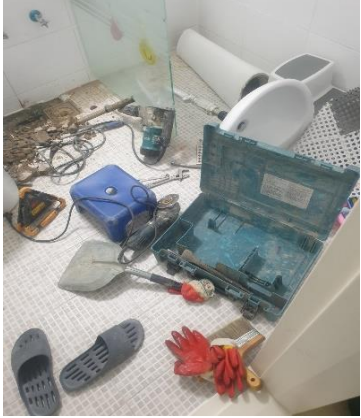
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-01-25
공 사 명	사택 2-103 누수 난방분배기 교체		제출일자	2023-01-26
작업사진				
내 용	작업위치	난방분배기 교체 작업 전	난방분배기 교체 작업 중	
작업사진				
내 용	난방분배기 교체 작업 완료			
작업사진				
내 용				

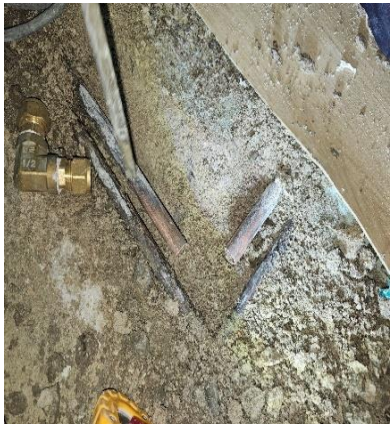
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.04.19
공 사 명	사택 5-501호 긴급 보수 작업		제출일자	2023.04.19
작업사진				
내 용	누수 탐지 작업		누수 부위 확인	누수부위 확인
작업사진				
내 용	용접 작업		타일 부착 작업	
작업사진				
내 용				

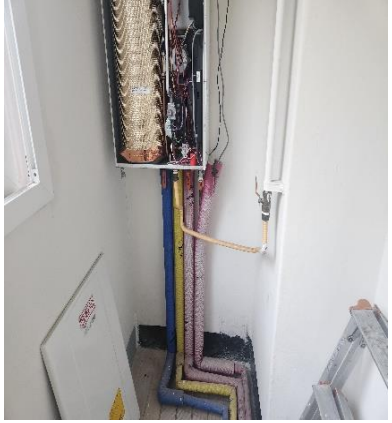
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.04.12
공 사 명	사택 5-501호 누수 탐지 작업		제출일자	2023.04.12
작업사진				
내 용	누수 탐지 작업	누수 탐지 작업	타일 철거 및 터파기	
작업사진				
내 용	누수 배관 확인			
작업사진				
내 용				

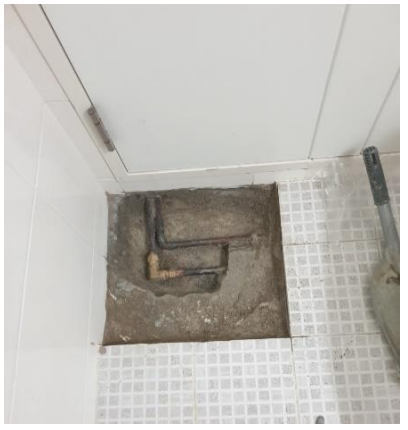
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.05.18
공 사 명	사택 8-506호 누수 탐지 보수작업		제출일자	2023.05.18
작업사진				
	내 용	누수탐지 작업	누수 부위 확인	누수부위확인
작업사진				
	내 용	기존 배관 철거	배관 연결 작업	시멘트 몰탈 작업
작업사진				
내 용	시멘트 몰탈 작업			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.04.04
공 사 명	사택 9-101호 누수 탐지 작업		제출일자	2023.04.04
작업사진				
내 용	누수 육안 확인		누수 육안 확인	누수 탐지 준비
작업사진				
내 용	누수 탐지 준비		압력테스트	압력테스트 이상무
작업사진				
내 용	압력테스트 이상무			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.03.28
공 사 명	사택 9-403호 긴급 보수 작업	제출일자	2023.03.29
작업사진			
내 용	작업전 보양 작업	누수부위 확인 및 보수	누수부위 확인 및 보수
작업사진			
내 용	수압테스트	타일 부착 작업	
작업사진			
내 용			

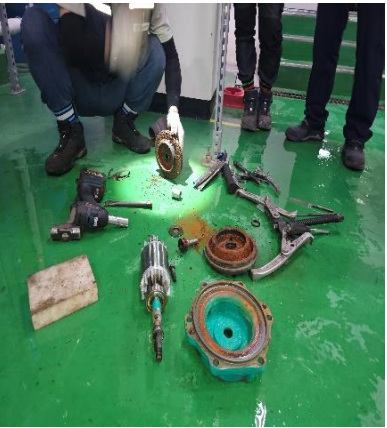
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.04.17
공 사 명	사택 9동 음식물 처리기 급수 배관 보수		제출일자	2023.04.17
작업사진				
내 용	음식물 처리기 급수 배관 파손		음식물 처리기 급수 배관 파손	음식물 처리기 급수 배관 파손
작업사진				
내 용	음식물 처리기 급수 배관 파손	급수 배관 교체	급수 배관 교체	
작업사진				
내 용	급수 배관 교체	보온 작업	보온 작업	

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.06.22
공 사 명	사택 5-401호 오수배관 누수 보수		제출일자	2023.06.22
작업사진				
	작업위치	오수배관 누수 부위 확인	실리콘 코킹 및 마감테이핑 작업	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.05.08
공 사 명	A.B동 기계실 급탕 대류펌프 보수 작업		제출일자	2023.05.08
작업사진				
내 용	급탕 순환펌프 보수 전		기존 펌프 철거	
작업사진				
내 용	펌프 분해 작업		베어링 교체	
작업사진				
내 용	메카니칼씰 교체		펌프 정비 완료	
			펌프 재설치 완료	


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.10- 2023.07.12
공 사 명	사택 2동 현관 도어보수 및 캐노피 도장작업		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업전)	도장(작업중)
작업사진				
내 용	도장(작업중)		도장(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.10- 2023.07.11
공 사 명	기숙사 및 사택 건물 외벽 보수		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

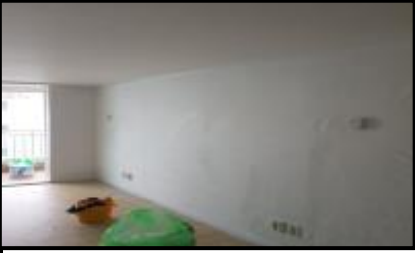
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.11- 2023.07.11
공 사 명	기숙사 B동 702-4호 도배보수외 2건		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.04 - 2023.07.11
공 사 명	사택 2-305 수장공사		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.03 - 2023.07.19
공 사 명	사택 8-205 수장공사		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.10 - 2023.07.13
공 사 명	사택 8-205 싱크대 철거 타일 붙임후 재설치		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.10 - 2023.07.12
공 사 명	사택 8-205 주방벽 철거 및 타일교체		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업후)	
작업사진				
내 용	타일(작업중)		타일(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.20 - 2023.07.20
공 사 명	기숙사 AB동 세대용 공동현관 방화문 보수		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

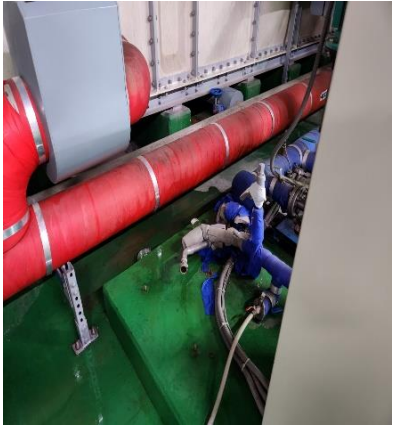
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.13 - 2023.07.13
공 사 명	사택 2-405 방충망틀 제작설치		제출일자	2023.07.20
작업사진	  			
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

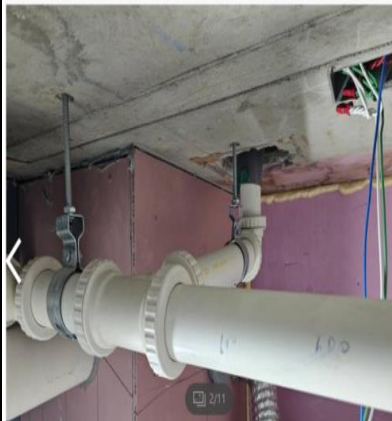
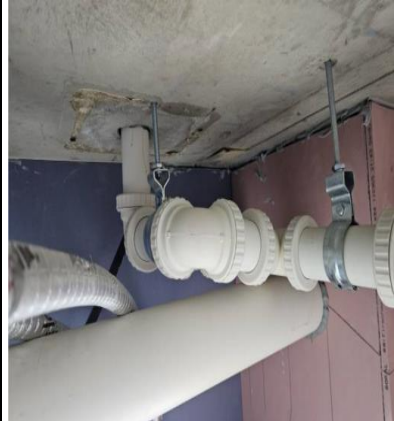
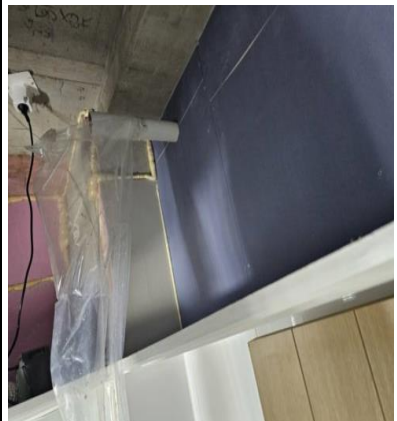
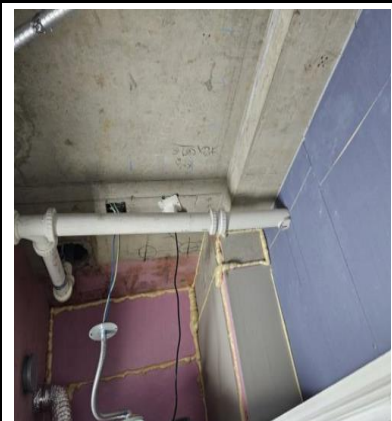
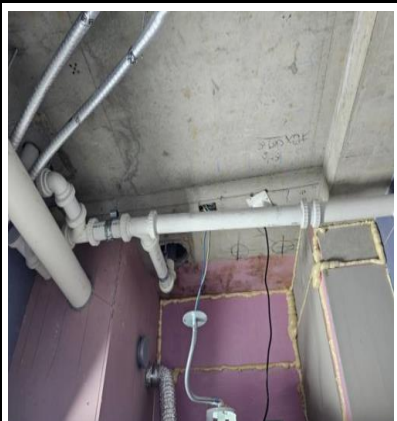
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.07.17
공 사 명	사택 5-103외 1세대 누수분배기 및 배관교체	제출일자	2023.07.25
작업사진			
내 용	5동 103호 변경전	5동 103호 변경후	5동 103호 변경후
작업사진			
내 용	8동 205호 변경전	8동 205호 변경후	8동 205호 변경후
작업사진			
내 용			

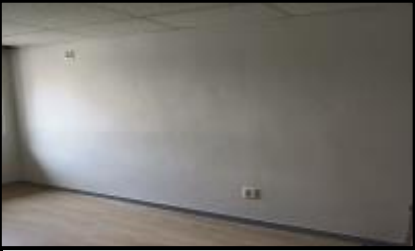
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.07.17
공 사 명	기숙사 AB동 기계실 급수 팽창탱크 교체	제출일자	2023.06.08
작업사진			
내 용	팽창탱크 교체 전	신규 팽창탱크	기존 설비 철거
작업사진			
내 용	팽창탱크 교체 완료		
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.07.12
공 사 명	기숙사 A동 903-3호 배수배관 통수 및 교체		제출일자	2023.07.12
작업사진				
	배관 철거 작업 전		배관 철거 작업 전	
작업사진				
	배관 철거 및 통수 작업		이물질 발견 제거	
작업사진				
	배관 재조립 작업		작업 완료	
내 용	배관 재조립 작업		작업 완료	작업 완료

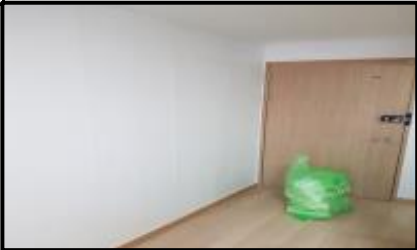

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.12 - 2023.07.17
공 사 명	기숙사 3동 1층 아름누리 휴게실 조성(건축)		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도장(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	도어락(작업전)			
작업사진				
내 용	도어락(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

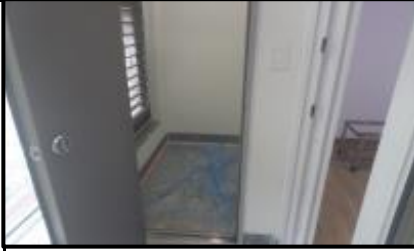
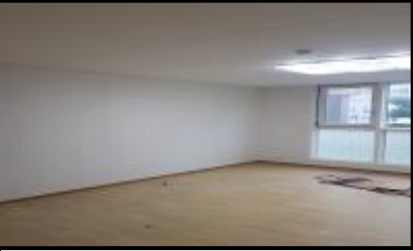
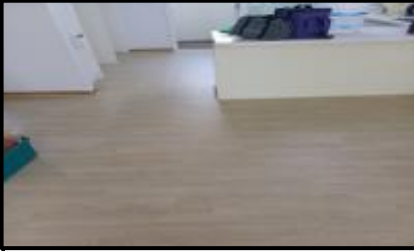
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.20 - 2023.07.20
공 사 명	기숙사 A동 401-1호외 3세대 도배보수		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.20 - 2023.07.20
공 사 명	기숙사 A동 401-1호외 3세대 도배보수		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.13 - 2023.07.20
공 사 명	사택 101-202 수장공사		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.13 - 2023.07.13
공 사 명	사택 101-202 베란다 누수보수(전면)		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.12 - 2023.07.19
공 사 명	사택 103-101 수장공사		제출일자	2023.07.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	구 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-305호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	12					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	20	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	22	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	16	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	뒤베란다 벽단열재 들뜸 및 크랙전체보수, 보일러 연통 내열실리콘 보수, 거실 내부샤시 방충망(1개)교체, 앞베란다 외부샤시창문 시트지제거, 주방샤시창문시트지제거, 문골림(뒤베란다문-1곳)							
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.07.25)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-205호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타	주방(난방분배기교체, 수전배관이설, 타일교체), 앞베란다 방충망(1개)교체, 문골림(뒤베란다창고문)							
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.07.25							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 23.07.25							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_103동-101호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	70	✓	✓			
5.기타	주방좌측방 창문 천정 누수점검 및 보수, 현관 바닥타일 보수 또는 교체, 거실 및 뒤베란다 창문 시트지 제거, 거실우측방 불박이장 옷걸이 스텐봉(1개)설치							
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.07.25							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_101동-202호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70	✓	✓			
5.기타	뒤베란다 시트지제거, 거실좌측방 문틀시트지 부분보수, 거실화장실 욕조배수관 교체, 앞베란다 걸레받이 방수도장, 거실, 주방 걸레받이 보수 또는 교체, 문골림-2곳(거실우측방, 거실좌측방)							
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.07.25							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							
