

기숙사 및 사택 11월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

23-11-21

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	B-A (차액)	A/B (요일)
					88,826,000	85,622,575	==>일성-일반(21 건)		-4%
					2,576,000	2,225,250	==>하이엠솔루텍(1 건)		-16%
					63,567,000	48,108,612	==>동운(1 건)		-32%
					4,875,000	3,719,500	==>이에이치솔루텍(1 건)		-31%
					23,185,000	18,737,200	==>대양이엔씨(2 건)		-24%
					183,029,000	158,413,137	10월 마감건(26 건)	- 24,615,863	-16%
1	11월30일	사택 9-105 수장공사		11월 10일	4,870,000	4,794,500	일성건축	- 75,500	-2%
2	11월30일	사택 9-206 수장공사		11월 10일	4,870,000	4,794,500	일성건축	- 75,500	-2%
3	11월30일	사택 101동 및 102동 옥상 철구조물 지주 보수		11월 1일	5,155,000	4,993,375	일성건축	- 161,625	-3%
4	11월30일	사택 2-307 기타 보수		9월 19일	1,427,000	1,383,525	일성건축	- 43,475	-3%
5	11월30일	사택 2-307 수장공사		9월 22일	3,565,000	3,498,050	일성건축	- 66,950	-2%
6	11월30일	사택 5-302 수장공사		11월 20일	4,601,000	4,521,450	일성건축	- 79,550	-2%
7	11월30일	사택 5-302 내부 창호교체(고층장비)		11월 9일	11,182,000	10,766,075	일성건축	- 415,925	-4%
8	11월30일	사택 5-302 불박이장 신설(고층)		11월 16일	2,736,000	2,623,000	일성건축	- 113,000	-4%
9	11월30일	사택 5-302 씽크대 교체(고층장비)		11월 16일	4,573,000	4,350,525	일성건축	- 222,475	-5%
10	11월30일	기숙사 3동 지하 당직실 누수 보수(건축)	표준단가(시중가) 하락분 반영 벽돌 쌓기(3.6m 이하)/ 우레탄 PIR(난연)	10월 26일	6,921,000	6,238,225	일성건축	- 682,775	-11%
11	11월30일	기숙사 3동 지하 당직실 누수 보수(전기)		11월 10일	6,422,000	6,074,825	대양이엔씨	- 347,175	-6%
12	11월30일	사택 5-302 주방벽 철거 및 타일교체		11월 10일	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
13	11월30일	사택 5-306 수장공사		11월 20일	4,601,000	4,521,450	일성건축	- 79,550	-2%
14	11월30일	사택 5-306 내부 창호교체(고층장비)		11월 8일	11,182,000	10,766,075	일성건축	- 415,925	-4%
15	11월30일	사택 5-306 불박이장 신설(고층장비)		11월 17일	3,444,000	3,293,800	일성건축	- 150,200	-5%
16	11월30일	사택 5-306 씽크대 교체(고층)		11월 17일	3,865,000	3,678,650	일성건축	- 186,350	-5%
17	11월30일	사택 5-306 주방벽 철거 및 타일교체		11월 10일	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
18	11월30일	사택 8-307 수장공사		11월 20일	4,877,000	4,789,125	일성건축	- 87,875	-2%
19	11월30일	사택 8-307 씽크대 교체(고층장비)		11월 15일	4,877,000	4,640,775	일성건축	- 236,225	-5%
20	11월30일	사택 8-307 주방벽 철거 및 타일교체		11월 10일	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
21(K)	11월30일	사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체	주말 활동 제외 (S&H 단가계약 적용)	11월 19일	2,576,000	2,225,250	하이엠솔루텍	- 350,750	-16%
22(K)	11월30일	사택 지붕 보수용 한식 기와 구입 및 도장		11월 9일	1,874,000	1,828,575	일성건축	- 45,425	-2%
23(K)	11월30일	기숙사 3동 1층 아름누리 휴게실 환기구 설치		10월 31일	291,000	287,025	일성건축	- 3,975	-1%
24	11월30일	기숙사 AB동 교장 보일러 교체(기계)	보일러 정지 작업 최소화 (환절기 교체)	11월 10일	63,567,000	48,108,612	동운	- 15,458,388	-32%
25	11월30일	기숙사 AB동 교장 보일러 교체(전기)	보일러 정지 작업 최소화 (환절기 교체)	11월 10일	16,763,000	12,662,375	대양이엔씨	- 4,100,625	-32%
26	11월30일	기숙사 AB동 교장 보일러 교체(가스)	보일러 정지 작업 최소화 (환절기 교체)	11월 10일	4,875,000	3,719,500	이에이치솔루텍	- 1,155,500	-31%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.05- 2023.11.10
공 사 명	사택 9-105 수장공사		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.06- 2023.11.10
공 사 명	사택 9-206 수장공사		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.16 - 2023.11.01	
공 사 명	사택 101동 및 102동 옥상 철구조물 지주 보수		제출일자	2023.11.20	
작업사진					
내 용	보수(작업전)		철거(작업중)		메쉬보강(작업중)
작업사진					
내 용	거푸집(작업후)		타설(작업후)		다듬기(작업중)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		도장(작업후)		도장(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.09.13- 2023.09.17
공 사 명	사택 2-307 기타보수	제출일자	2023.11.20
작업사진			
내 용	도어보수(작업전)	벽체보수(작업전)	방충망(작업전)
작업사진			
내 용	도어보수(작업후)	벽체보수(작업후)	방충망(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)		
작업사진			
내 용	문보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.14 - 2023.09.22
공 사 명	사택 2-307 수장공사		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.11.10 - 2023.11.20
공 사 명	사택 5-302 수장공사		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.30- 2023.11.08
공 사 명	사택 5-302 내부 창호교체(고층장비)		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	
작업사진				
내 용	설치(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.11.16- 2023.11.16
공 사 명	사택 5-302 불박이장 신설(고층)	제출일자	2023.11.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.11.16- 2023.11.16
공 사 명	사택 5-302 싱크대 교체(고층장비)	제출일자	2023.11.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.09.20- 2023.10.26
공 사 명	기숙사 3동 지하 당직실 누수 보수(건축)		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	바닥철거(작업전)		바닥철거(작업후)	바닥보강(작업후)
작업사진				
내 용	배수로 방수(작업후)		벽체(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	장판(작업후)		블라인드(설치후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	10월 30일
공 사 명	기숙사 3동 지하 당직실 누수 보수(전기)		제출일자	11월 22일
작업사진				
내 용	작업 전		판넬 설치	판넬 설치
작업사진				
내 용	판넬 설치		컨트롤러 설치	작업완료
작업사진				
내 용	작업완료			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.26 - 2023.11.10
공 사 명	사택 5-302 주방벽 철거 및 타일교체		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		타일(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.11.09 - 2023.11.20
공 사 명	사택 5-306 수장공사		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.30 - 2023.11.08
공 사 명	사택 5-306 내부 창호교체(고층장비)		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	
작업사진				
내 용	설치(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.11.17- 2023.11.17
공 사 명	사택 5-306 불박이장 신설(고층장비)	제출일자	2023.11.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

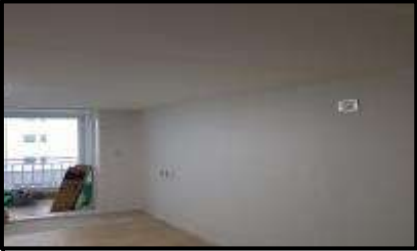
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.11.17- 2023.11.17
공 사 명	사택 5-306 싱크대 교체(고층)	제출일자	2023.11.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.30 - 2023.11.08
공 사 명	사택 5-306 주방벽 철거 및 타일교체		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		타일(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.11.08 - 2023.11.20
공 사 명	사택 8-307 수장공사		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.10.31- 2023.11.15
공 사 명	사택 8-307 싱크대 교체(고층장비)	제출일자	2023.11.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[illegible]

전열교환기 소자 및 필터 교체 전 , 후 측정 값

교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
달님반	24.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	20.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
해님반	24.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교사실	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
원장실	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	17.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	7.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14:30	-10.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-4.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 24 PM2.5기준 13 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : `23.11.18 / 권용주 매니저

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

전열교환기 소자 및 필터(고효율 필터 포함) 작업 사진 및 신품 사진



전열교환기 소자 및 필터(고효율 필터 포함) 교체품 사진

별님반 교체 전.후



달님반 교체 전.후



은하수반 교체 전.후



무지개반 교체 전.후



2층 식당 교체 전.후



해님반 교체 전.후





오염 필터 제거



필터 조립



고효율 필터 조립





에어세척 전



에어세척 중



에어세척 후



세척전



약품투여



고압세척



세척후



세척전



약품투여



고압세척



세척후



작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후



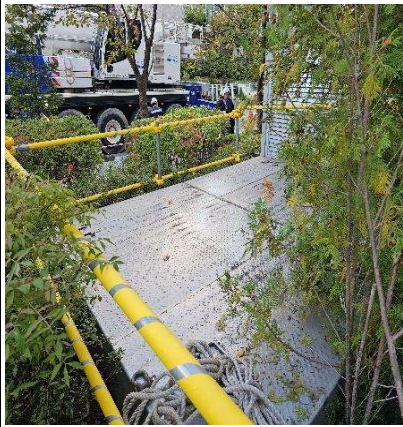
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.11.09 - 2023.11.09
공 사 명	사택 지붕 보수용 한식 기와 구입 및 도장		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업중)	
작업사진				
내 용	도장(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.31 - 2023.10.31
공 사 명	기숙사 3동 1층 아름누리 휴게실 환기구 설치		제출일자	2023.11.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)	설치(작업중)	설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.10.11~2023.11.13
공 사 명	기숙사 AB동 고장보일러 교체 공사	제출일자	2023.11.22
작업사진			
내 용	안전 휀스 설치	LOTO	기존 보일러 철거 작업
작업사진			
내 용	기존 보일러 철거 작업	기존 보일러 반출	차량 상차
작업사진			
내 용	폐기물 처리장 이동	폐기 완료	자산 번호

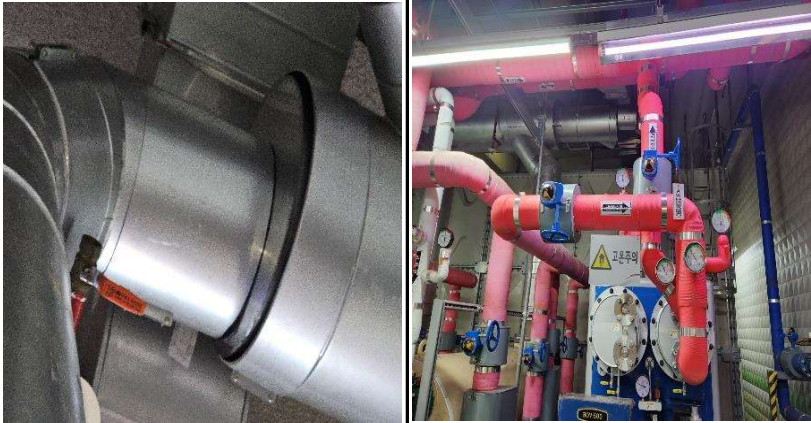
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.10.11~2023.11.13
공 사 명	기숙사 AB동 고장보일러 교체 공사	제출일자	2023.11.21
작업사진			
내 용	보일러 스펙	신규 보일러 반입	보일러 반입
작업사진			
내 용	보일러 반입 후 배관 정리 작업	보일러 반입 완료	보일러 스펙
작업사진			
내 용	배관 연결 준비	배관 연결	배관 연결

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.10.11~2023.11.13
공 사 명	기숙사 AB동 고장보일러 교체 공사	제출일자	2023.11.21
작업사진			
내 용	배관 연결	배관 연결	배관 연결
작업사진			
내 용	배관 연결	배관 연결	배관 연결
작업사진			
내 용	배관 연결	배관 연결	배관 연결

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.10.11~2023.11.13
공 사 명	기숙사 AB동 고장보일러 교체 공사		제출일자	2023.11.21
작업사진				
내 용	배관 연결	보일러 교체 작업 완료		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	10월 30일
공 사 명	기숙사 3동 지하 당직실 누수 보수(전기)		제출일자	11월 22일
작업사진				
내 용	전선관 배관	판넬 내부	판넬 내부	
작업사진				
내 용	판넬 내부	판넬 설치		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				

제 2023-0436800 호

완성검사증명서

상 호	(주)엘지에너지솔루션-독신자아파트(A,B동)	사업의 종류	특정사용
사무소 소재지		성명(대표자)	오태훈
사업소 소재지	(34112)대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20 LG에너지솔루션사원아파트(01688440)		
검 사 대 상	특정가스사용시설		
검사기관 주소	대전 서구 계룡로 553-34	담 당 부 서	대전광역시본부 전화번호: (042) 485-0019
검 사 원 성 명	이우경	검사 연월일	2023.10.18
월사용예정량	13,431 m ³		

「도시가스사업법」 제15조제6항 및 같은 법 시행규칙 제22조제5항에 따라 위 검사대상에 대하여 완성
검사를 마쳤으므로 완성검사증명서를 발급합니다."

"※ 특정가스사용시설의 사용자 유의사항

1. 「도시가스사업법」 제17조 및 같은 법 시행규칙 제25조제3항에 따라 완성검사증명서를
받은 날을 기준으로 매 1년(제20조의2제1항제2호가목 및 나목에 따른 가스사용시설 중
「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당과 「영유아보육법」 제10조제5호에 따른
가정어린이집은 10년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 합니다.
2. 「도시가스사업법」 제29조제1항 및 같은 법 시행령 별표 1에 따라 월사용예정량이
4,000세제곱미터를 초과한 경우(자동차 연료장치의 가스사용시설은 제외한다)에는 안전
관리 책임자를 1명 이상 선임하여야 합니다.
3. 「도시가스사업법」 제43조제1항 및 같은 법 시행규칙 제64조제1항에 따라 월사용예정량
이 3,000세제곱미터 이상인 경우에는 가스사고배상책임보험에 가입하여야 합니다.



2023년 10월 18일

한국가스안전공사사장



29292-20111일
'99. 6. 12 개정승인


210mm X 297mm(백상지120g/m²)



<검 사 내 용>

번호	검사 신청일	검사 연월일	검사결과	검사원 성명 (사번)	확인	비고
1	23. 9. 26	23. 10. 18	적합	이 C T 장	AB	변경일: 13402 재검: 4467 정정: 44P6 변경일: 13431

電話: 13402
 電話: 4469
 電話: 44P6
 電話: 13431

$$m^3/s_i$$


수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-307호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	20	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	22	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	16	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타	뒤베란다 벽단열재 크랙 전체보수, 방충망-6개(앞베란다(4개),뒤베란다(2개))교체, 씽크대(상부,하부)문짝 전체교체, 씽크대 상부몰딩 실리콘 들뜸보수, 문끌림-2개(주방좌측방문, 뒤베란다문)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.11.20)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-302호								
1. 도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	38	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	25	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	12	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	25	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2. 바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	13	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	10	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
3. 도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4. 청소	준공청소(특별인부)	㎡	45	✓	✓			
5. 기타	앞베란다 우수관주변 누수점검 및 보수, 방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체,주방(싱크대교체,수전배관이설, 난방분배기교체,타일교체),내부샤시설치,불박이장설치,앞,뒤베란다우수관교체,문걸림-4곳(화장실좌측방,화장실우측방,현관앞방,뒤베란다창고문)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.11.20)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-306호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	38	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	25	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	12	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	25	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	13	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	10	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45	✓	✓			
5.기타	뒤베란다(우수관주변,창고앞)누수점검 및 보수, 내부샤시교체,방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개)교체, 안방불박이장설치,주방(싱크대교체,수전배관이설,난방분배기교체,타일교체),신발장시트지교체,문걸림-4곳(화장실좌측방,화장실우측방,현관앞방,뒤베란다창고)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.11.20)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-307호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타	앞,뒤베란다 우수관주변 누수점검 및 보수, 방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 안방불박이장 스텐봉(1개)설치, 주방(싱크대교체,수전배관이설,난방 분배기교체,타일교체),문걸림-3개(화장실좌측방,화장실우측방,현관앞방)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.11.20)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-105호								
1.도배	LG취암세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타	주방(싱크대교체,수전배관이설,난방분배기교체,타일교체), 방충망-7개(앞베란다(3곳),뒤베란다(4곳))교체, 화장실 벽타일 부분보수 또는 전체교체, 문끌림-4개(화장실좌측방,현관앞방문,앞베란다좌측창고문,방화문)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.11.20							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-206호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타	화장실좌측방공팡이제거 및 보수, 뒤베란다공팡이제거 누수점검 및 보수, 앞베란다좌측창고단열재시공, 방충망-7개(앞베란다(3곳),뒤베란다(4곳)교체, 문골림-2곳(앞베란다좌측창고문,방화문), 빨래 건조대설치			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.11.20)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							
