

## 목 록


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 12월 마감자료 목록_솔루션                       | 1  |
| 12월 완료사진_솔루션                          | 2  |
| 01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계))         | 3  |
| 02완료사진_(기숙사동 CCTV 기존 네트워크 환경개선)       | 4  |
| 03완료사진_(기숙사동 보안 사각지대 CCTV 추가)         | 5  |
| 04완료사진_(사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 개선)       | 6  |
| 05완료사진_(기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선)        | 7  |
| 06완료사진_(사택 7동 지붕 기와 보수)               | 14 |
| 07완료사진_(기숙사 3동 지하 용역원실 환경개선)          | 15 |
| 08완료사진_(기숙사 3동 세탁실 건조기용 전기 콘센트 설치)    | 16 |
| 09완료기록_(사택 어린이집 노후시설 개선(건축))          | 17 |
| 09완료사진_(사택 어린이집 노후시설 개선(건축))          | 36 |
| 10완료사진_(사택 어린이집 노후시설 개선(기계))          | 37 |
| 11완료사진_(사택 어린이집 노후시설 개선(전기))          | 38 |
| 12완료사진_(기숙사 AB동 누수 오배수배관 1차분 정산 및 추가) | 39 |
| 13완료사진_(사택 5-504 앞베란다 누수 천장 도장 보수)    | 40 |
| 14완료사진_(기숙사 AB동 CCTV용 모니터 교체)         | 41 |
| 15완료사진_(임차사택 수장공사 김태균(팩개발))           | 42 |
| 12월 완료확인서_솔루션                         | 43 |

## 기숙사 및 사택 12월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

23-12-15

| NO. | 담당 | 매입<br>(월-일) | 제 목                          | 특이사항                            | 공사<br>완료일  | A) PR금액<br>(예산) | B) PO금액<br>(낙찰*7.5%) | 업체              | B-A<br>(차액)  | A/B<br>(요율) |
|-----|----|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
|     |    |             |                              |                                 |            | 99,036,000      | 91,423,175           | ==>일성-일반(5 건)   |              | -8%         |
|     |    |             |                              |                                 |            | 3,273,000       | 3,208,875            | ==>일성-임차사택(1 건) |              | -2%         |
|     |    |             |                              |                                 |            | 113,544,000     | 88,029,740           | ==>하이멜솔투택(3 건)  |              | -29%        |
|     |    |             |                              |                                 |            | 23,154,000      | 23,180,175           | ==>동문(3 건)      |              | 0%          |
|     |    |             |                              |                                 |            | 48,657,000      | 46,780,312           | ==>이에이치솔루택(1 건) |              | -4%         |
|     |    |             |                              |                                 |            | 18,515,000      | 18,082,525           | ==>대양이앤씨(2 건)   |              | -2%         |
|     |    |             |                              |                                 |            | 306,179,000     | 270,704,802          | 12월 마감건(15 건)   | - 35,474,198 | -13%        |
| 1   | P  | 12월31일      | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)         |                                 | 2023-12-18 | 7,356,000       | 7,078,875            | 동운              | - 277,125    | -4%         |
| 2   | P  | 12월31일      | 기숙사동 CCTV 기존 네트워크 환경개선       | 카메라 5개 추가 PO변경                  | 2023-12-19 | 37,746,000      | 31,031,975           | 이유솔루션           | - 6,714,025  | -22%        |
| 3   | P  | 12월31일      | 기숙사동 보안 사각지대 CCTV 추가         | PoE 1개 추가 PO변경                  | 2023-12-19 | 66,265,000      | 47,946,265           | 이유솔루션           | - 18,318,735 | -38%        |
| 4   | K  | 12월31일      | 사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 개선       | 작업 범위 변경 PO변경<br>(야자매트X / 헬스0등) | 2023-12-11 | 35,042,000      | 30,483,725           | 일성건축            | - 4,558,275  | -15%        |
| 5   | P  | 12월31일      | 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선        |                                 | 2023-12-08 | 48,657,000      | 46,780,312           | 서울방재전문기술단       | - 1,876,688  | -4%         |
| 6   | K  | 12월31일      | 사택 7동 지붕 기와 보수               |                                 | 2023-11-22 | 19,190,000      | 18,526,500           | 일성건축            | - 663,500    | -4%         |
| 7   | K  | 12월31일      | 기숙사 3동 지하 용역원실 환경개선          |                                 | 2023-12-13 | 10,643,000      | 9,916,825            | 일성건축            | - 726,175    | -7%         |
| 8   | K  | 12월31일      | 기숙사 3동 세탁실 건조기용 전기 콘센트 설치    |                                 | 2023-11-30 | 1,649,000       | 1,620,025            | 대양이앤씨           | - 28,975     | -2%         |
| 9   | L  | 12월31일      | 사택 어린이집 노후시설 개선(건축)          |                                 | 2023-11-28 | 33,871,000      | 32,209,100           | 일성건축            | - 1,661,900  | -5%         |
| 10  | L  | 12월31일      | 사택 어린이집 노후시설 개선(기계)          |                                 | 2023-11-29 | 5,120,000       | 4,680,550            | 동운              | - 439,450    | -9%         |
| 11  | L  | 12월31일      | 사택 어린이집 노후시설 개선(전기)          |                                 | 2023-12-07 | 16,866,000      | 16,462,500           | 대양이앤씨           | - 403,500    | -2%         |
| 12  | K  | 12월31일      | 기숙사 AB동 누수 오배수배관 1차분 정산 및 추가 | 당사안 으로 PR발행                     | 2023-12-19 | 10,678,000      | 11,420,750           | 동운              | 742,750      | 7%          |
| 13  | K  | 12월31일      | 사택 5-504 앞베란다 누수 천장 도장 보수    |                                 | 2023-11-29 | 290,000         | 287,025              | 일성건축            | - 2,975      | -1%         |
| 14  | K  | 12월31일      | 기숙사 AB동 CCTV용 모니터 교체         |                                 | 2023-12-19 | 9,533,000       | 9,051,500            | 이유솔루션           | - 481,500    | -5%         |
| 15  | K  | 12월31일      | 임차사택 수장공사 김태균(떡개발)           |                                 | 2023-12-04 | 3,273,000       | 3,208,875            | 일성건축            | - 64,125     | -2%         |

# 공사 완료 보고서
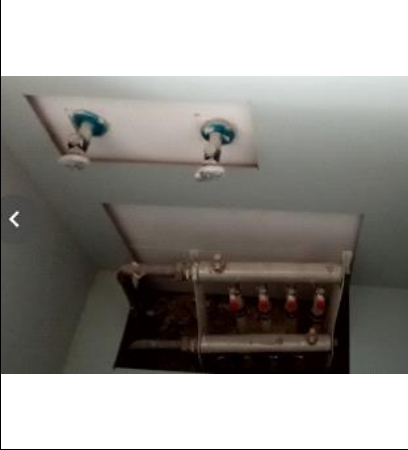
|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 업 체 명 | 주 식 회 사 동 운                                                                         |                                                                                      | 공사일자                                                                                  | 2023.07.01~2023.12.10 |
| 공 사 명 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)                                                                |                                                                                      | 제출일자                                                                                  | 2023.12.15            |
| 작업사진  |    |    |    |                       |
| 내 용   | 누수 탐지전                                                                              | 누수 탐지중                                                                               | 누수 탐지후                                                                                |                       |
| 작업사진  |  |  |  |                       |
| 내 용   | 누수 난방 분배기 교체전                                                                       | 누수 난방 분배기 교체중                                                                        | 누수 난방 분배기 교체후                                                                         |                       |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                       |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                       |


# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 업 체 명 | 이유솔루션                                                                               |                                                                                      | 공사일자                                                                                | 2023.10.15~2023.12.10 |
| 공 사 명 | 기숙사동 CCTV 기존 네트워크 환경개선                                                              |                                                                                      | 제출일자                                                                                | 2023.12.15            |
| 작업사진  |    |    |  |                       |
|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                       |
| 내 용   | PoE 설치전                                                                             | 광 컨버트                                                                                | PoE 설정 작업                                                                           |                       |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                       |
|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                       |
| 내 용   | PoE 설치                                                                              | PoE 설치                                                                               |                                                                                     |                       |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                       |
|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                       |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                       |

## 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 업 체 명 | 이유솔루션                                                                               |                                                                                      | 공사일자                                                                                                                                                                       | 2023.10.15~2023.12.10 |
| 공 사 명 | 기숙사동 보안 사각지대 CCTV 추가                                                                |                                                                                      | 제출일자                                                                                                                                                                       | 2023.12.15            |
| 작업사진  |    |    | <br> |                       |
| 내 용   | 카메라 검수                                                                              | 카메라 검수                                                                               | 광케이블 검수                                                                                                                                                                    |                       |
| 작업사진  |   |  |                                                                                        |                       |
| 내 용   | UTP케이블 검수                                                                           | 케이블 포설                                                                               | 옥외 카메라 설치                                                                                                                                                                  |                       |
| 작업사진  |  |  |                                                                                       |                       |
| 내 용   | 옥내 카메라 설치                                                                           | 옥외 터파기                                                                               | 옥외 복원                                                                                                                                                                      |                       |

# 공사 완료 보고서
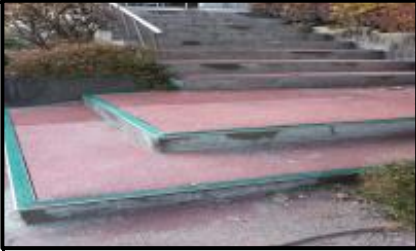
|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           |                                                                                      | 공사일자                                                                                | 2023.11.20 - 2023.12.07 |
| 공 사 명 | 사택 6동 및 7동 공용부 보도블럭 개선                                                              |                                                                                      | 제출일자                                                                                | 2023.12.20              |
| 작업사진  |    |    |  |                         |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업전)                                                                             | 보수(작업전)                 |
| 작업사진  |    |    |  |                         |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업후)                                                                             | 보수(작업후)                 |
| 작업사진  |   |   |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 사진

|       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | (주)서울방재전문기술단                                                                      |                                                                                     | 공사일자                                                                                 | 2023.11.01~2023.12.08                                                                 |
| 공 사 명 | 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선                                                             |                                                                                     | 제출일자                                                                                 | 12월 08일                                                                               |
| 작업사진  |  |   |   |                                                                                       |
|       | 내 용                                                                               | 발신기 감지기 배관 설치 전                                                                     | 발신기 감지기 배관 설치 중                                                                      | 발신기 감지기 배관 설치 후                                                                       |
|       | 작업사진                                                                              |   |   |   |
| 내 용   |                                                                                   | 발신기 감지기 배관 설치 전                                                                     | 발신기 감지기 배관 설치 중                                                                      | 발신기 감지기 배관 설치 후                                                                       |
| 작업사진  |                                                                                   |  |  |  |
|       | 내 용                                                                               | 발신기 감지기 배관 설치 전                                                                     | 발신기 감지기 배관 설치 중                                                                      | 발신기 감지기 배관 설치 후                                                                       |

# 공사 완료 사진

|       |                                                                                      |                 |                 |                       |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 업 체 명 | (주)서울방재전문기술단                                                                         |                 | 공사일자            | 2023.11.01~2023.12.08 |                 |
| 공 사 명 | 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선                                                                |                 | 제출일자            | 12월 08일               |                 |
| 작업사진  |    |                 |                 |                       |                 |
|       | 내 용                                                                                  | 공용부 감지기 선로 포설 전 |                 | 공용부 감지기 선로 포설 중       |                 |
|       |   |                 |                 |                       |                 |
| 작업사진  |  |                 |                 |                       |                 |
|       | 내 용                                                                                  | 공용부 감지기 선로 포설 전 |                 | 공용부 감지기 선로 포설 중       |                 |
|       |  |                 |                 |                       |                 |
| 내 용   | 공용부 감지기 선로 포설 전                                                                      |                 | 공용부 감지기 선로 포설 중 |                       | 공용부 감지기 선로 포설 후 |

# 공사 완료 사진

|       |                                                                                      |                  |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 업 체 명 | (주)서울방재전문기술단                                                                         | 공사일자             | 2023.11.01~2023.12.08 |
| 공 사 명 | 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선                                                                | 제출일자             | 12월 08일               |
| 작업사진  |    |                  |                       |
| 내 용   | 공용부 감지기 선로 재설치 전                                                                     | 공용부 감지기 선로 재설치 중 | 공용부 감지기 선로 재설치 후      |
| 작업사진  |   |                  |                       |
| 내 용   | 공용부 감지기 선로 재설치 전                                                                     | 공용부 감지기 선로 재설치 중 | 공용부 감지기 선로 재설치 후      |
| 작업사진  |  |                  |                       |
| 내 용   | 세대 내 감지기 선로 분리 전                                                                     | 세대 내 감지기 선로 분리 중 | 세대 내 감지기 선로 분리 후      |


# 공사 완료 사진

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | (주)서울방재전문기술단                                                                        | 공사일자                                                                                 | 2023.11.01~2023.12.08                                                                 |
| 공 사 명 | 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선                                                               | 제출일자                                                                                 | 12월 08일                                                                               |
| 작업사진  |    |    |    |
| 내 용   | 배관 관통부 보수 작업 전                                                                      | 배관 관통부 보수 작업 중                                                                       | 배관 관통부 보수 작업 후                                                                        |
| 작업사진  |   |   |   |
| 내 용   | 배관 관통부 보수 작업 전                                                                      | 배관 관통부 보수 작업 중                                                                       | 배관 관통부 보수 작업 후                                                                        |
| 작업사진  |  |  |  |
| 내 용   | 배관 관통부 보수 작업 전                                                                      | 배관 관통부 보수 작업 중                                                                       | 배관 관통부 보수 작업 후                                                                        |

# 공사 완료 사진

|       |                                                                                      |                                                                                      |                     |                       |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 업 체 명 | (주)서울방재전문기술단                                                                         |                                                                                      | 공사일자                | 2023.11.01~2023.12.08 |                     |
| 공 사 명 | 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선                                                                |                                                                                      | 제출일자                | 12월 08일               |                     |
| 작업사진  |    |                                                                                      |                     |                       |                     |
|       | 내 용                                                                                  | 배관 관통부 보수 작업 전                                                                       |                     | 배관 관통부 보수 작업 중        |                     |
|       | 작업사진                                                                                 |   |                     |                       |                     |
| 내 용   | 소방 중계기 설치 및 결선 작업 전                                                                  |                                                                                      | 소방 중계기 설치 및 결선 작업 중 |                       | 소방 중계기 설치 및 결선 작업 후 |
| 작업사진  |  |                                                                                      |                     |                       |                     |
|       | 내 용                                                                                  | 소방 중계기 설치 및 결선 작업 전                                                                  |                     | 소방 중계기 설치 및 결선 작업 중   |                     |
|       | 작업사진                                                                                 |  |                     |                       |                     |
| 내 용   | 소방 중계기 설치 및 결선 작업 전                                                                  |                                                                                      | 소방 중계기 설치 및 결선 작업 중 |                       | 소방 중계기 설치 및 결선 작업 후 |

# 공사 완료 사진
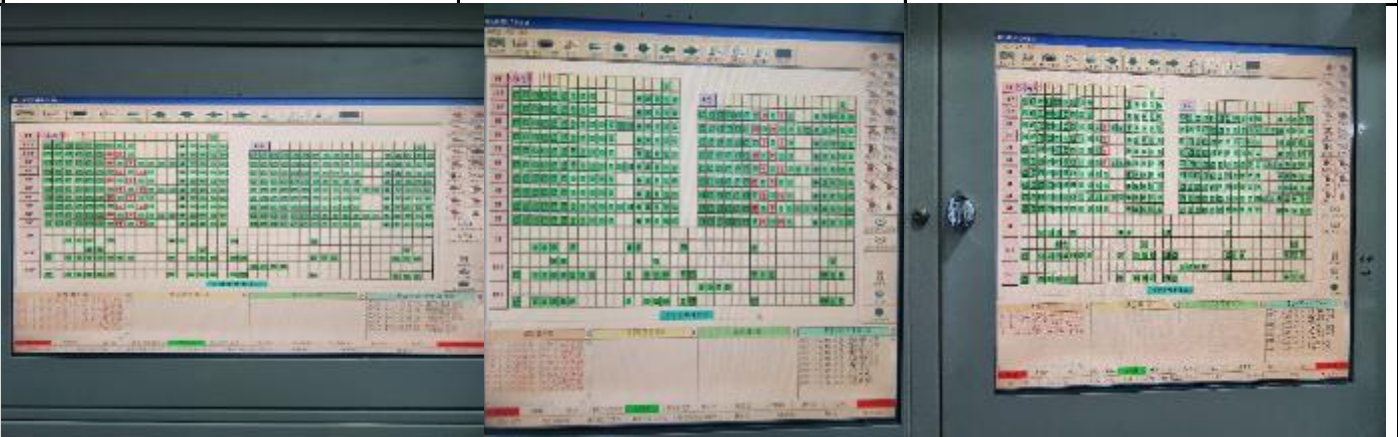
|       |                                                                                      |             |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 업 체 명 | (주)서울방재전문기술단                                                                         | 공사일자        | 2023.11.01~2023.12.08 |
| 공 사 명 | 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선                                                                | 제출일자        | 12월 08일               |
| 작업사진  |    |             |                       |
| 내 용   | 감지기 점검 작업 전                                                                          | 감지기 점검 작업 중 | 감지기 점검 작업 후           |
| 작업사진  |   |             |                       |
| 내 용   | 감지기 점검 작업 전                                                                          | 감지기 점검 작업 중 | 감지기 점검 작업 후           |
| 작업사진  |  |             |                       |
| 내 용   | GDS 화재 테스트                                                                           | GDS 화재 테스트  | GDS 화재 테스트            |


# 공사 완료 사진

|       |                                                                                    |                   |                   |                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 업 체 명 | (주)서울방재전문기술단                                                                       |                   | 공사일자              | 2023.11.01~2023.12.08 |
| 공 사 명 | 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선                                                              |                   | 제출일자              | 12월 08일               |
| 작업사진  |  |                   |                   |                       |
| 내 용   | 1,7동 비상방송 연동 작업 전                                                                  | 1,7동 비상방송 연동 작업 중 | 1,7동 비상방송 연동 작업 후 |                       |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           |                                                                                      | 공사일자                                                                                  | 2023.11.13- 2023.11.22 |
| 공 사 명 | 사택 7동 지붕 기와 보수                                                                      |                                                                                      | 제출일자                                                                                  | 2023.12.20             |
| 작업사진  |    |    |    |                        |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업전)                                                                               |                        |
| 작업사진  |    |    |    |                        |
| 내 용   | 보수(작업중)                                                                             |                                                                                      | 장판(작업후)                                                                               |                        |
| 작업사진  |   |   |   |                        |
| 내 용   | 보수(작업중)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업중)                                                                               |                        |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업후)                                                                               |                        |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                        |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           |                                                                                      | 공사일자                                                                                | 2023.11.29 - 2023.12.13 |
| 공 사 명 | 기숙사 3동 지하 용역원실 환경개선                                                                 |                                                                                      | 제출일자                                                                                | 2023.12.20              |
| 작업사진  |    |    |  |                         |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                             |                                                                                      | 교체(작업전)                                                                             | 교체(작업전)                 |
| 작업사진  |    |    |  |                         |
| 내 용   | 교체(작업후)                                                                             |                                                                                      | 교체(작업후)                                                                             | 교체(작업후)                 |
| 작업사진  |   |   |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 차수판(작업중)                                                                            |                                                                                      | 도배(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 차수판(작업후)                                                                            |                                                                                      | 도배(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                         |

## 공사 완료 사진

|       |                                                                                     |        |        |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 업 체 명 | 대양 ENC                                                                              |        | 공사일자   | 2023년  |
| 공 사 명 | 기숙사 3동 세탁실 건조기용 전기 콘센트 설치                                                           |        | 제출일자   | 2023년  |
| 작업사진  |   |        |        |        |
| 내 용   | 케이블포설                                                                               | 케이블포설  | 케이블포설  | 케이블포설  |
| 작업사진  |  |        |        |        |
| 내 용   | 콘센트 설치                                                                              | 차단기 결선 | 콘센트 설치 | 콘센트 설치 |
| 작업사진  |                                                                                     |        |        |        |
| 내 용   |                                                                                     |        |        |        |

## ■ 건축

- ◎ 1층 햇님반 싱크대 상부 유아용 거울 추가=>11월28일 완료
- ◎ 2층 조리실 가스 렌지측 추가 들뜸 벽 타일 보수=>12월6일 완료, **무상**
  - 렌지 화구교체 업체 가스배관 임시 분리 x
  - 도시가스 업체 임시 분리 비용 발생 및 견적접수 지연
  - 어린이집 담당자와 스텐레스 설치하기로 최종 협의



## ■ 전기

- ◎ 2층 세탁실 다운 라이트 6개 추가 =>12월7일 완료, **무상**
- ◎ 2층 야외 놀이터 입구 기둥 평판등 추가=>12월7일 완료, **무상**

## ■ 기계

- ◎ 1층 교체 싱크대 하부 배관 연결=> 11월29일 완료
- ◎ 2층 온수기 철거 및 교체 작업=> 11월29일 완료
- ◎ 2층 조리기 렌지 화구 교체=> 11월29일 완료

## ■ 주요 공정 사진

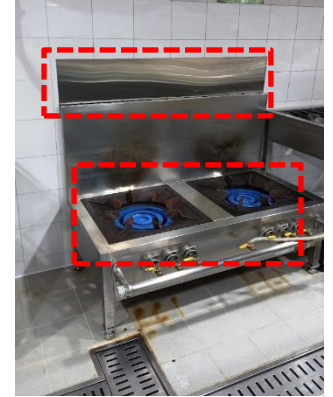

■ 시공 전,후 주요 사진 (건축)

◎ 2층 보일러 온수기 교체



◎ 2층 조리실 가스 렌지측 들뜸 벽 타일 보수



## ■ 시공 전,후 주요 사진 (기계)

### ◎ 1층 교체 싱크대 하부 배관 연결



### ◎ 2층 보일러 온수기 교체

**시공전**

| 기스안전을 생활화합니다!            |                  | 경동나비엔    |                       | 가스온수기  |               |
|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------|---------------|
| ■ 모델명: NPW-36KD          |                  |          |                       |        |               |
| ■ 연소기명: 가스순환온수기(온수공급방식)  |                  |          |                       |        |               |
| ■ 서비스 및 구입 문의: 1588-1144 |                  |          |                       |        |               |
| 사용가스명                    | 도시가스(13A)용       | 사용전원     | AC 220 V, 60 Hz       | 가스배기방식 | 밀폐형강제배기식 (FF) |
| 온수출력                     | 41.8 kW          | 가스조절방식   | 비례제어방식                | 비례제어방식 |               |
| 온수공급능력                   | 24 L/min(ΔT25°C) | 가스소비량    | 43.0 kW               |        |               |
|                          | 15 L/min(ΔT40°C) | 가스소비량    | 37,000kcal/h          |        |               |
| 사용가스압력                   | 2.0 ± 0.1 kPa    | 열효율 (%)  | (총) 99.3 (단) 109.1    |        |               |
| 배기구경                     | φ76 mm(76 mm)    | 최고 사용 압력 | 1.03 MPa(10.5 kg/cm²) |        |               |
| 급배기용                     | 최대길이             | 정격 소비 전력 | 50 W                  |        |               |
|                          |                  | 품질 보증 기간 | 3 년                   |        |               |
| ■ 제조년월일 2014.09.01       |                  |          |                       |        |               |
| ■ 제조번호 7001 S149015 4031 |                  |          |                       |        |               |
| 도시가스(13A)용               |                  |          |                       |        |               |

**시공후**

| 기스안전을 생활화합니다!            |                       | 경동나비엔    |                    | 콘덴싱 가스온수기 |               |
|--------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------|---------------|
| ■ 모델명: NPW-36KDS         |                       |          |                    |           |               |
| ■ 연소기명: 콘덴싱 가스온수기(온수조절식) |                       |          |                    |           |               |
| ■ 서비스 및 구입 문의: 1588-1144 |                       |          |                    |           |               |
| 사용가스명                    | 도시가스(13A)용            | 사용전원     | AC 220 V, 60 Hz    | 가스배기방식    | 밀폐형강제배기식 (FF) |
| 온수출력                     | 41.8 kW               | 가스조절방식   | 비례제어방식             | 비례제어방식    |               |
| 온수공급능력                   | 20 L/min(ΔT30°C)      | 열효율 (%)  | (총) 98.0 (단) 108.8 |           |               |
| 가스소비량                    | 43.0 kW               | 사용가스압력   | 2.0 ± 0.1 kPa      |           |               |
|                          | 37,000 kcal/h         | 배기구경     | φ76 mm(76 mm)      |           |               |
| 최고 사용 압력                 | 1.03 MPa(10.5 kg/cm²) | 정격 소비 전력 | 50 W               |           |               |
| 급배기용                     | 최대길이                  | 대기 전력    | 3.0 W              |           |               |
|                          |                       | 품질 보증 기간 | 3 년                |           |               |
| ■ 제조년월일 2022.05.23       |                       |          |                    |           |               |
| ■ 제조번호 1327 V225233 5008 |                       |          |                    |           |               |
| 도시가스(13A)용               |                       |          |                    |           |               |

### ◎ 2층 조리실 렌지 화구 교체



■ 시공 전,후 주요 사진 (전기)

◎ 2층 세탁실 다운 라이트 6개 추가



◎ 2층 야외 놀이터 입구 기둥 평판등 추가



## ■ 건축 ( 11월25일 ~ 26일 \_주말작업 ) => 부분 완료

- ◎ 각층 교실 장판(4.5t) 및 벽도배(방염) 작업=> 완료
- ◎ 1층 햇님반 싱크대 및 교실 롤스크린(방염) 교체=> 완료
- ◎ 1층 햇님반 모서리(코너)설치 보호대(방염,인조가죽)=> 완료
- ◎ 1층 햇님반 싱크대 상부 유아용 거울 추가=>11월28일(화) 작업 예정
- ◎ 2층 식당내 배식구 하단 걸레받이 교체=> 완료
- ◎ 조리실내 조리기측 들뜸 벽 타일 교체 =>11월29일(수) 작업 예정
- ◎ 조리실내 배식구 및 출입구측 벽 하단부 실리콘 작업(메지)=> 완료
- ◎ 조리실내 식기 세척기측 들뜸 벽 타일 교체=> 완료
- ◎ 조리실내 스텐레스 개수대 교체 => 어린이집 이관 완료

## ■ 전기 ( 11월25일 ~ 26일 \_주말작업 ) => 작업 완료

- ◎ 천장 다운 라이트(LED) : 총 159개 교체
  - 1층 창의교실 18개 / 1~2층 계단 5개 / 1층 화장실 8개
  - 1층 복도 15개 / 2층 조리실 13개 / 2층 남녀 화장실 21개
  - 2층 복도 교체 39 / 야외 놀이터 2층 교체 40개
- ◎ 천장 평판등 (LED) : 총 3개 교체
  - 달님반 1개 교체 / 은하수방 2개 교체
- ◎ 일자 레일등(LED) 야외 놀이터 1층 : 총 21개 교체
- ◎ 추가 교체 23개 교체
  - 1층 화장실 다운 라이트 8개 / 1층 복도 15개
- ◎ 1층 야외 놀이터 계단 벽부 평판등 , 램프(LED) 교체 4개

## ■ 기계 ( 11월29 작업 예정 )

- ◎ 온수기 및 조리기 렌지 화구 교체 (동운 렌지 가스배관 임시 분리)
- ◎ 교체 싱크대 상판 하부 배관 연결

## ■ 주요 공정 사진




■ 시공 전,후 주요 사진 (건축)

◎ 바닥 장판 (4.5t)



◎ 벽도배 (방염)

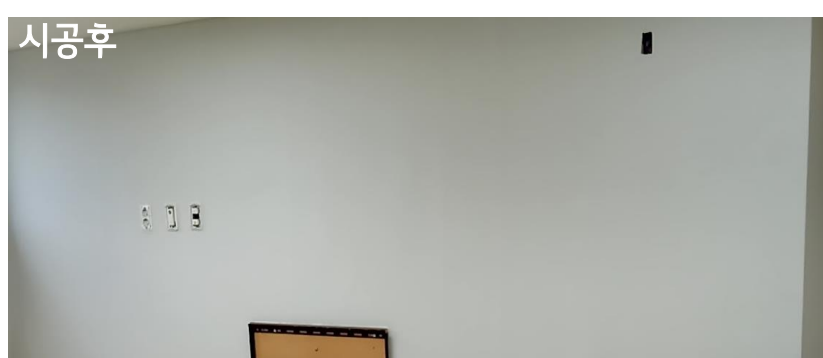

◎ 1층 햇님반 싱크대 및 하부장 교체



■ 시공 전,후 주요 사진 (건축)

◎ 1층 햇님반 모서리(코너)설치 보호대(방염,인조가죽)=>



◎ 2층 조리실 식기 세척기측 벽 타일 보수



■ 시공 전,후 주요 사진 (건축)

◎ 조리실내 배식구 및 출입구측 벽 하단부 실리콘 작업 (메지)



◎ 조리실 트렌치 부분 보수




■ 시공 전,후 주요 사진 (건축)

◎ 2층 식당내 배식구 하단 걸레받이 교체




◎ 교실 롤스크린(방염,암막) 교체

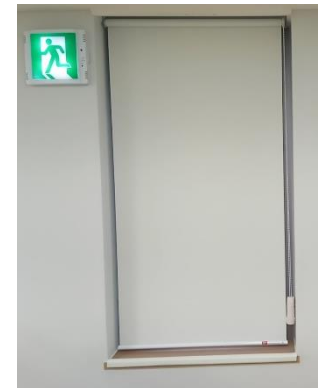

■ 시공 LED등 추가 사진 \_ 무상 (전기)

날짜 :

장소 : 추가 교체 1층 화장실

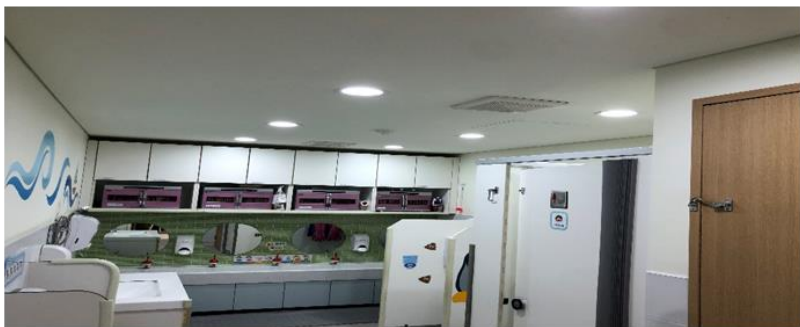

작업 내용 : 등기구 교체 8개

날짜 :

장소 : 추가 교체 1층 복도



작업 내용 : 등기구 교체 9개

날짜 :

장소 : 추가 교체 1층 복도



작업 내용 : 등기구 교체 6개

날짜 : 야외놀이터 1층



작업 내용 : 등기구 교체 3개

■ 시공 LED등 추가 사진 \_ 무상 (전기)

날짜 :

장소 : 추가 교체 야외놀이터1층



작업 내용 : 형광등=>LED램프.안정기 교체 3개

날짜 :

장소 :



작업 내용 : 야외놀이터 1~2층 계단 평판등 교체 1개

■ 시공 전,후 주요 사진 (전기)

◎ 야외 놀이터 벽부 평판등 (LED) 설치



◎ 야외 놀이터 일자 레일등 (LED)설치 및 LED램프 교체



■ 시공 조도 측정주요 사진 (전기)

작업(중)

날짜 :

장소 : 어린이집 창의교실



작업 내용 : 작업 전 조도 212 lux

작업(후)

날짜 :



작업 내용 : 작업 후 조도 1,115 lux

날짜 :



작업 내용 : 등기구 교체

날짜 :



■ 시공 조도 측정주요 사진 (전기)

작업(중)

날짜:

장소: 어린이집 1~2층 계단



작업 내용: 작업 전 조도 84 lux

작업(후)

날짜:



작업 내용: 작업 후 조도 425 lux

날짜:



작업 내용: 등기구 교체

날짜:



■ 시공 조도 측정주요 사진 (전기)

작업(중)

날짜 :

장소 : 주방



작업 내용 : 작업 전 조도 134 lux


작업(후)

날짜 :



작업 내용 : 작업 후 조도 1,019 lux

날짜 :

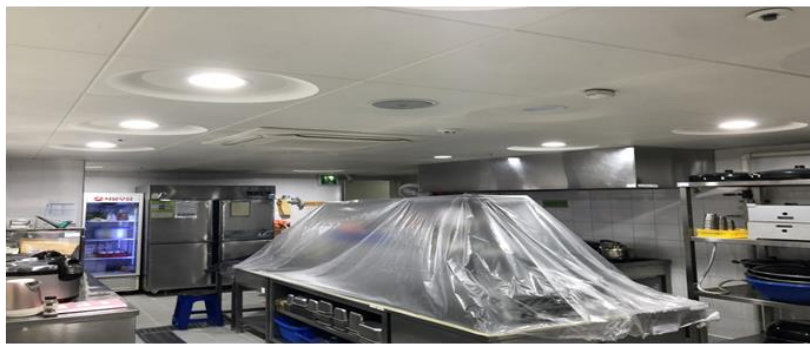

작업 내용 : 등기구 교체

날짜 :



작업 내용 : 등기구 교체

■ 시공 조도 측정주요 사진 (전기)

작업(중)

날짜 :

장소 : 2층 복도



작업 내용 : 작업 전 조도 312 lux

작업(후)

날짜 :



작업 내용 : 작업 후 조도 1,572 lux

날짜 :



작업 내용 : 등기구 교체

날짜 :



작업 내용 : 등기구 교체

■ 시공 조도 측정주요 사진 (전기)

작업(중)

날짜 :

장소 : 2층 화장실



작업 내용 : 작업 전 조도 158 lux

작업(후)

날짜 :




작업 내용 : 작업 후 조도 1,041 lux

날짜 :



작업 내용 : 등기구 교체

날짜 :

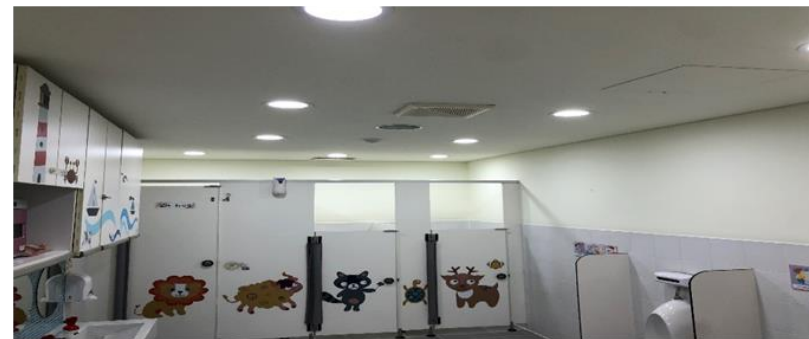


작업 내용 : 등기구 교체

■ 시공 조도 측정주요 사진 (전기)

작업(중)

날짜 :

장소 : 야외놀이터1층

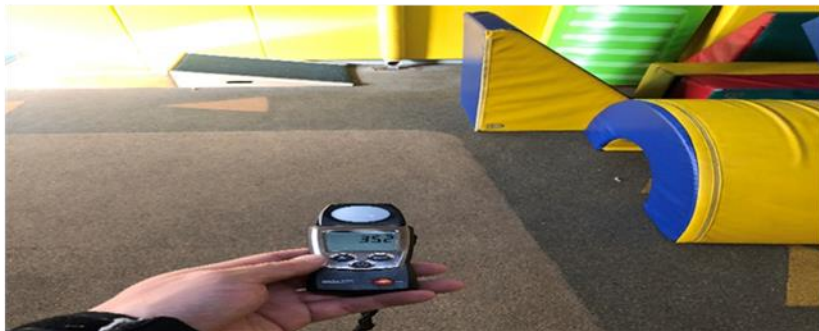

작업 내용 : 작업 전 조도 352 lux

작업(후)

날짜 :




작업 내용 : 작업 후 조도 624 lux

날짜 :



작업 내용 : 등기구 교체

날짜 :

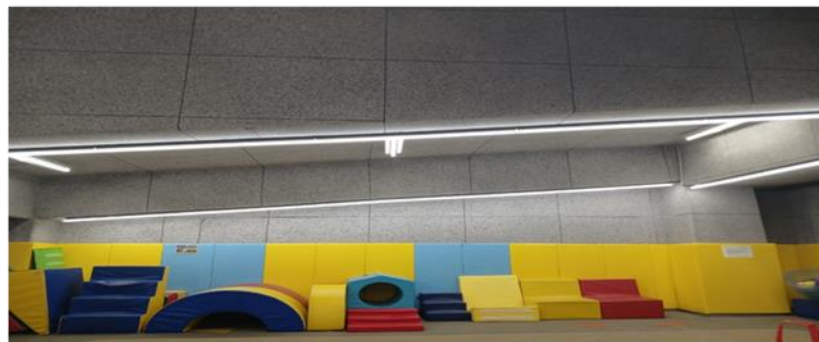

작업 내용 : 등기구 교체

■ 시공 조도 측정주요 사진 (전기)

작업(중)

날짜 :

장소 : 야외놀이터2층



작업 내용 : 작업 전 조도 362 lux


작업(후)

날짜 :



작업 내용 : 작업 전 조도 592 lux

날짜 :

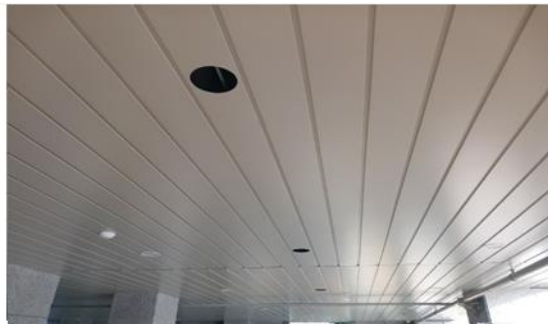

작업 내용 : 등기구 교체

날짜 :



작업 내용 : 등기구 교체

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           |                                                                                      | 공사일자                                                                                  | 2023.11.25 - 2023.11.28 |
| 공 사 명 | 사택 어린이집 노후시설 개선(건축)                                                                 |                                                                                      | 제출일자                                                                                  | 2023.12.20              |
| 작업사진  |    |    |    |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                             |                                                                                      | 장판(작업전)                                                                               | 교체(작업전)                 |
| 작업사진  |    |    |    |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                             |                                                                                      | 장판(작업후)                                                                               | 교체(작업후)                 |
| 작업사진  |   |   |   |                         |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업전)                                                                               | 보수(작업전)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 교체(작업후)                                                                             |                                                                                      | 보수(작업후)                                                                               | 보수(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |


# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 업 체 명 | 주 식 회 사 동 운                                                                         |                                                                                      | 공사일자                                                                                  | 2023.11.29~2023.12.08 |
| 공 사 명 | 사택 어린이집 노후시설 개선(기계)                                                                 |                                                                                      | 제출일자                                                                                  | 2023.12.15            |
| 작업사진  |    |    |    |                       |
| 내 용   | 교체전 순간 온수기                                                                          |                                                                                      | 교체중 순간 온수기                                                                            | 교체후 순간 온수기            |
| 작업사진  |  |  |  |                       |
| 내 용   | 유아용 싱크대 철거                                                                          |                                                                                      | 유아용 싱크대 배관 연결전                                                                        | 유아용 싱크대 배관 연결후        |
| 작업사진  |  |  |  |                       |
| 내 용   | 조리기 화구 교체전                                                                          |                                                                                      | 조리기 화구 교체중                                                                            | 조리기 화구 교체후            |

## 공사 완료 사진

|       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 업 체 명 | 대양 ENC                                                                             |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2023년 |
| 공 사 명 | 사택 어린이집 노후시설 개선(전기)                                                                |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2023년 |
| 작업사진  |   |  |  |       |
| 내 용   | 작업전 조도 (212)                                                                       | 작업후 조도 (1,115)                                                                     | 등기구 교체                                                                              |       |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |       |
| 내 용   | 등기구 교체                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |       |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |       |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |       |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |       |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |       |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |       |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |       |

# 공사 완료 보고서
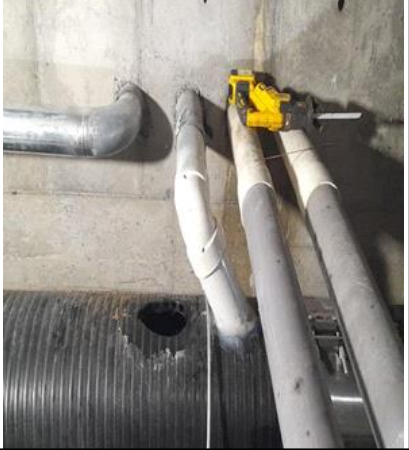
|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | 주 식 회 사 동 운                                                                         | 공사일자                                                                                 | 2023.12.01~2023.12.14                                                               |
| 공 사 명 | 기숙사 AB동 누수 오배수배관 1차분 정산 및 추가                                                        | 제출일자                                                                                 | 2023.12.15                                                                          |
| 작업사진  |    |    |  |
| 내 용   | 공동구 진입구 안전조치 작업                                                                     | 배관 개선전                                                                               | 배관 개선중                                                                              |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |
| 내 용   | 배관 개선중                                                                              | 배관 개선후                                                                               |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2023.11.29 - 11.29 |
| 공 사 명 | 사택 5-504 앞베란다 누수 천장 도장 보수                                                         |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2023.12.20         |
| 작업사진  |  |  |  |                    |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                           | 보수(작업중)                                                                            | 보수(작업후)                                                                             |                    |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                    |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                    |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                    |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                    |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                    |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                    |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                    |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                    |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                    |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                    |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | 이유솔루션                                                                               | 공사일자                                                                                 | 2023.12.19~2023.12.19                                                                 |
| 공 사 명 | 기숙사동 보안 사각지대 CCTV 추가                                                                | 제출일자                                                                                 | 2023.12.19                                                                            |
| 작업사진  |    |    |    |
| 내 용   | 기존 모니터 (6대)                                                                         | 기존 모니터 철거                                                                            | 기존 모니터용 브라켓 철거                                                                        |
| 작업사진  |  |  |  |
| 내 용   | 기존 모니터 반입                                                                           | 기존 모니터 검수                                                                            | 기존 모니터 HDMI 케이블                                                                       |
| 작업사진  |  |                                                                                      |                                                                                       |
| 내 용   | 신규 모니터용 브라켓 조립                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자    | 2023.12.01 - 2023.12.01 |
| 공 사 명 | 임차사택 수장공사 김태균(팩개발)                                                                |                                                                                    | 제출일자    | 2023.12.20              |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전) |                         |
| 작업사진  |  |  |         |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후) |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |         |                         |

# 내역서

| 품 명                     | 규 격            | 단위  | 수 량 | 재 료 비   |         | 노 무 비     |         | 기타 경 비 |     | 합 계       |         | 비 고           |
|-------------------------|----------------|-----|-----|---------|---------|-----------|---------|--------|-----|-----------|---------|---------------|
|                         |                |     |     | 단 가     | 금 액     | 단 가       | 금 액     | 단 가    | 금 액 | 단 가       | 금 액     |               |
| 공사명:임차사택 수장공사 김태균(팩 개발) |                |     |     |         |         |           |         |        |     |           |         |               |
| 1.도배                    | LG휘앙세 광폭       |     |     |         |         |           |         |        |     |           |         |               |
|                         | 거실 벽면          | ㎡   | 40  | 1,086   | 43,440  | 5,261     | 210,440 |        |     |           | 253,880 |               |
|                         | 거실 천정          | ㎡   | 24  | 1,086   | 26,064  | 6,839     | 164,136 |        |     |           | 190,200 |               |
|                         | 방A 벽면          | ㎡   | 32  | 1,086   | 34,752  | 5,261     | 168,352 |        |     |           | 203,104 |               |
|                         | 방A 천정          | ㎡   | 16  | 1,086   | 17,376  | 6,839     | 109,424 |        |     |           | 126,800 |               |
|                         | 방B 벽면          | ㎡   | 25  | 1,086   | 27,150  | 5,261     | 131,525 |        |     |           | 158,675 |               |
|                         | 방B 천정          | ㎡   | 11  | 1,086   | 11,946  | 6,839     | 75,229  |        |     |           | 87,175  |               |
|                         | 방C 벽면          | ㎡   | 25  | 1,086   | 27,150  | 5,261     | 131,525 |        |     |           | 158,675 |               |
|                         | 방C 천정          | ㎡   | 11  | 1,086   | 11,946  | 6,839     | 75,229  |        |     |           | 87,175  |               |
|                         | 벽지 떼어내기 80% 적용 | ㎡   | 147 |         |         | 1,283     | 188,858 |        |     |           | 188,858 |               |
| 소 계                     |                | 184 |     | 199,824 |         | 1,254,718 |         |        |     | 1,454,542 |         |               |
| 2.바닥재                   | LG청택           |     |     |         |         |           |         |        |     |           |         |               |
|                         | 거실 바닥 철거       | ㎡   | 15  |         |         | 3,849     | 57,735  |        |     |           | 57,735  |               |
|                         | 방A 바닥 철거       | ㎡   | 8   |         |         | 3,849     | 30,792  |        |     |           | 30,792  |               |
|                         | 방B 바닥 철거       | ㎡   | 7   |         |         | 3,849     | 26,943  |        |     |           | 26,943  |               |
|                         | 방C 바닥 철거       | ㎡   | 6   |         |         | 3,849     | 23,094  |        |     |           | 23,094  |               |
|                         | 접착제(부분접착)      | kg  | 4   | 16,157  | 64,628  |           |         |        |     |           | 64,628  |               |
|                         | 거실 바닥          | ㎡   | 15  | 14,003  | 210,045 | 3,515     | 52,725  |        |     |           | 262,770 |               |
|                         | 방A 바닥          | ㎡   | 8   | 14,003  | 112,024 | 3,515     | 28,120  |        |     |           | 140,144 |               |
|                         | 방B 바닥          | ㎡   | 7   | 14,003  | 98,021  | 3,515     | 24,605  |        |     |           | 122,626 |               |
|                         | 방C 바닥          | ㎡   | 6   | 14,003  | 84,018  | 3,515     | 21,090  |        |     |           | 105,108 |               |
| 소 계                     |                | 36  |     | 568,736 |         | 265,104   |         |        |     | 833,840   |         |               |
| 3.청소                    | 준공청소(특별인부)     | ㎡   | 45  |         |         | 6,200     | 279,000 |        |     |           | 279,000 | 2022년 실내건축 일위 |
| 소 계                     |                |     |     |         |         | 279,000   |         |        |     | 279,000   |         |               |
| 합 계                     |                |     |     | 768,560 |         | 1,798,822 |         | 0      |     | 2,567,382 |         |               |

\*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,985,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 김태균

근무부서: C10

전화번호:

010-9245-9512

사택명: 문득다움
