

콘텐츠

00집계현황_ (3월 월마감 기숙사 및 사택).....	2
01완료사진_ (사택 104-403 세대내 고장 보일러 교체).....	3
02완료사진_ (사택 102-202 세대내 조명 교체).....	4
03완료사진_ (사택 104-303 거실 및 방 단열작업).....	5
04완료사진_ (사택 104-303 수장공사 및 기타보수).....	6
05완료사진_ (사택 104-402 수장공사 및 기타보수).....	7
06 03월 체크시트(관리소)_ 화학.....	8
01 사택 104-403 세대내 고장 보일러 교체.....	8
02 사택 102-202 세대내 조명 교체.....	9
03 사택 104-303 수장공사 및 기타보수.....	10
04 사택 104-303 거실 및 방 단열작업.....	11
05 사택 104-402 수장공사 및 기타보수.....	12

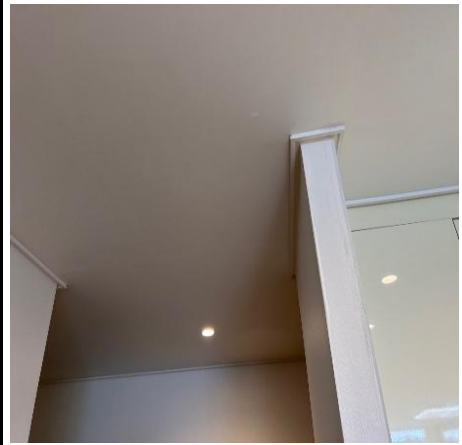
기숙사 및 사택 3월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	A/B (요일)
					14,006,000	13,979,300	==>일성-일반(3 건)	0%
					1,625,000	1,624,325	==> 동운(1 건)	0%
					1,720,000	1,710,325	==> 대양(1 건)	-1%
					17,351,000	17,313,950	3월 마감건(5 건)	0%
1	03월31일	사택 104-403 세대내 고장 보일러 교체	대상: 104-403 세대내 노후로인한 열교환기 및 가스가버너 고장으로 교체 뒷베란다 비닐 보양 작업 및 완료후 정리 정돈 귀뚜라미 보일러 (ECO콘덴싱) : 1대 철거 및 교체 작업 교체 완료후 도시가스 누기 점검 작업 교체 완료후 배관 통수 및 시운전 교체 보일러 전면부에 사용 허가 증빙부착 교체 완료후 주변 청소 작업	2025-02-12	1,625,000	1,624,325	동운	0%
2	03월31일	사택 102-202 세대내 조명 교체	조명기구 사양: 입주민의 요청 사양에 준함 교체대상: 거실(2개)_방(4개)_현관(2개) 교체 교체대상: 주방(4개) 조명 기구 교체 기존 조명등 철거 작업 신규 조명등 설치 작업 교체 완료후 기존 조명 기구 폐기물 처리 작업 세대내 주변 정리정돈	2025-02-20	1,720,000	1,710,325	대양이앤씨	-1%
3	03월31일	사택 104-303 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_ 방3곳 천정-거실_ 방3곳)_합지 작업 장판(거실_ 방3곳) 및 도장(앞_뒤베란다 전체) 작업 방충망-4개(뒤베란다_ 주방_ 가운데방_ 현관입구방)교체 걸레받이 15곳(안방(2곳)_ 거실(4곳)_ 가운데방(6곳)_ 현관입구(3곳) 교체 주방 벽타일 상부 마감재 물딩 보수 싱크대 상판 교체 후 상판 실리콘 재코킹 작업 준공청소 작업	2025-03-10	6,865,000	6,853,125	일성건축	0%
4	03월31일	사택 104-303 거실 및 방 단열작업	단열 대상 : 안방_ 거실_가운데방_현관 입구 방 단열 대상 : 창문 샤시측 벽면 단열재 시공 기존 단열재 및 걸레받이 철거 작업 창문 샤시측 벽면 곰팡이 제거 작업 신규 열반사 시트 설치 작업 신규 이보드 설치 작업 신규 걸레받이 설치 작업	2025-02-19	2,345,000	2,330,600	일성건축	-1%
5	03월31일	사택 104-402 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_방3곳) 및 장판(거실_방3곳) 작업 도장(앞_뒤베란다 전체) 작업 방충망-2개(가운데방_현관입구방)교체 작업 걸레받이 교체-3곳(가운데방(1곳)_현관입구방(1곳)_거실(1곳)) 문끌림-1개(안방문) 보수 싱크대 상판 전체 실리콘(들뜸) 재코킹 폐기물 처리 및 준공청소 작업	2025-03-06	4,796,000	4,795,575	일성건축	0%

공사 완료 사진

업 체 명	동운		공사일자	2025년 02월12일
공 사 명	사택 104-403 세대내 고장 보일러 교체		제출일자	2025년 03월
작업사진				
내 용	교체 대상 세대	신규 보일러	교체 보일러 분리	
작업사진				
내 용	신규 보일러 포장 해제	교체 보일러 철거	신규 보일러 설치	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

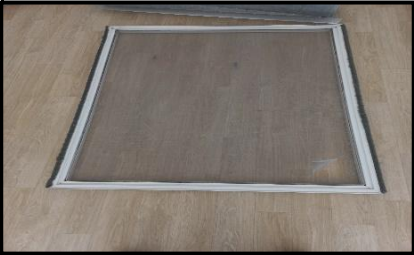
공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2025년 03월
공 사 명	사택 102-202 세대내 조명 교체		제출일자	2025년 03월
작업사진				
내 용	전등교체		전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체		전등교체	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.17 - 2025.02.19
공 사 명	사택 104-303 거실 및 방 단열작업		제출일자	2025.03.20
작업사진				
내 용	안방단열(작업전)		안방단열(작업중)	
작업사진				
내 용	안방단열(작업후)			
내 용	거실단열(작업전)		거실단열(작업중)	
작업사진				
내 용	거실단열(작업후)			
내 용	작은방단열(작업전)		작은방단열(작업중)	
작업사진				
내 용	작은방단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.19 - 2025.03.07
공 사 명	사택 104-303 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		걸레반이(작업전)	상판 교체(작업전)
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		걸레반이(작업후)	상판 교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.02.14 - 2025.03.06
공 사 명	사택 104-402 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.03.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용	방충망(작업전)	걸레받이(작업전)	실리콘(작업전)	
작업사진				
내 용	방충망(작업후)	걸레받이(작업후)	실리콘(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

기타 공사 체크리스트

공사명	104-403 보일러 교체					공사업체	동운
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025 년 3 월 12 일						
현장점검인	이 광희 점검인 (인)						
최종점검인	노 해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	102-202 세대내 조명 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2025년 3월 20일						
현장점검인	이정희 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

104동 303호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-4개(뒤베란다, 주방, 가운데방, 현관입구방)교체, 창문샤시측 벽면(공팡이 제거포함)단열재시공 및 재시공-4곳(안방, 거실, 가운데방, 현관입구방-걸레받이 교체포함), 걸레받이 교체-15곳(안방(2곳), 거실(4곳), 가운데방(6곳), 현관입구(3곳)), 주방 벽타일 상부 마감재 물딩보수또는 교체, 싱크대상판보수또는 교체, 싱크대상판실리콘재코킹작업		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025년 3월 11일					
현장점검인		b 김의 점검인 김의					
최종점검인		최종점검인 최의					

수장공사 체크리스트

104동 303호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-4개(뒤베란다, 주방, 가운데방, 현관입구방)교체, 창문샤시측 벽면(공팡이제거포함)단열재시공 및 재시공-4곳(안방, 거실, 가운데방, 현관입구방-걸레받이교체포함), 걸레받이교체-15곳(안방(2곳), 거실(4곳), 가운데방(6곳), 현관입구(3곳)), 주방 벽타일 상부 마감재 물딩보수또는 교체, 싱크대상판보수또는 교체, 싱크대상판실리콘재코킹작업		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025년 3월 11일					
현장점검인		b 김의 점검인 김의					
최종점검인		최종인 점검인 최					

수장공사 체크리스트

104동 402호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-2개(가운데방,현관입구방)교체, 걸레받이교체-3곳(가운데방(1곳),현관입구방(1곳),거실(1곳)),문걸림-1개(안방문),싱크대 상판 전체 실리콘(들뜸)재코킹작업		○	○		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2025년 3월 11일					
현장점검인		이광희 점검인 (인)					
최종점검인		최종점검인 (인)					
