

콘텐츠

01	집행현황	(12월 월마감 기숙사 및 사택)	2
02	완료사진	(12월 월마감 기숙사 및 사택)	4
01	완료사진	(사택 1-101 수장공사 및 기타보수)	4
02	완료사진	(사택 1-107 수장공사 및 기타보수)	5
03	완료사진	(사택 1-201 수장공사 및 기타보수)	6
04	완료사진	(사택 1-304 수장공사 및 기타보수)	7
05	완료사진	(사택 1-405 수장공사 및 기타보수)	8
06	완료사진	(사택 1-406 수장공사 및 기타보수)	9
07	완료사진	(사택 104-202 수장공사 및 기타보수)	10
08	완료사진	(사택 104-202 거실 및 방 단열작업)	11
09	완료사진	(사택 104-203 수장공사 및 기타보수)	12
10	완료사진	(사택 104-401 수장공사 및 기타보수)	13
11	완료사진	(사택 104-301 수장공사 및 기타보수)	14
12	완료사진	(기숙사 B동 롤방충망 32개 교체(주방 및 복도))	15
13	완료사진	(기숙사 B동 202-1호외 5세대 도배 및 기타작업)	16
03	관리소 체크시트	(12월 월마감 기숙사 및 사택)	17
01	관리소 체크시트	(사택 1-101 수장공사 및 기타보수)	17
02	관리소 체크시트	(사택 1-107 수장공사 및 기타보수)	18
03	관리소 체크시트	(사택 1-201 수장공사 및 기타보수)	19
04	관리소 체크시트	(사택 1-304 수장공사 및 기타보수)	20
05	관리소 체크시트	(사택 1-405 수장공사 및 기타보수)	21
06	관리소 체크시트	(사택 1-406 수장공사 및 기타보수)	22
07	관리소 체크시트	(사택 104-202 수장공사 및 기타보수)	23
08	관리소 체크시트	(사택 104-202 거실 및 방 단열작업)	24
09	관리소 체크시트	(사택 104-203 수장공사 및 기타보수)	25
10	관리소 체크시트	(사택 104-401 수장공사 및 기타보수)	26
11	관리소 체크시트	(사택 104-301 수장공사 및 기타보수)	27
12	관리소 체크시트	(기숙사 B동 롤방충망 32개 교체(주방 및 복도))	28
13	관리소 체크시트	(기숙사 B동 202-1호외 5세대 도배 및 기타작업)	29

가속사 및 사택 12월 마감 작업 진행 현황 집계표(확화)

NO.	매입 (월-일)	제 목	목이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	A/B (요일)
					64,606,000	61,516,875	==>일성-일반(13 건)	-5%
1	12월31일	사택 1-101 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞베란다 걸레받이 및 벽면 부분 도장) 작업 도장(뒤베란다 걸레받이 및 벽면 부분 도장) 작업 싱크대 상판 전체 실리콘 재코킹 작업 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수 및 준공청소 작업	2025-11-20	4,409,000	4,198,950	일성건축	-5%
2	12월31일	사택 1-107 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞베란다 걸레받이(천정_벽면 곰팡이제거 포함)) 작업 도장(뒤베란다 걸레받이(천정_벽면 곰팡이제거 포함)) 작업 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수 작업 준공청소 작업	2025-11-20	4,169,000	3,969,975	일성건축	-5%
3	12월31일	사택 1-201 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞뒤베란다 걸레받이 및 벽면 부분 도장 (뒤베란다 벽면_ 천정 곰팡이제거포함)) 보수 싱크대 상판 전체 실리콘 재코킹작업 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수 문골림-2개(화장실좌측방문_ 화장실문) 및 준공청소 작업	2025-11-19	4,783,000	4,554,775	일성건축	-5%
4	12월31일	사택 1-304 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞_뒤베란다 걸레받이) 작업 뒤베란다 벽면 크랙 전체보수 문골림-1개(화장실좌측방문) 작업 준공청소 작업	2025-11-19	4,320,000	4,114,025	일성건축	-5%
5	12월31일	사택 1-405 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞베란다 걸레받이) 작업 도장(뒤베란다 걸레받이) 작업 문골림-1개(화장실 좌측 방문) 작업 준공청소 작업	2025-11-18	4,320,000	4,114,025	일성건축	-5%
6	12월31일	사택 1-406 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_ 방2곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방2곳)_합지 작업 장판(거실_ 방2곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞베란다 걸레받이 및 벽면 부분도장(곰팡이제거포함)) 작업 도장(뒷베란다 걸레받이 및 벽면 부분도장(곰팡이제거포함)) 작업 싱크대 상판 전체 실리콘(들뜸) 재코킹작업 뒤베란다 벽면 전체 크랙보수 및 준공청소 작업	2025-11-18	4,409,000	4,198,950	일성건축	-5%
7	12월31일	사택 104-202 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_ 방3곳)_합지 작업 도배(천정-거실_ 방3곳)_합지 작업 장판(거실_ 방3곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞_뒤베란다 전체) 작업 방충망-3개(앞베란다실외기실_ 가운데방_ 거실우측방)교체 작업 싱크대 상판전체 실리콘 재코킹 작업 문골림-3개(안방문_ 가운데방문_ 거실우측방문) 및 준공청소 작업	2025-11-25	6,730,000	6,409,150	일성건축	-5%

가속사 및 사택 12월 마감 작업 진행 현황 집계표(화확)

NO.	매입 (월-일)	제 목	목이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	A/B (요일)
8	12월31일	사택 104-202 거실 및 방 단열작업	장소: 창문측 벽면 단열재 4개소 .안방_가운데방_거실우측방_거실 - 걸레받이교체포함 천장 몰딩 및 바닥 걸레받이 철거 작업 기존 단열재 설치 부분 열반사 시트 설치 작업 기존 단열재 철거후 신규 설치 작업 천장 몰딩 및 바닥 걸레받이 설치 작업 작업 완료후 폐기를 처리 작업	2025-11-13	3,449,000	3,285,200	일성건축	-5%
9	12월31일	사택 104-203 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_ 방3곳) 및 도배(천정-거실_ 방3곳)_합지 작업 장판(거실_ 방3곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞_뒤베란다 전체) 작업 방충망-4개(뒤베란다_ 주방_ 주방좌측방_ 현관입구방)교체 썩크대 상판 전체 실리콘 재코킹 작업 걸레받이 교체-5군데(안방(2군데)_ 거실(1군데) 현관입구(2군데)) 작업 / 주방좌측방 문틀 상부 보수/문끌림-2개 (주방좌측방문_방화문) 작업	2025-11-17	7,068,000	6,731,650	일성건축	-5%
10	12월31일	사택 104-401 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_ 방3곳)_합지 작업 및 장판(거실_ 방3곳) PVC비닐게 작업 도장(앞_뒤베란다 전체) 작업 및 준공 청소 작업 방충망-3개(주방우측방_ 뒤베란다_ 주방좌측방)교체 작업 거실 창문측 천정(커튼박스) 및 벽면 누수점검 및 보수 썩크대 상판 전체 실리콘 재코킹작업 걸레받이 교체- 5군데(거실(1군데)_ 주방입구(1군데) 보수 안방화장실입구(2군데)_ 주방우측방(1군데)) 및 문끌림-2개(안방문_ 주방우측방문) 보수	2025-11-14	5,744,000	5,469,600	일성건축	-5%
11	12월31일	사택 104-301 수장공사 및 기타보수	도배(벽-거실_ 방3곳) / 도배(천정-방1곳(주방좌측방))_합지 장판(거실_ 방3곳)_PVC 비닐 작업 도장(앞_뒤베란다 전체) 보수 방충망-3개(주방좌측방_ 뒤베란다_주방우측방)교체 걸레받이 교체-8개(거실(4개)_ 주방우측방(2개) 안방(2개))_ 보수/준공청소 작업	2025-11-14	5,642,000	5,372,850	일성건축	-5%
12	12월31일	기숙사 B동 롤방충망 32개 교체(주방 및 복도)	B동 공용부분 방충망 노후화로 인한 찢어짐으로 교체 B동 공용주방 : 16개 B동 공용복도 : 16개 기존 롤방충망 철거 작업 신규 롤방충망 신규 설치 철거 롤방충망 폐기 처리 작업	2025-12-05	5,939,000	5,646,975	일성건축	-5%
13	12월31일	기숙사 B동 202-1호외 5세대 도배 및 기타작업	B202-1 : 부분 도배(화장실문옆 벽-찢어짐), 화장실문옆 석고보드 들뜸보수 B203-1 : 부분 도배(벽-얼룩짐)_ 버티칼 교체_ 화장실 문틀옆 석고보드 들뜸 보수 또는 교체 B301-6 : 부분 도배(벽-얼룩짐)_ 화장실문옆 석고보드 들뜸보수 문끌림-2개(방문_화장실문) B402-2 : 부분 도배(벽-찢어짐)_ 벽체 단열재 들뜸 디지털도어락 교체 문끌림-2개(방문_ 화장실문) B202-5 : 부분 도배(벽-얼룩짐)_ 문끌림-1개(화장실문) B204-2 : 부분 도배(벽-얼룩짐)	2025-12-11	3,624,000	3,450,750	일성건축	-5%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.01 - 2025.12.01
공 사 명	사택 1-101 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.10- 2025.11.20
공 사 명	사택 1-107 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.07- 2025.11.19
공 사 명	사택 1-201 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.07- 2025.11.19
공 사 명	사택 1-304 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.06- 2025.11.18
공 사 명	사택 1-405 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

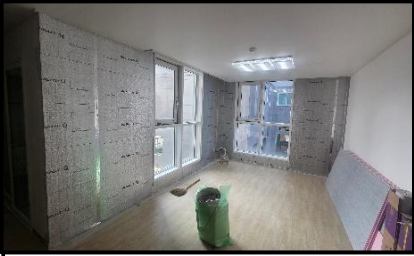
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.06- 2025.11.18
공 사 명	사택 1-406 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.05- 2025.11.25
공 사 명	사택 104-202 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.06- 2025.11.13
공 사 명	사택 104-202 거실 및 방 단열작업		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

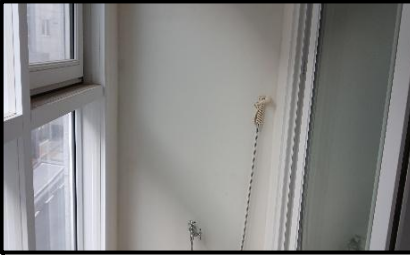
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.05- 2025.11.17
공 사 명	사택 104-203 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.04- 2025.11.14
공 사 명	사택 104-401 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.04- 2025.11.14
공 사 명	사택 104-301 수장공사 및 기타보수		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.11.06- 2025.11.13
공 사 명	기숙사 B동 롤방충망 32개 교체(주방 및 복도)		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2025.12.08- 2025.12.11
공 사 명	기숙사 B동 202-1호외 5세대 도배 및 기타작업		제출일자	2025.12.20
작업사진				
내 용	문끌림(작업전)		도어락교체(작업전)	버티컬 블라인드(작업전)
작업사진				
내 용	문끌림(작업후)		도어락교체(작업후)	버티컬 블라인드(작업후)
작업사진				
내 용	벽체보수(작업전)		석고보수(작업전)	석고보수(작업전)
작업사진				
내 용	벽체보수(작업후)		석고보수(작업후)	석고보수(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)

수장공사 및 기타보수 체크리스트

공사명	1-304 수장공사 및 기타보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 종료후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025년 11월 19일						
현장점검인	이정현 (인) 점검인						
최종점검인	조혜연 (인) 점검인 (인)						

수장공사 및 기타보수 체크리스트

공사명	1-406 수장공사 및 기타보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 종료후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025년 11월 18일						
현장점검인	이광리 점검인						
최종점검인	남해원 점검인						

수장공사 및 기타보수 체크리스트

공사명	104-202 수장공사 및 기타보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025년 11월 25일						
현장점검인	이광희 (점검인)						
최종점검인	노해원 (점검인)						

수장공사 및 기타보수 체크리스트

공사명	104-401 수장공사 및 기타보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전종후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2025년 11월 14일						
현장점검인	이정원 (점검인)						
최종점검인	남해원 (점검인)						

