

기숙사 및 사택 6월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					3,864,000	3,741,000	==>일성-일반(5 건)	-3%
					1,926,000	1,865,125	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					1,721,000	1,462,000	==>동운(1 건)	-18%
					7,511,000	7,068,125	6월 마감건(7 건)	-6%
1	06월30일	기숙사 B동 402-2호 화장실 누수보수(건축)		2023-05-24	1,515,000	1,463,075	일성건축	-4%
2	06월30일	기숙사 B동 402-2호 화장실 누수보수(기계)	사다리 보조(보통인부) 축소 2인->1인 (현장확인후 반영)	2023-05-24	1,721,000	1,462,000	동운	-18%
3	06월30일	기숙사 B동 201-6호 수장공사		2023-06-16	628,000	607,375	일성건축	-3%
4	06월30일	기숙사 B동 204-4호 화장실 문끌림 보수		2023-06-16	208,000	201,025	일성건축	-3%
5	06월30일	기숙사 B동 303-3호 수장공사		2023-06-16	628,000	607,375	일성건축	-3%
6	06월30일	기숙사 B동 304-4호 수장공사		2023-06-16	885,000	862,150	일성건축	-3%
7	06월30일	임차사택 수장공사 섬준모(양극재 개발)		2023-05-22	1,926,000	1,865,125	일성건축	-3%

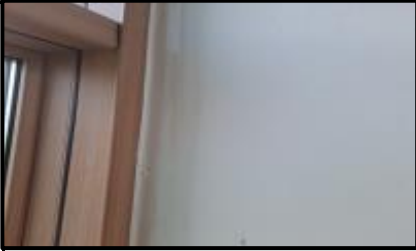
공사 완료 보고서

[illegible]

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.05.24
공 사 명	기숙사 B동 402-2호 화장실 누수 보수	제출일자	2023.05.24
작업사진			
내 용	작업위치	배수배관 철거 전	배수배관 철거 및 하부 정비
작업사진			
내 용	배수배관 연결	바닥 육가 정비	바닥 육가 정비 완료
작업사진			
내 용	바닥 육가 정비 전	바닥 육가 정비 전	정비 완료


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.06.14- 2023.06.16
공 사 명	기숙사 B동 201-6호 수장공사	제출일자	2023.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	문보수(작업전)	곰팡이(제거전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	문보수(작업후)	곰팡이(제거후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)		
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.06.14 - 2023.06.14
공 사 명	기숙사 B동 204-4호 화장실 문끌림 보수		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		문보수(작업중)	문보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

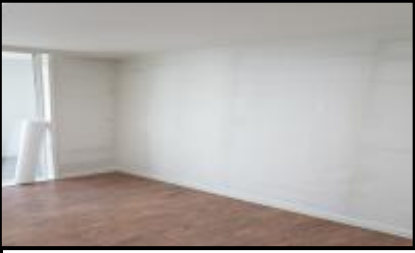
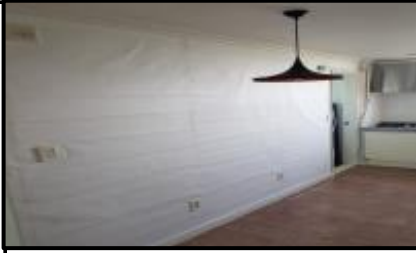
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.06.15 - 2023.06.16
공 사 명	기숙사 B동 303-3호 수장공사		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	문보수(작업전)	벽보수(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	문보수(작업후)	벽보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.06.14- 2023.06.16
공 사 명	기숙사 B동 304-4호 수장공사		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		문보수(작업전)	버티컬(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		문보수(작업후)	버티컬(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.05.22- 2023.05.22
공 사 명	임차사택 수장공사 성준모(양극재 개발)		제출일자	2023.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공사명:임차사택 수장공사 성준모(양극재개발)												
1.도배	LG휘왕세 광폭											재료비 물가자료 2020년 11월적용(2021 적용 DB자료 없음,2020년과 동일 가격임) 노무비 2021 DB 적용
	거실 벽면	㎡	40	1,086	43,440	5,261	210,440				253,880	
	거실 천정	㎡	24	1,086	26,064	6,839	164,136				190,200	
	방A 벽면	㎡	32	1,086	34,752	5,261	168,352				203,104	
	방A 천정	㎡	16	1,086	17,376	6,839	109,424				126,800	
	방B 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방B 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	방C 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방C 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	147			1,283	188,858				188,858	
소 계			184		199,824		1,254,718				1,454,542	
2.바닥재	LG청맥											
	거실 바닥 절거	㎡										
	방A 바닥 절거	㎡										
	방B 바닥 절거	㎡										
	방C 바닥 절거	㎡										
	접착제(부분접착)	kg										
	거실 바닥	㎡										
	방A 바닥	㎡										
	방B 바닥	㎡										
방C 바닥	㎡											
소 계			0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡										2022년 실내건축 일위
소 계							0				0	
합 계					199,824		1,254,718		0		1,454,542	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,735,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 성준모 근무부서: 판입사양극재개발팀 전화번호: 010 2763 7342 사택명: 청주4대 106동 1005호
