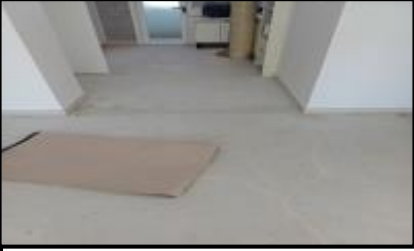


기숙사 및 사택 12월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (오율)
					15,863,000	15,197,275	==>일성-일반(6 건)	-4%
					15,863,000	15,197,275	12월 마감건(6 건)	-4%
1	12월31일	사택 1-101 수장공사		2023-11-29	3,083,000	2,946,575	일성건축	-5%
2	12월31일	사택 1-205 수장공사		2023-11-29	3,083,000	2,946,575	일성건축	-5%
3	12월31일	사택 1-205외 1세대 기타 보수		2023-11-27	851,000	812,700	일성건축	-5%
4	12월31일	사택 1-405 수장공사		2023-11-29	2,840,000	2,714,375	일성건축	-5%
5	12월31일	사택 104-403 수장공사		2023-11-29	5,185,000	4,954,675	일성건축	-5%
6	12월31일	사택 104-503 UBR 육조 및 방문 보수		2023-11-28	821,000	822,375	일성건축	0%

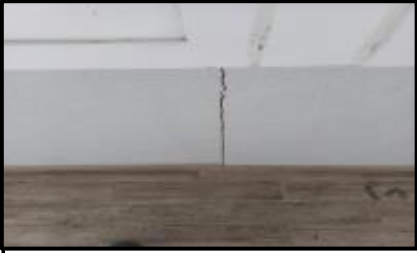
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.11.20 - 2023.11.29
공 사 명	사택 1-101 수장공사		제출일자	2023.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.11.20 - 2023.11.29
공 사 명	사택 1-205 수장공사		제출일자	2023.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

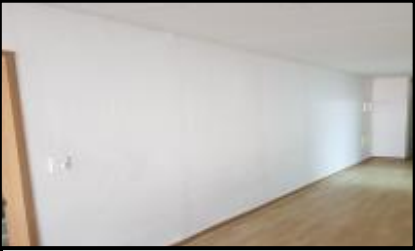
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.11.27 - 2023.11.27
공 사 명	사택 1-205외 1세대 기타보수	제출일자	2023.12.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	우수관 고정(작업전)	
작업사진			
내 용	보수(작업중)	우수관 고정(작업후)	
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.11.20 - 2023.11.29
공 사 명	사택 1-405 수장공사		제출일자	2023.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.11.24 - 2023.11.28
공 사 명	사택 101-403 수장공사		제출일자	2023.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.11.28 - 2023.11.28
공 사 명	104-503 사택 101-503 UBR 욕조 및 방문 보수		제출일자	2023.12.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	문끌림(작업전)		문끌림(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
