

사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체 Hold Point 촬영/승인 결과보고서

No.	작업일자▼	작업기간		공사번호	공사명	중대위험 구분
		From	To			
1	2025-06-13	2025-06-13 09:00	2025-06-13 18:00	CI25007826	[ESPR:93041254]사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체	☒
2	2025-06-12	2025-06-12 09:00	2025-06-12 18:00	CI25007826	[ESPR:93041254]사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체	☒
3	2025-06-11	2025-06-11 09:00	2025-06-11 18:00	CI25007826	[ESPR:93041254]사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체	☒
4	2025-06-10	2025-06-10 09:00	2025-06-10 18:00	CI25007826	[ESPR:93041254]사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체	☒
5	2025-06-09	2025-06-09 09:00	2025-06-09 18:00	CI25007826	[ESPR:93041254]사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체	☒

06월13일

← 운영센터 고위험작... 15 🔍 ☰

2025년 6월 13일 금요일 >

● 중대위험 점검 (스카이/고소) 현 시간부로 2동, A동 외벽 도장 보수 및 지붕 점검(5동 및 7동) 진행 하고자 합니다.

-계 획: 6월 9일(월)~13일(금).5일간

-금 일: [6월13일]

-[오전]7동 지붕 점검

-[오후]A동 외벽 훼손 도장 보수

-위 차: A동 외벽, 7동 전면부 박공 지붕

-중 대: 스카이/고소(약 17m) 작업

-투 입: 5인(관리1 포함)/ 일성건축

-조 치 사항: 스카이 장비 설치 상태, 안전대, 안전장구 착용, 신호수 배치 확인

Hold point 특이사항 없음: 스카이가 장비 설치 상태 이상없음.

승인 부탁드립니다



오전 9:11 FM-이서익

오늘 비 예보가 되어 있으니 날씨 상황 잘 보시고 작업 진행 바랍니다

오전 9:12

06월12일

← 운영센터 고위험작... 15 🔍 ☰

2025년 6월 12일 목요일 >

● 중대위험 점검 (스카이/고소) 현 시간부로 2동, A동 외벽 도장 보수 및 지붕 점검(5동 및 7동) 진행 하고자 합니다.

-계 획: 6월 9일(월)~13일(금).5일간

-금 일: [6월12일]

-[오전]2동 지붕 배수로 기와 교체

-[오후]5동, 7동 점검후 무동력현 교체

-위 차: 2동, 5동, 7동 전면부 박공 지붕

-중 대: 스카이/고소(약 17m) 작업

-투 입: 5인(관리1 포함)/ 일성건축

-조 치 사항: 스카이 장비 설치 상태, 안전대, 안전장구 착용, 신호수 배치 확인

Hold point 특이사항 없음: 스카이가 장비 설치 상태 이상없음.

승인 부탁드립니다



오전 9:08 FM-이서익

승인합니다~

오전 9:10

06월11일

← 운영센터 고위험작... 15 🔍 ☰

2025년 6월 11일 수요일 >

● 중대위험 점검 (스카이/고소) 현 시간부로 2동, B동 외벽 도장 보수 및 지붕 점검(5동 및 7동) 진행 하고자 합니다.

-계 획: 6월 9일(월)~13일(금).5일간

-금 일: [6월11일] 2동 지붕 배수로 기와 교체

-위 차: 2동 전면부 박공 지붕

-중 대: 스카이/고소(약 17m) 작업

-투 입: 5인(관리1 포함)/ 일성건축

-조 치 사항: 스카이 장비 설치 상태, 안전대, 안전장구 착용, 신호수 배치 확인

Hold point 특이사항 없음: 스카이가 장비 설치 상태 이상없음.

승인 부탁드립니다



오전 9:22 FM-이서익

승인합니다

오전 9:23

06월10일

← 운영센터 고위험작... 15 🔍 ☰

2025년 6월 10일 화요일 >



● 중대위험 점검 (스카이/고소) 현 시간부로 2동, B동 외벽 도장 보수 및 지붕 점검(5동 및 7동) 진행 하고자 합니다.

-계 획: 6월 9일(월)~13일(금).5일간

-금 일: [6월10일] 2동 지붕 배수로 기와 교체

-위 차: 2동 전면부 박공 지붕


-중 대: 스카이/고소(약 17m) 작업

-투 입: 5인(관리1 포함)/ 일성건축

-조 치 사항: 스카이 장비 설치 상태, 안전대, 안전장구 착용, 신호수 배치 확인

Hold point 특이사항 없음: 스카이가 장비 설치 상태 이상없음.

승인 부탁드립니다



오전 9:19 FM-이서익

승인합니다

오전 9:19

06월09일

← 운영센터 고위험작... 15 🔍 ☰

2025년 6월 9일 월요일 >

● 중대위험 점검 (스카이/고소) 현 시간부로 2동 및 지붕 점검(5동 및 7동) 진행 하고자 합니다.

-계 획: 6월 9일(월)~13일(금).5일간

-금 일: 2동 지붕 배수로 기와 교체

-위 차: 2동 전면부 박공 지붕

-중 대: 스카이/고소(약 17m) 작업

-투 입: 5인(관리1 포함)/ 일성건축

-조 치 사항: 스카이 장비 설치 상태, 안전대, 안전장구 착용, 신호수 배치 확인

Hold point 특이사항 없음: 스카이가 장비 설치 상태 이상없음.

승인 부탁드립니다



오전 10:57 FM-이서익


안전관리는 규정에 의거하여 점검 후 진행 바랍니다

금주 금요일 오후 비 예정 되어 있습니다. 일정 반영 부탁드립니다

오전 11:00

[별첨] 중대위험작업 관리 프로세스

위험성평가의 내실화 Hold Point를 이용한 현장관리자 승인 명확화를 통한 안전관리 강화

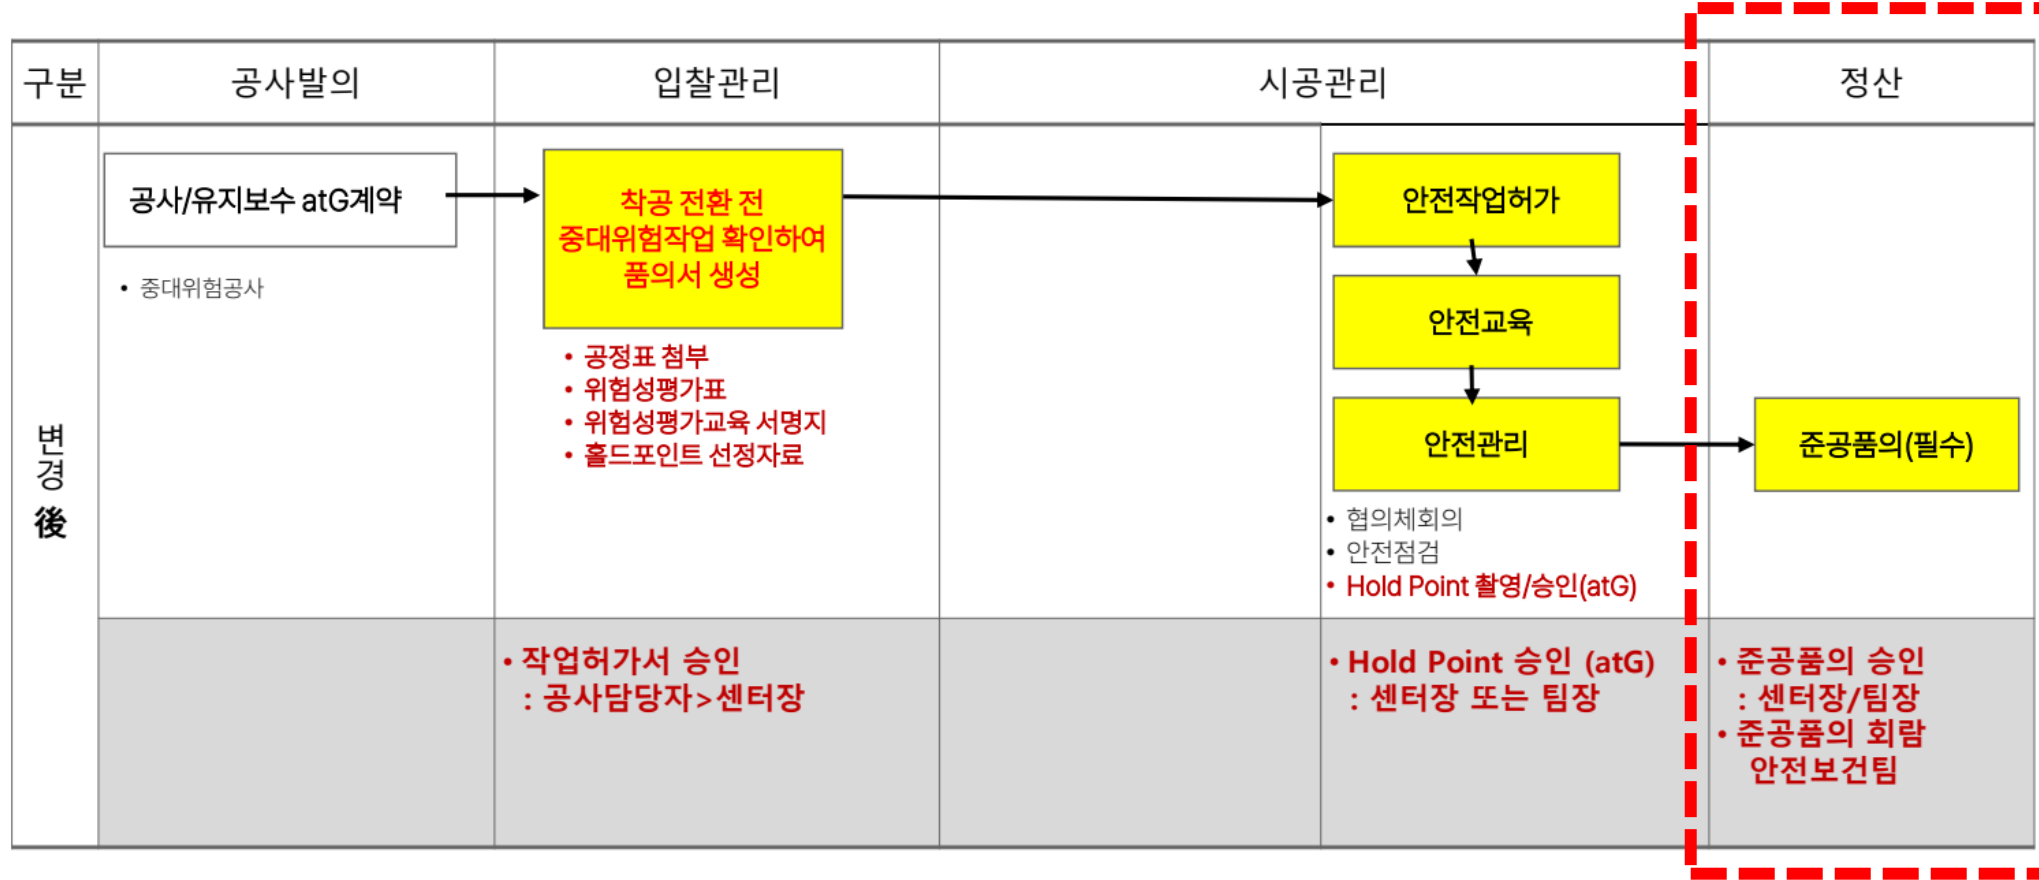

Hold Point 촬영/승인 결과보고서 가이드 _ 접수

별첨4) 엣지 준공품의

2. ② 결과보고서는 작업 일자별 작성후 첨부, 준공품의 완료후 안전보건팀 ③ 회람

■ 결과보고서

- (시스템구축 前) 사진 또는 text

2 00공사 Hold Point 촬영/승인 결과보고서



■ 준공품의서(샘플)

- 결재 : 센터장/팀장
- 회람 : 안전보건팀

준공품의											
기본 사항											
문서번호	5000879-2018-005031			보안등급	일반	보존연한	3년				
상신일	2018-12-04 15:19:12			기안자	구매팀 안성준 - (02-6924-5610)						
승인일월	최종승인시			일월수단	매일		부서공유()				
제목 [임대수선]냉각탑 1호기 수선공사 준공품의 건											
세부 항목											
-세부내용											
■ 아래와 같이 공사가 준공되어 준공품의를 상신하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.											
- 아 래 -											
1. 개요											
부서	GS타워운영센터			공사 담당자	안성준						
공사명	[임대수선]냉각탑 1호기 수선공사			공사내용	-, 냉각탑 1호기 수선공사						
종류	수리여부			Y	인허가	완료여부		NA			
2. 공사 명산											
[부가세 별도]											
구분	공종	계약기간				변경 전		변경 후		종강	공사완료일
배출	(주)지베스	-	변경 전	변경 후	금액	비율	금액	비율			
			2018.0 1.01~20 18.12.3 1		70,013, 000	100	0	0	0		
배	하이엔슬루팩	기계	2018.1 1.01~20 18.1 1.01~20		47,570, 000	100	65,240, 000	100	17,670, 000	2018.11.3	
첨부파일											
GS타워 준공사진 -냉각탑보수공사.pptx (11661914Byte)											
공사 특기사항 GS타워 냉각탑 1호기 수선공사.pptx (1960983Byte)											
GS타워 냉각탑 1호기 수선공사_참고자료(기준계약).xlsx (7586441Byte)											
GS타워 냉각탑 1호기 수선공사_참고자료(변경계약 추가부분).xlsx (4472450Byte)											
결재 정보											
결재 단계											
결재인	1	결재	승인	2018-12-04 15:19:12	구매팀 안성준 - (02-6924-5610) [회견] 자가승인합니다.						
	2	결재	승인	2018-12-04 15:39:10	DGIST 운영센터 역전팀 - (053-720-7857) [회견] 냉각탑 1, 2호기 긴급보수공사 준공으로 시운전을 통한 문제 발견시 엣지시스템 하자보수로 진행예정입니다.						
	3	결재	승인	2018-12-05 08:24:47	KB국민은행신원운영센터 이영훈 운영센터장						
	4	결재	승인	2018-12-05 09:01:38	BIFC 운영센터 김재찬 운영센터장 (051-955-5316)						
