

2월 마감 작업 진행 현황 집계표

20-2-25

NO.	매입 마감 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	B/A (요일)
	2월				132,707,000 1,051,000 4,709,000 2,211,000 140,678,000	129,164,475 1,011,575 4,542,950 2,104,850 136,823,850	==>일성-일반(39 건) ==>일성-임차사택(2 건) ==>수안(3 건) ==>하이엠텔루텍(1 건) 2월 마감건(45 건)	==>3% ==>4% ==>4% ==>5% ==>3%
1	02월28일	기숙사 3동 207호 도배보수의 1건	한세대 벽도배 종북되어 있음(종북 관계필요) '18년 12월 벽도배완료=> [희박PR:91845204]기숙사 3동 602호 도배보수 '20년 3월 작업중=> 기숙사 3동 613호 소음개선작업(벽전체도배)에 견적에서 벽도배만 관계	2020-01-29	945,000	910,525	일성건축	==>4%
2	02월28일	기숙사 3동 313호 소음개선작업		2020-01-30	1,814,000	1,757,625	일성건축	==>3%
3	02월28일	기숙사 3동 410호 소음개선작업(벽전체도배)		2020-01-30	1,952,000	1,892,000	일성건축	==>3%
4	02월28일	기숙사 3동 510호 소음개선작업(벽전체도배)		2020-01-30	1,952,000	1,892,000	일성건축	==>3%
5	02월28일	기숙사 3동 516호 소음개선작업(벽전체도배)		2020-01-30	1,952,000	1,892,000	일성건축	==>3%
6	02월28일	기숙사 A동 202-3호 도배보수의 7건		2020-01-29	4,384,000	4,235,500	일성건축	==>3%
7	02월28일	기숙사 B동 203-1호 도배보수의 6건		2020-01-29	4,006,000	3,870,000	일성건축	==>3%
8	02월28일	기숙사 B동 지하주차장 천장 누수보수		2020-02-13	2,917,000	2,832,625	일성건축	==>3%
9	02월28일	사택 1-305 수장공사		2020-02-13	2,020,000	1,959,725	일성건축	==>3%
10	02월28일	사택 1-405 수장공사		2020-02-13	2,547,000	2,470,350	일성건축	==>3%
11	02월28일	사택 2-407 수장공사		2020-02-13	2,739,000	2,655,250	일성건축	==>3%
12	02월28일	사택 101-401 수장공사		2020-02-18	3,494,000	3,388,400	일성건축	==>3%
13	02월28일	사택 102-205 수장공사		2020-02-18	4,038,000	3,915,150	일성건축	==>3%
14	02월28일	사택 102-506 수장공사		2020-02-17	4,038,000	3,915,150	일성건축	==>3%
15	02월28일	사택 104-203 수장공사		2020-02-17	1,055,000	1,021,250	일성건축	==>3%
16	02월28일	기숙사 AB동 라운지 및 사무실 EHP 수리		2020-01-31	2,211,000	2,104,850	하이엠텔루텍	==>5%
17	02월28일	사택 5-506 내부 창호교체(고층)		2020-02-11	6,377,000	6,235,000	일성건축	==>2%
18	02월28일	사택 6-303 내부 창호교체(고층)		2020-02-07	6,850,000	6,699,400	일성건축	==>2%
19	02월28일	사택 8-203 내부 창호교체(고층)		2020-02-04	6,924,000	6,772,500	일성건축	==>2%
20	02월28일	사택 9-506 내부 창호교체(고층장비)		2020-02-12	8,773,000	8,553,775	일성건축	==>2%
21	02월28일	사택 8-110 내부 창호교체(저층)		2020-02-10	6,924,000	6,772,500	일성건축	==>2%
22	02월28일	사택 101-401 베란다 누수보수		2020-01-30	1,019,000	982,550	일성건축	==>4%
23	02월28일	사택 102-205 베란다 누수보수		2020-02-04	1,019,000	982,550	일성건축	==>4%
24	02월28일	사택 102-506 베란다 누수보수		2020-02-05	1,019,000	982,550	일성건축	==>4%
25	02월28일	사택 104-203 베란다 누수보수		2020-02-07	1,019,000	982,550	일성건축	==>4%
26	02월28일	사택 102-202 단열작업		2020-02-11	2,026,000	1,960,800	일성건축	==>3%
27	02월28일	사택 6-303 불박이장 교체(고층)		2020-02-06	2,324,000	2,280,075	일성건축	==>2%
28	02월28일	사택 6-303 썬크대 교체(고층)		2020-02-06	2,809,000	2,763,825	일성건축	==>2%
29	02월28일	사택 5-506 수장공사		2020-02-18	4,220,000	4,093,600	일성건축	==>3%
30	02월28일	사택 6-303 수장공사		2020-02-13	3,743,000	3,631,350	일성건축	==>3%
31	02월28일	사택 5-101 내부 창호교체(저층)		2020-02-17	6,377,000	6,238,225	일성건축	==>2%
32	02월28일	사택 5-503 내부 창호교체(고층장비)		2020-02-18	6,817,000	6,660,700	일성건축	==>2%
33	02월28일	기숙사 3동 220호 도배보수		2020-02-13	473,000	455,800	일성건축	==>4%
34	02월28일	기숙사 3동 333호 소음개선작업(벽전체도배)		2020-02-13	1,952,000	1,893,075	일성건축	==>3%
35	02월28일	기숙사 3동 413호 소음개선작업(벽전체도배)		2020-02-13	1,952,000	1,893,075	일성건축	==>3%
36	02월28일	기숙사 A동 304-6호외 5세대 도배보수		2020-02-13	2,833,000	2,736,950	일성건축	==>3%
37	02월28일	사택 2-308 단열작업		2020-02-12	2,001,000	1,937,150	일성건축	==>3%
38	02월28일	사택 7-204 수장공사		2020-02-14	1,189,000	1,148,100	일성건축	==>3%
39	02월28일	사택 6-103 내부 창호교체(저층)		2020-02-14	6,850,000	6,702,625	일성건축	==>2%
40	02월28일	사택 8-303 내부 창호교체(고층장비)		2020-02-19	7,364,000	7,198,200	일성건축	==>2%
41	02월28일	사택 8-109외 5세대 누수점검 및 보수		2020-02-17	1,222,000	1,174,975	수안	==>4%
42	02월28일	사택 8-301 화장실 누수 매립배관 교체		2020-02-17	2,725,000	2,633,750	수안	==>3%
43	02월28일	사택 5-106 거실 누수 매립배관 교체		2020-02-17	762,000	734,225	수안	==>4%
44	02월28일	임차사택 수장공사 이견호(석유화확)		2020-01-30	525,000	505,250	일성건축	==>4%
45	02월28일	임차사택 수장공사 손병대(소형천지)		2020-02-07	526,000	506,325	일성건축	==>4%

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 이건호(석유화학)											
1.도배	LG휘양세 광폭										
	거실 벽면	m'									
	거실 천정	m'									
	방A 벽면	m'									
	방A 천정	m'									
	방B 벽면	m'									
	방B 천정	m'									
	방C 벽면	m'									
	방C 천정	m'									
소 계			0		0		0				0
2.바닥재	LG청맥										
	거실 바닥 철거	m'									
	방A 바닥 철거	m'									
	방B 바닥 철거	m'									
	방C 바닥 철거	m'									
	접착제(부분접착)	kg									
	거실 바닥	m'									
	방A 바닥	m'									
	방B 바닥	m'									
	방C 바닥	m'									
소 계			0		0		0				0
3.청소	준공청소(특별인부)	m'	45			5,174	232,830				232,830
소 계						232,830				232,830	
4.현장정리		m'	10			15,522	155,220				155,220
소 계						155,220				155,220	
합 계					0	388,050		0		388,050	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩470,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 이건호 근무부서: 석유화학연구소 전화번호: 010-5490-4645 사택명: 코아2

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
임차사택 수장공사 손병대책임											
1.도배	LG휘양세 광폭										
	거실 벽면	m ²									
	거실 천정	m ²									
	방A 벽면	m ²									
	방A 천정	m ²									
	방B 벽면	m ²									
	방B 천정	m ²									
	방C 벽면	m ²									
	방C 천정	m ²									
소 계			0		0		0				0
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥 철거	m ²									
	방A 바닥 철거	m ²									
	방B 바닥 철거	m ²									
	방C 바닥 철거	m ²									
	접착제(부분접착)	kg									
	거실 바닥	m ²									
	방A 바닥	m ²									
	방B 바닥	m ²									
	방C 바닥	m ²									
소 계			0		0		0				0
3.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45			5,174	232,830				232,830
소 계							232,830				232,830
4.현장정리		m ²	10			15,522	155,220				155,220
소 계							155,220				155,220
합 계					0		388,050		0		388,050

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩471,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명:

손병대

근무부서:

임차사택

전화번호:

02-2556-5023

사택명:

임/정/영/정

수장공사 Check List

2020년 02월 20일

품 명	규 격	단 위	수 량	검 수 현 황		비 고
				완 료	미 흡	
1동 305호 수장공사						
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)					
	거실 벽면(㎡)	㎡	43	0		
	거실 천정(㎡)	㎡	17			
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방A 천정(㎡)	㎡	12			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방B 천정(㎡)	㎡	12			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방C 천정(㎡)	㎡	12			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0		
	벽지돋기	㎡	142	0		
	벽 부직포붙이기	㎡	142	0		
	2.바닥재	LG청택				
거실 바닥(㎡)		㎡	17	0		
방A 바닥(㎡)		㎡	12	0		
방B 바닥(㎡)		㎡	12	0		
방C 바닥(㎡)		㎡	12	0		
3.도장	KCC합성수지					
	베란다 전면(㎡)	㎡	22			
	베란다 후면(㎡)	㎡	30			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	20			
	방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0		
	준공청소(보통인부)	인	2	0		
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 중 근 (인)					
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장공사 Check List

2020년 02월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황		비 고
				완료	미흡	
1동 405호 수장공사						
1.도배	LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)					
	거실 벽면(㎡)	㎡	43	0		
	거실 천정(㎡)	㎡	17	0		
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방A 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0		
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0		
	벽지뜯기	㎡	142	0		
	벽 부직포붙이기	㎡	142	0		
	2.바닥재	LG청택				
거실 바닥(㎡)		㎡	17	0		
방A 바닥(㎡)		㎡	12	0		
방B 바닥(㎡)		㎡	12	0		
방C 바닥(㎡)		㎡	12	0		
3.도장	KCC합성수지					
	베란다 전면(㎡)	㎡	22			
	베란다 후면(㎡)	㎡	30			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	20			
	방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0		
	준공청소(보통인부)	인	2	0		
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장공사 Check List

2020년 02월 20일

품 명		규 격		단 위		수 량		검 수 현 황		비 고	
								완료		미흡	
2동 407호 수장공사											
1.도배	LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)									기존에 설치 완료	
	거실 벽면(㎡)	㎡	43		0						
	거실 천정(㎡)	㎡	17		0						
	방A 벽면(㎡)	㎡	33		0						
	방A 천정(㎡)	㎡	12		0						
	방B 벽면(㎡)	㎡	33		0						
	방B 천정(㎡)	㎡	12		0						
	방C 벽면(㎡)	㎡	33		0						
	방C 천정(㎡)	㎡	12		0						
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4		0						
	벽지뜯기	㎡	142		0						
	벽 부직포붙이기	㎡	142		0						
2.바닥재	LG청택										
	거실 바닥(㎡)	㎡	17		0						
	방A 바닥(㎡)	㎡	12		0						
	방B 바닥(㎡)	㎡	12		0						
	방C 바닥(㎡)	㎡	12		0						
3.도장	KCC합성수지										
	베란다 전면(㎡)	㎡	22								
	베란다 후면(㎡)	㎡	30								
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	20								
	방화도어 내부	㎡	2								
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1		0						
	준공청소(보통인부)	인	2		0						
확인자		사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)									
공사검수자		에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)									
검수자		L G 화 학 : 이 상 재 (인)									

수장공사 Check List

2020년 02월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황		비 고
				완료	미흡	
7동 204호 수장공사						
1.도배	LG휘앙세 광폭(1롤 16.51㎡)					
	거실 벽면(㎡)	㎡	43	0		
	거실 천정(㎡)	㎡	17	0		
	방A 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방A 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0		
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0		
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0		
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0		
	벽지뜯기	㎡	142	0		
	벽 부직포붙이기	㎡	142	0		
2.바닥재	LG청택					
	거실 바닥(㎡)	㎡	17	0		
	방A 바닥(㎡)	㎡	12	0		
	방B 바닥(㎡)	㎡	12	0		
	방C 바닥(㎡)	㎡	12	0		
3.도장	KCC합성수지					
	베란다 전면(㎡)	㎡	22			
	베란다 후면(㎡)	㎡	30			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	20			
	방화도어 내부	㎡	2			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0		
	준공청소(보통인부)	인	2	0		
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)					
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)					
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)					

수장 공사 Check List

2020년 02월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
5동 506호 수장공사							
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)						2130대 설치, 신발장 시리시 교체 완료
	거실 벽면(㎡)	㎡	38	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	25	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	32	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	18	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	12	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	33	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	12	0			
	주방,타일벽지(㎡)	㎡	4	0			
	벽지돋기	㎡	136	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	136	0			
2.바닥재	LG청택						
	거실 바닥(㎡)	㎡	25	0			
	방A 바닥(㎡)	㎡	12	0			
	방B 바닥(㎡)	㎡	12	0			
	방C 바닥(㎡)	㎡	18	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	22	0			
	베란다 후면(㎡)	㎡	33	0			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	25	0			
	방화도어 내부	㎡	2	0			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	2.5	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 02월 20일

품 명		규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
6동 303 수장공사									
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)							싱크대 교체, 불박이랑 교체, 건조대 교체	
	거실 벽면(㎡)		㎡	42	0				
	거실 천정(㎡)		㎡	25	0				
	방A 벽면(㎡)		㎡	33	0				
	방A 천정(㎡)		㎡	19	0				
	방B 벽면(㎡)		㎡	33	0				
	방B 천정(㎡)		㎡	13	0				
	방C 벽면(㎡)		㎡	33	0				
	방C 천정(㎡)		㎡	13	0				
	주방,타일벽지(㎡)		㎡	4	0				
	벽지뜯기		㎡	141	0				
	벽 부작포붙이기		㎡	141	0				
	2.바닥재	LG청택							
		거실 바닥(㎡)		㎡	26	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	13	0					
방B 바닥(㎡)		㎡	13	0					
방C 바닥(㎡)		㎡	18	0					
3.도장	KCC합성수지								
	베란다 전면(㎡)		㎡	32	X				
	베란다 후면(㎡)		㎡	33	0				
	내부(문,틀, 울딩,기타)		㎡	25	0				
	방화도어 내부		㎡	2					
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)		식	1	0				
	준공청소(보통인부)		인	3	0				
확인자		사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)							
공사 검수자		에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)							
검수자		L G 화 학 : 이 상 재 (인)							

수장 공사 Check List

2020년 02월 20일

2020년 02월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				원료	재시공	미흡	
신축사택 101동 401호							
1.도배	LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)						만방 벽 이면도 작업, 경계선이 방수 안함
	거실 벽면(㎡)	㎡	99	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	50				
	방A 벽면(㎡)	㎡	44	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	17				
	방B 벽면(㎡)	㎡	40	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	16				
	방C 벽면(㎡)	㎡	35	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	11				
	벽지뜯기	㎡	217	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	217	0			
	2.바닥재	LG청맥					
거실 바닥(㎡)		㎡	50	0			
방A 바닥(㎡)		㎡	17	0			
방B 바닥(㎡)		㎡	16	0			
방C 바닥(㎡)		㎡	11	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	25				
	베란다 후면(㎡)	㎡	27				
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 중 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 02월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
신축사택 102동 205호							
1.도배	LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)						경계선이 방수 안됨
	거실 벽면(㎡)	㎡	99	0			
	거실 천정(㎡)	㎡	50	0			
	방A 벽면(㎡)	㎡	44	0			
	방A 천정(㎡)	㎡	17	0			
	방B 벽면(㎡)	㎡	40	0			
	방B 천정(㎡)	㎡	16	0			
	방C 벽면(㎡)	㎡	35	0			
	방C 천정(㎡)	㎡	11	0			
	벽지틀기	㎡	217	0			
	벽 부직포붙이기	㎡	217	0			
2.바닥재	LG청택						
	거실 바닥(㎡)	㎡	50	0			
	방A 바닥(㎡)	㎡	17	0			
	방B 바닥(㎡)	㎡	16	0			
	방C 바닥(㎡)	㎡	11	0			
3.도장	KCC합성수지						
	베란다 전면(㎡)	㎡	25				
	베란다 후면(㎡)	㎡	27	0			
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0			
	준공청소(보통인부)	인	3	0			
확인자	사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

수장 공사 Check List

2020년 02월 20일

품 명		규 격		단위	수 량	검 수 현 황			요 청 사 항		
						완료	재시공	미흡			
신축사택 102동 506호											
1.도배	LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)								각레벨이 방문 인공		
	거실 벽면(㎡)	㎡	99	0							
	거실 천정(㎡)	㎡	50	0							
	방A 벽면(㎡)	㎡	44	0							
	방A 천정(㎡)	㎡	17	0							
	방B 벽면(㎡)	㎡	40	0							
	방B 천정(㎡)	㎡	16	0							
	방C 벽면(㎡)	㎡	35	0							
	방C 천정(㎡)	㎡	11	0							
	벽지돋기	㎡	217	0							
	벽 부직포붙이기	㎡	217	0							
	2.바닥재	LG청택			0						
거실 바닥(㎡)		㎡	50	0							
방A 바닥(㎡)		㎡	17	0							
방B 바닥(㎡)		㎡	16	0							
방C 바닥(㎡)		㎡	11	0							
3.도장		KCC합성수지									
	베란다 전면(㎡)	㎡	25	.							
	베란다 후면(㎡)	㎡	27	0							
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1	0							
	준공청소(보통인부)	인	3	0							
확인자		사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)									
공사 검수자		에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)									
검수자		L G 화 학 : 이 상 재 (인)									

수장 공사 Check List

2020년 02월 20일

품 명		규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항			
					완료	재시공	미흡				
신축사택 104동 203호											
1.도배	LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)							기레방이 부수, 문바닥 인장			
	거실 벽면(㎡)	㎡	99								
	거실 천정(㎡)	㎡	50								
	방A 벽면(㎡)	㎡	44								
	방A 천정(㎡)	㎡	17								
	방B 벽면(㎡)	㎡	40								
	방B 천정(㎡)	㎡	16								
	방C 벽면(㎡)	㎡	35								
	방C 천정(㎡)	㎡	11								
	벽지돌기	㎡	217								
	벽 부직포붙이기	㎡	217								
	2.바닥재	LG청맥									
거실 바닥(㎡)		㎡	50								
방A 바닥(㎡)		㎡	17	0							
방B 바닥(㎡)		㎡	16								
방C 바닥(㎡)		㎡	11	0							
3.도장	KCC합성수지										
	베란다 전면(㎡)	㎡	25								
	베란다 후면(㎡)	㎡	27								
4.청소 및 폐기물	폐기물(작업부산물)	식	1								
	준공청소(보통인부)	인	3								
확인자		사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)									
공사 검수자		에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 중 근 (인)									
검수자		L G 화 학 : 이 상 재 (인)									

창호 교체공사 Check List

2020년 02월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
8-110	거실창호			0			
	주방창호			0			
	방1			0			
	방2			0			
	방3			0			
5-101	거실창호			0			
	주방창호			0			
	방1			0			
	방2			0			
	방3			0			
5-503	거실창호			0			
	주방창호			0			
	방1			0			
	방2			0			
	방3			0			
6-103	거실창호			0			
	주방창호			0			
	방1			0			
	방2			0			
	방3			0			
8-303	거실창호			0			
	주방창호			0			
	방1			0			
	방2			0			
	방3			0			
확인자	사택 관리 소장 : 남해원 (인)						
공사 검수자	에스앤아이 코퍼레이션 : 이종근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이상재 (인)						

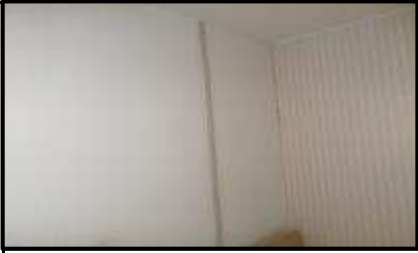

창호 교체공사 Check List

2020년 02월 20일

2020년 02월 20일

품 명	규 격	단위	수 량	검 수 현 황			요청 사항
				완료	재시공	미흡	
5-506	거실창호			0			
	주방창호			0			
	방1			0			
	방2			0			
	방3			0			
6-303	거실창호			0			
	주방창호			0			
	방1			0			
	방2			0			
	방3			0			
8-203	거실창호			0			
	주방창호			0			
	방1			0			
	방2			0			
	방3			0			
9-506	거실창호			0			
	주방창호			0			
	방1			0			
	방2			0			
	방3			0			
	거실창호						
	주방창호						
	방1						
	방2						
	방3						
확인자	사 택 관 리 소 장 : 남 해 원 (인)						
공사 검수자	에스앤아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인)						
검수자	L G 화 학 : 이 상 재 (인)						

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.29 - 2020.01.29
공 사 명	기숙사 3동 207호 도배보수외 1건	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.01.21- 2020.01.30
공 사 명	기숙사 3 동 313호 소음개선작업		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	소음개선(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				

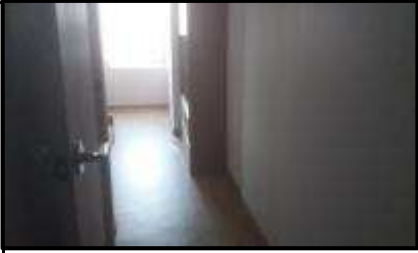


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.22 - 2020.01.30
공 사 명	기숙사 3동 410호 소음개선작업	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진			
내 용	소음개선(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.01.23 - 2020.01.30
공 사 명	기숙사 3동 510호 소음개선작업		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	소음개선(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				

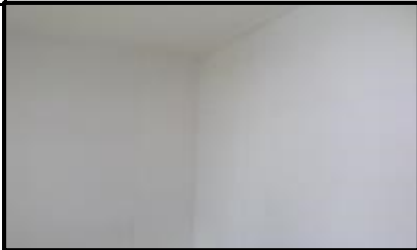
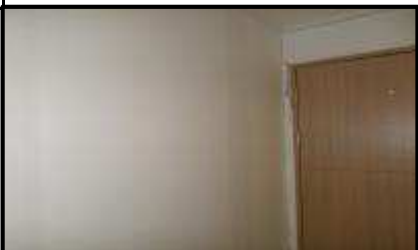


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.28 - 2020.01.30
공 사 명	기숙사 3동 516호 소음개선작업	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진			
내 용	소음개선(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.28- 2020.01.29
공 사 명	기숙사 A동 202-3호 도배보수외 7건	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	교체(작업전)	교체(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)		
작업사진			
Confidential	보수(작업후)		



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.01.23- 2020.01.29
공 사 명	기숙사 B동 203-1호 도배보수외 6건		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		교체(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		교체(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.01.20 - 2020.02.13
공 사 명	기숙사 B동 지하주차장 천장 누수보수		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.03- 2020.02.13
공 사 명	사택 1-305 수장공사	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.2.03 - 2020.02.13
공 사 명	사택 1-405 수장공사	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.02.04 - 2020.02.13
공 사 명	사택 2-407 수장공사		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.05- 2020.02.13
공 사 명	사택 101-401 수장공사	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.02.07 - 2020.02.18
공 사 명	사택 102-205 수장공사		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.07 - 2020.02.17
공 사 명	사택 102-506 수장공사	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.14 - 2020.02.17
공 사 명	사택 104-203 수장공사	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	장판(작업전)		
작업사진			
내 용	장판(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



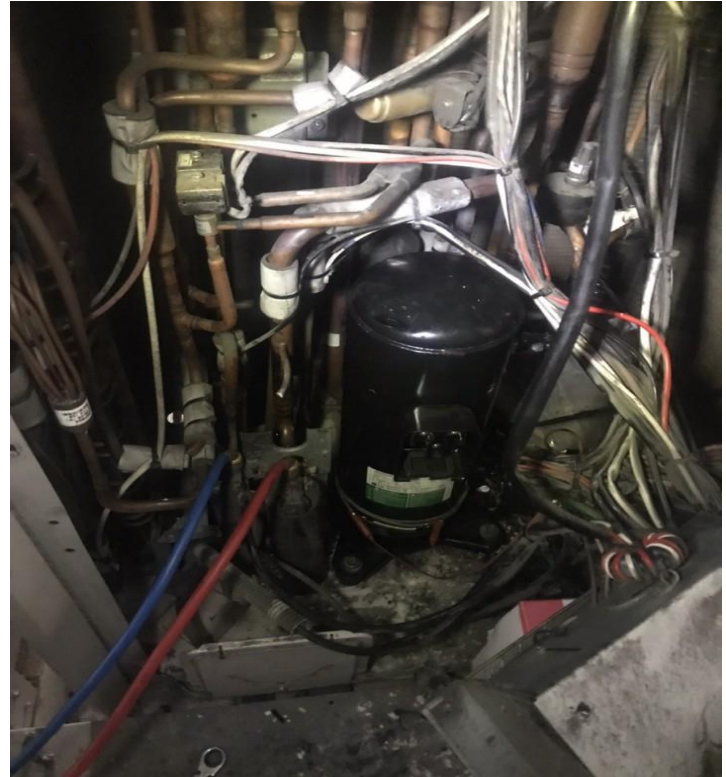
LG화학 사택 실외기 COMP 작업

**현 장 : LG화학 기술연구원
 사택**

Hi-M.Solutek



콤프교체 작업 전 사진



콤프교체 작업 후 사진



코일 교체 작업



바디 교체작업



실외기 진공 작업



실외기 COMP 대처



LG

Life's Good

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.01.31 - 2020.02.11
공 사 명	사택 5-506 내부창호교체		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.01.31 - 2020.02.07
공 사 명	사택 6-303 내부창호교체		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.31 - 2020.02.05
공 사 명	사택 8-203 내부창호교체	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.03 - 2020.02.12
공 사 명	사택 9-506 내부창호교체	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.02.03 - 2020.02.10
공 사 명	사택 8-110 내부창호교체		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.01.30 - 2020.01.30
공 사 명	사택 101-401 베란다 누수보수		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.04 - 2020.02.07
공 사 명	사택 102-205 베란다 누수보수	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업중)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.02.05- 2020.02.07
공 사 명	사택 102-506 베란다 누수보수		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.02.06 - 2020.02.07
공 사 명	사택 104-203 베란다 누수보수		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.11 - 2020.02.12
공 사 명	사택 102-202 단열작업	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업전)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.29- 2020.02.06
공 사 명	사택 6-303 불박이장 교체	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.29 - 2020.02.06
공 사 명	사택 6-303 싱크대 교체	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
Confidential			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.02.14 - 2020.02.21
공 사 명	사택 5-506 수장공사		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		건조대(작업전)	우수관(작업전)
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		건조대(작업후)	우수관(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.10- 2020.02.18
공 사 명	사택 6-303 수장공사	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	건조대(작업전)		
작업사진			
내 용	건조대(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.07- 2020.02.17
공 사 명	사택 5-101 내부창호교체	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			

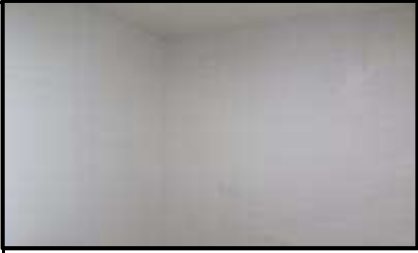


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.07 - 2020.02.18
공 사 명	사택 5-503 내부창호교체	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.13 - 2020.02.13
공 사 명	기숙사 3동 220호 도배보수	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.10 - 2020.02.13
공 사 명	기숙사 3동 333 호 소음개선작업	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진			
내 용	소음개선(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.02.07 - 2020.02.13
공 사 명	기숙사 3동 413호 소음개선작업		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	소음개선(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2020.02.13 - 2020.02.13
공 사 명	기숙사 A동 304-6호 도배보수외 5세대		제출일자	2020.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.12 - 2020.02.12
공 사 명	사택 2-308 단열작업	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.14 - 2020.02.21
공 사 명	사택 7-204 수장공사	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.07 - 2020.02.14
공 사 명	사택 6-103 내부창호교체	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	교체(작업전)
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			

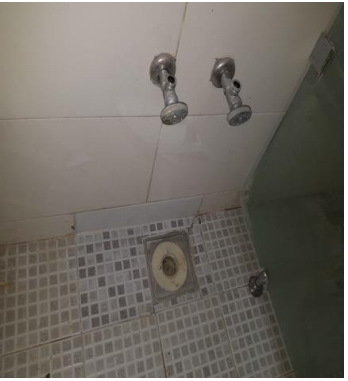


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.07 - 2020.02.19
공 사 명	사택 8-303 내부창호교체	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



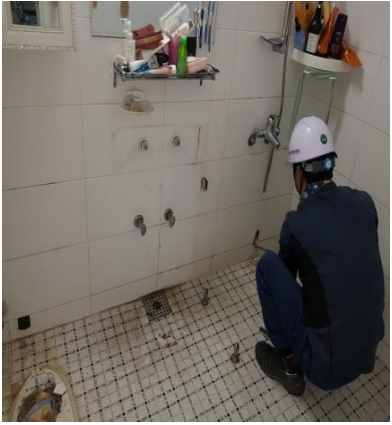
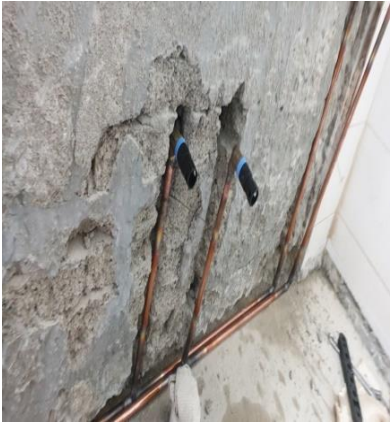
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 수안이엔지	공사일자	2020.02.10-2020.02.21
공 사 명	사택 8-109외 5세대 누수점검 및 보수	제출일자	2020.02.21
작업사진			
내 용	사택 6-103호 점검	사택 6-103호 압테스트	이상 무
작업사진			
내 용	사택 9-506호	사택 9-506호 압테스트	이상 무
작업사진			
내 용	사택 8-109호 누수탐지	세면대 아래 누수부위 발견	공사 진행 중

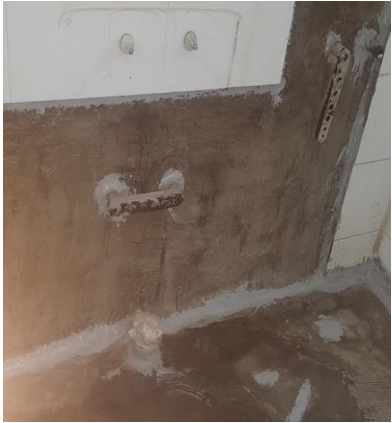
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 수안이엔지		공사일자	2020.02.10-2020.02.21
공 사 명	사택 8-109외 5세대 누수점검 및 보수		제출일자	2020.02.21
작업사진				
내 용	공사 진행 중		공사 완료	
작업사진				
내 용	사택 5-106호		거실 매립배관 누수 확인	
작업사진				
내 용	사택 8-301호		화장실 매립배관 교체예정	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 수안이엔지	공사일자	2020.02.10-2020.02.21
공 사 명	사택 8-301 화장실 누수 매립배관 교체	제출일자	2020.02.21
작업사진			
내 용	보양제 작업	도기 분리	도기 분리
작업사진			
내 용	도기 분리 및 타일 철거	배관 철거	배관 철거
작업사진			
내 용	배관 철거	신설 배관 제작	신설 배관 제작 및 설치

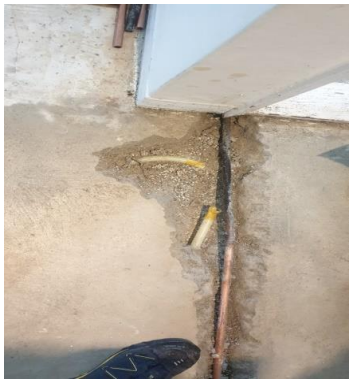
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 수안이엔지		공사일자	2020.02.10-2020.02.21
공 사 명	사택 8-301 화장실 누수 매립배관 교체		제출일자	2020.02.21
작업사진				
내 용	배관 설치 및 보온작업		배관 설치 및 보온작업	1차 방수 작업
작업사진				
내 용	1차 방수 작업		1차 방수 작업	1차 방수 작업
작업사진				
내 용	2차 방수작업		2차 방수작업	2차 방수작업

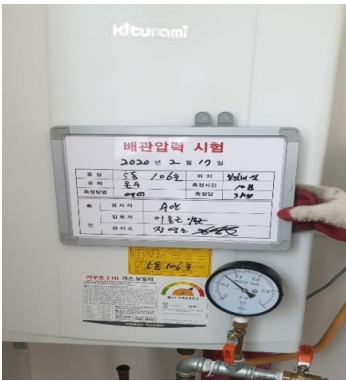
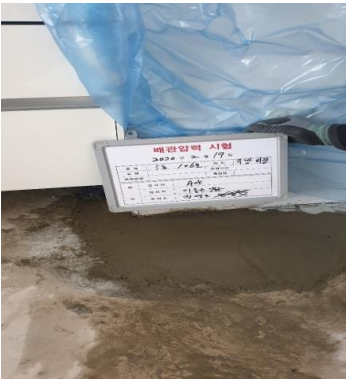
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 수안이엔지	공사일자	2020.02.10-2020.02.21
공 사 명	사택 8-301 화장실 누수 매립배관 교체	제출일자	2020.02.21
작업사진			
내 용	타일 작업	타일 작업	타일 작업
작업사진			
내 용	타일 작업	타일 작업	도기 설치
작업사진			
내 용	도기 설치 완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 수안이엔지		공사일자	2020.02.14-2020.02.21
공 사 명	사택 5-106 거실 누수 매립배관 교체		제출일자	2020.02.21
작업사진				
내 용	누수 범위 발견 및 조치		조치 완료	
작업사진				
내 용	누수 범위 발견		공사 진행 중	
작업사진				
내 용	공사 진행 중		공사 완료	
			공사 진행 중	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 수안이엔지	공사일자	2020.02.14-2020.02.21
공 사 명	사택 5-106 거실 누수 매립배관 교체	제출일자	2020.02.21
작업사진			
내 용	공사완료	조치 후 압테스트 이상 무	조치 후 압테스트 이상무
작업사진			
내 용	공사 부위시멘트 몰탈 작업 완료	공사 부위시멘트 몰탈 작업 완료	공사 부위시멘트 몰탈 작업 완료
작업사진			
내 용	공사 부위시멘트 몰탈 작업 완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.01.28 - 2020.01.28
공 사 명	임차사택 수장공사 이건호(석유화학)	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	청소(작업전)		
작업사진			
내 용	청소(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2020.02.06- 2020.02.06
공 사 명	임차사택 수장공사 손병대(소형전지)	제출일자	2020.02.20
작업사진			
내 용	청소(작업전)		
작업사진			
내 용	청소(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			

