

10월 마감 작업 진행 현황 집계표

| NO. | 매입 마감<br>(월-일) | 제 목                          | 특이사항                                                                              | 입찰 종류 | 공사 완료일     | A) PR금액    | B) PO금액<br>(낙찰*7.5%) | 업체             | A/B<br>(요일) |
|-----|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------------------|----------------|-------------|
|     | 10월            |                              |                                                                                   |       |            | 79,596,000 | 77,322,600           | ==>일성-일반(29 건) | -3%         |
|     |                |                              |                                                                                   |       |            | 4,382,000  | 4,245,175            | ==>수안(4 건)     | -3%         |
|     |                |                              |                                                                                   |       |            | 4,634,000  | 4,555,850            | ==>대양(1 건)     | -2%         |
|     |                |                              |                                                                                   |       |            | 88,612,000 | 86,123,625           | 10월 마감건(34 건)  | -3%         |
| 1   | 10월31일         | 사택 102-403 세대내 문보수           | 9월마감->10월마감으로 변경                                                                  | 표준단가  | 2020-10-15 | 382,000    | 367,650              | 일성건축           | -4%         |
| 2   | 09월30일         | 사택 9-201 수장공사                | 9월마감->10월마감으로 변경                                                                  | 표준단가  | 2020-09-28 | 2,774,000  | 2,693,950            | 일성건축           | -3%         |
| 3   | 09월30일         | 사택 6-103 화장실 건축 누수보수         |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-13 | 3,199,000  | 3,097,075            | 일성건축           | -3%         |
| 4   | 09월30일         | 사택 6-103 누수 부위 훼손 도배 및 장판 보수 |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-20 | 2,452,000  | 2,376,825            | 일성건축           | -3%         |
| 5   | 09월30일         | 사택 6-103 화장실 매립배관 교체         |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-12 | 1,128,000  | 1,088,975            | 수안             | -4%         |
| 6   | 09월30일         | 사택 6-202 화장실 건축 누수보수         |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-12 | 3,388,000  | 3,279,825            | 일성건축           | -3%         |
| 7   | 09월30일         | 사택 6-202 화장실 매립배관 교체         |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-12 | 1,128,000  | 1,088,975            | 수안             | -4%         |
| 8   | 09월30일         | 기숙사 A동 704-5호 도배보수외 3건       |                                                                                   | 표준단가  | 2020-09-21 | 2,264,000  | 2,186,550            | 일성건축           | -4%         |
| 9   | 09월30일         | 기숙사 3동 현관 누수천장 철거 및 원복작업     |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-05 | 764,000    | 735,300              | 일성건축           | -4%         |
| 10  | 09월30일         | 사택 5동 경비원 화장실 누수천장 교체        |                                                                                   | 표준단가  | 2020-09-24 | 1,068,000  | 1,042,750            | 일성건축           | -2%         |
| 11  | 09월30일         | 사택 103-102 베란다 누수보수          |                                                                                   | 표준단가  | 2020-09-16 | 1,019,000  | 983,625              | 일성건축           | -4%         |
| 12  | 09월30일         | 기숙사 3동 504호 소음개선작업(벽 천체도배)   |                                                                                   | 표준단가  | 2020-09-28 | 1,952,000  | 1,893,075            | 일성건축           | -3%         |
| 13  | 09월30일         | 사택 1-103 수장공사                |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-05 | 2,833,000  | 2,748,775            | 일성건축           | -3%         |
| 14  | 09월30일         | 사택 1-303 수장공사                |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-05 | 2,807,000  | 2,724,050            | 일성건축           | -3%         |
| 15  | 09월30일         | 사택 5-104 내부 창호교체(저층)         |                                                                                   | 표준단가  | 2020-09-29 | 6,377,000  | 6,238,225            | 일성건축           | -2%         |
| 16  | 09월30일         | 사택 6-203 내부 창호교체(고층)         |                                                                                   | 표준단가  | 2020-09-28 | 6,850,000  | 6,702,625            | 일성건축           | -2%         |
| 17  | 09월30일         | 사택 8-310 내부 창호교체(고층장비)       |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-08 | 7,765,000  | 7,584,125            | 일성건축           | -2%         |
| 18  | 09월30일         | 사택 5-203 수장공사(추가분)           | 8월 작업완료: 방 및 거실 벽만 도배<br>방화문만 도장/ 준공청소<br>▶ 9월 추가 작업: 방 및 거실 천장도배<br>장판작업/앞베란다 도장 | 표준단가  | 2020-09-25 | 1,948,000  | 1,894,150            | 일성건축           | -3%         |
| 19  | 09월30일         | 사택 6-203 수장공사                |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-08 | 3,041,000  | 2,951,950            | 일성건축           | -3%         |
| 20  | 09월30일         | 사택 8-310 수장공사                |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-08 | 2,381,000  | 2,308,025            | 일성건축           | -3%         |
| 21  | 09월30일         | 사택 7-101 수장공사                |                                                                                   | 표준단가  | 2020-09-17 | 1,189,000  | 1,148,100            | 일성건축           | -4%         |
| 22  | 09월30일         | 사택 1-205 수장공사                |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-16 | 2,450,000  | 2,377,900            | 일성건축           | -3%         |
| 23  | 09월30일         | 사택 1-206 수장공사                |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-16 | 2,149,000  | 2,087,650            | 일성건축           | -3%         |
| 24  | 09월30일         | 사택 1-304 수장공사                |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-13 | 1,189,000  | 1,148,100            | 일성건축           | -4%         |
| 25  | 09월30일         | 사택 6-202 썬크대 하부 난방분배기 누수보수   |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-12 | 726,000    | 703,050              | 수안             | -3%         |
| 26  | 09월30일         | 사택 104-501 베란다 누수보수          |                                                                                   | 표준단가  | 2020-09-28 | 1,019,000  | 983,625              | 일성건축           | -4%         |
| 27  | 09월30일         | 사택 104-501 수장공사              |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-13 | 4,471,000  | 4,336,550            | 일성건축           | -3%         |
| 28  | 09월30일         | 사택 5-502 지붕 배수로 기와보수         |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-13 | 2,873,000  | 2,753,075            | 일성건축           | -4%         |
| 29  | 09월30일         | 사택 8-508 지붕 배수로 기와보수         |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-15 | 2,978,000  | 2,854,125            | 일성건축           | -4%         |
| 30  | 09월30일         | 사택 지붕 보수용 기와 구입 및 도장작업       |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-08 | 1,273,000  | 1,236,250            | 일성건축           | -3%         |
| 31  | 09월30일         | 사택 5-305 외부창호 누수보수           |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-07 | 364,000    | 350,450              | 일성건축           | -4%         |
| 32  | 09월30일         | 사택 5-105 내부 창호교체(저층)         |                                                                                   | 표준단가  | 2020-10-19 | 6,377,000  | 6,238,225            | 일성건축           | -2%         |
| 33  | 09월30일         | 사택 102동 전기실 에어컨 드레인배관        | 11월->10월 마감검토                                                                     | 표준단가  | 2020-10-09 | 1,400,000  | 1,364,175            | 수안             | -3%         |
| 34  | 09월30일         | 사택 무정전 전원공급 장치 설치            | 11월->10월 마감검토                                                                     | 표준단가  | 2020-10-14 | 4,634,000  | 4,555,850            | 대양이앤씨          | -2%         |
| 35  | 09월30일         | (계약파기)사택 103-202 단열작업        | 계약파기(입주민의 작업취소);<br>(매입2,516,000)(PO2,704,700)<br>(PR2,803,000)                   | 표준단가  | 계약파기       | -          | -                    | -              | -           |

# 수장 공사 Check List

2020년 10월 20일

| 품 명         | 구 격                      | 단위   | 수 량 | 검 수 현 황 |     |    | 요청 사항                    |
|-------------|--------------------------|------|-----|---------|-----|----|--------------------------|
|             |                          |      |     | 완료      | 재시공 | 미흡 |                          |
| 8동 310 수장공사 |                          |      |     |         |     |    |                          |
| 1.도배        | LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)      |      |     |         |     |    | · 거실 벽지<br>· 방A 방B 방C 천정 |
|             | 거실 벽면(㎡)                 | ㎡    | 42  | 0       |     |    |                          |
|             | 거실 천정(㎡)                 | ㎡    | 25  | 0       |     |    |                          |
|             | 방A 벽면(㎡)                 | ㎡    | 33  | 0       |     |    |                          |
|             | 방A 천정(㎡)                 | ㎡    | 19  | 0       |     |    |                          |
|             | 방B 벽면(㎡)                 | ㎡    | 33  | 0       |     |    |                          |
|             | 방B 천정(㎡)                 | ㎡    | 13  | 0       |     |    |                          |
|             | 방C 벽면(㎡)                 | ㎡    | 33  | 0       |     |    |                          |
|             | 방C 천정(㎡)                 | ㎡    | 13  | 0       |     |    |                          |
|             | 주방,타일벽지(㎡)               | ㎡    | 4   | 0       |     |    |                          |
|             | 벽지붙이기                    | ㎡    | 141 | 0       |     |    |                          |
|             | 벽 부직포붙이기                 | ㎡    | 141 | 0       |     |    |                          |
|             | 2.바닥재                    | LG청택 |     |         |     |    |                          |
| 거실 바닥(㎡)    |                          | ㎡    | 26  | 0       |     |    |                          |
| 방A 바닥(㎡)    |                          | ㎡    | 13  | 0       |     |    |                          |
| 방B 바닥(㎡)    |                          | ㎡    | 13  |         |     |    |                          |
| 방C 바닥(㎡)    |                          | ㎡    | 18  |         |     |    |                          |
| 3.도장        | KCC합성수지                  |      |     |         |     |    |                          |
|             | 베란다 전면(㎡)                | ㎡    | 32  | 0       |     |    |                          |
|             | 베란다 후면(㎡)                | ㎡    | 33  |         |     |    |                          |
|             | 내부(문,틀, 올딩,기타)           | ㎡    | 25  | 0       |     |    |                          |
|             | 방화도어 내부                  | ㎡    | 2   |         |     |    |                          |
| 4.청소 및 폐기물  | 폐기물(작업부산물)               | 식    | 1   | 0       |     |    |                          |
|             | 준공청소(보통인부)               | 인    | 3   | 0       |     |    |                          |
| 확인자         | 사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)     |      |     |         |     |    |                          |
| 공사 검수자      | 에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인) |      |     |         |     |    |                          |
| 검수자         | L G 화 학 : 이 상 재 (인)      |      |     |         |     |    |                          |

## 수장 공사 Check List

2020년 10월 20일

| 품 명         | 규 격                      | 단위   | 수 량 | 검 수 현 황 |     |    | 요청 사항               |
|-------------|--------------------------|------|-----|---------|-----|----|---------------------|
|             |                          |      |     | 완료      | 재시공 | 미흡 |                     |
| 6동 203 수장공사 |                          |      |     |         |     |    |                     |
| 1.도배        | LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)      |      |     |         |     |    | • 베란다 외벽 방수공사 2개 건물 |
|             | 거실 벽면(㎡)                 | ㎡    | 42  | 0       |     |    |                     |
|             | 거실 천정(㎡)                 | ㎡    | 25  |         |     |    |                     |
|             | 방A 벽면(㎡)                 | ㎡    | 33  | 0       |     |    |                     |
|             | 방A 천정(㎡)                 | ㎡    | 19  |         |     |    |                     |
|             | 방B 벽면(㎡)                 | ㎡    | 33  | 0       |     |    |                     |
|             | 방B 천정(㎡)                 | ㎡    | 13  |         |     |    |                     |
|             | 방C 벽면(㎡)                 | ㎡    | 33  | 0       |     |    |                     |
|             | 방C 천정(㎡)                 | ㎡    | 13  |         |     |    |                     |
|             | 주방,타일벽지(㎡)               | ㎡    | 4   | 0       |     |    |                     |
|             | 벽지돌기                     | ㎡    | 141 | 0       |     |    |                     |
|             | 벽 부작포붙이기                 | ㎡    | 141 | 0       |     |    |                     |
|             | 2.바닥재                    | LG청택 |     |         |     |    |                     |
| 거실 바닥(㎡)    |                          | ㎡    | 26  | 0       |     |    |                     |
| 방A 바닥(㎡)    |                          | ㎡    | 13  | 0       |     |    |                     |
| 방B 바닥(㎡)    |                          | ㎡    | 13  | 0       |     |    |                     |
| 방C 바닥(㎡)    |                          | ㎡    | 18  | 0       |     |    |                     |
| 3.도장        | KCC합성수지                  |      |     |         |     |    |                     |
|             | 베란다 전면(㎡)                | ㎡    | 32  | 0       |     |    |                     |
|             | 베란다 후면(㎡)                | ㎡    | 33  | 0       |     |    |                     |
|             | 내부(문,틀, 몰딩,기타)           | ㎡    | 25  | 0       |     |    |                     |
|             | 방화도어 내부                  | ㎡    | 2   |         |     |    |                     |
| 4.청소 및 폐기물  | 폐기물(작업부산물)               | 식    | 1   | 0       |     |    |                     |
|             | 준공청소(보통인부)               | 인    | 3   | 0       |     |    |                     |
| 확인자         | 사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)     |      |     |         |     |    |                     |
| 공사 검수자      | 에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인) |      |     |         |     |    |                     |
| 검수자         | L G 화 학 : 이 상 재 (인)      |      |     |         |     |    |                     |




# 수장 공사 Check List

2020년 10월 20일

| 품 명               | 규 격                      | 단위   | 수 량 | 검 수 현 황 |     |    | 요청 사항 |
|-------------------|--------------------------|------|-----|---------|-----|----|-------|
|                   |                          |      |     | 완료      | 재시공 | 미흡 |       |
| 5동 203호 수장공사(추가분) |                          |      |     |         |     |    |       |
| 1.도배              | LG휘앙세 광폭(1롤 16.51㎡)      |      |     |         |     |    |       |
|                   | 거실 벽면(㎡)                 | ㎡    | 38  |         |     |    |       |
|                   | 거실 천정(㎡)                 | ㎡    | 25  | 0       |     |    |       |
|                   | 방A 벽면(㎡)                 | ㎡    | 32  | 0       |     |    |       |
|                   | 방A 천정(㎡)                 | ㎡    | 18  | 0       |     |    |       |
|                   | 방B 벽면(㎡)                 | ㎡    | 33  |         |     |    |       |
|                   | 방B 천정(㎡)                 | ㎡    | 12  |         |     |    |       |
|                   | 방C 벽면(㎡)                 | ㎡    | 33  | 0       |     |    |       |
|                   | 방C 천정(㎡)                 | ㎡    | 12  | 0       |     |    |       |
|                   | 주방,타일벽지(㎡)               | ㎡    | 4   |         |     |    |       |
|                   | 벽지돌기                     | ㎡    | 136 | 0       |     |    |       |
|                   | 벽 부직포붙이기                 | ㎡    | 136 | 0       |     |    |       |
|                   | 2.바닥재                    | LG청택 |     |         |     |    |       |
| 거실 바닥(㎡)          |                          | ㎡    | 25  | 0       |     |    |       |
| 방A 바닥(㎡)          |                          | ㎡    | 12  | 0       |     |    |       |
| 방B 바닥(㎡)          |                          | ㎡    | 12  | 0       |     |    |       |
| 방C 바닥(㎡)          |                          | ㎡    | 18  | 0       |     |    |       |
| 3.도장              | KCC합성수지                  |      |     |         |     |    |       |
|                   | 베란다 전면(㎡)                | ㎡    | 22  |         |     |    |       |
|                   | 베란다 후면(㎡)                | ㎡    | 33  |         |     |    |       |
|                   | 내부(문,틀, 울딩,기타)           | ㎡    | 25  | 0       |     |    |       |
|                   | 방화도어 내부                  | ㎡    | 2   |         |     |    |       |
| 4.청소 및 폐기물        | 폐기물(작업부산물)               | 식    | 1   | 0       |     |    |       |
|                   | 준공청소(보통인부)               | 인    | 2.5 | 0       |     |    |       |
| 확인자               | 사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)     |      |     |         |     |    |       |
| 공사검수자             | 에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인) |      |     |         |     |    |       |
| 검수자               | L G 화 학 : 이 상 재 (인)      |      |     |         |     |    |       |

## 수장 공사 Check List

2020년 10월 20일

| 품 명            | 규 격                                                                                                            | 단위   | 수 량 | 검 수 현 황 |     |    | 요청 사항                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----|----|--------------------------------|
|                |                                                                                                                |      |     | 완료      | 재시공 | 미흡 |                                |
| 신축사택 104동 501호 |                                                                                                                |      |     |         |     |    |                                |
| 1.도배           | LG휘양세 광폭(1롤 16.51㎡)                                                                                            |      |     |         |     |    | • 앞뒤 비닐라 벗겨야함<br>• 비닐 끈질려 벗겨야함 |
|                | 거실 벽면(㎡)                                                                                                       | ㎡    | 99  | 0       |     |    |                                |
|                | 거실 천정(㎡)                                                                                                       | ㎡    | 50  | 0       |     |    |                                |
|                | 방A 벽면(㎡)                                                                                                       | ㎡    | 44  | 0       |     |    |                                |
|                | 방A 천정(㎡)                                                                                                       | ㎡    | 17  | 0       |     |    |                                |
|                | 방B 벽면(㎡)                                                                                                       | ㎡    | 40  | 0       |     |    |                                |
|                | 방B 천정(㎡)                                                                                                       | ㎡    | 16  | 0       |     |    |                                |
|                | 방C 벽면(㎡)                                                                                                       | ㎡    | 35  | 0       |     |    |                                |
|                | 방C 천정(㎡)                                                                                                       | ㎡    | 11  | 0       |     |    |                                |
|                | 벽지돌기                                                                                                           | ㎡    | 217 | 0       |     |    |                                |
|                | 벽 부직포붙이기                                                                                                       | ㎡    | 217 | 0       |     |    |                                |
|                | 2.바닥재                                                                                                          | LG청택 |     |         |     |    |                                |
| 거실 바닥(㎡)       |                                                                                                                | ㎡    | 50  | 0       |     |    |                                |
| 방A 바닥(㎡)       |                                                                                                                | ㎡    | 17  | 0       |     |    |                                |
| 방B 바닥(㎡)       |                                                                                                                | ㎡    | 16  | 0       |     |    |                                |
| 방C 바닥(㎡)       |                                                                                                                | ㎡    | 11  | 0       |     |    |                                |
| 3.도장           | KCC합성수지                                                                                                        |      |     |         |     |    |                                |
|                | 베란다 전면(㎡)                                                                                                      | ㎡    | 25  | 0       |     |    |                                |
|                | 베란다 후면(㎡)                                                                                                      | ㎡    | 27  | 0       |     |    |                                |
| 4.청소 및 폐기물     | 폐기물(작업부산물)                                                                                                     | 식    | 1   | 0       |     |    |                                |
|                | 준공청소(보통인부)                                                                                                     | 인    | 3   | 0       |     |    |                                |
| 확인자            | 사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)      |      |     |         |     |    |                                |
| 공사 검수자         | 에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 중 근 (인)  |      |     |         |     |    |                                |
| 검수자            | L G 화 학 : 이 상 재 (인)                                                                                            |      |     |         |     |    |                                |



# 수장공사 Check List

2020년 10월 20일

| 품 명          |  | 규 격                      | 단위 | 수 량 | 검 수 현 황 |    | 비 고 |
|--------------|--|--------------------------|----|-----|---------|----|-----|
|              |  |                          |    |     | 완료      | 미흡 |     |
| 1동 304호 수장공사 |  |                          |    |     |         |    |     |
| 1.도배         |  | LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)      |    |     |         |    |     |
|              |  | 거실 벽면(㎡)                 | ㎡  | 43  | 0       |    |     |
|              |  | 거실 천정(㎡)                 | ㎡  | 17  |         |    |     |
|              |  | 방A 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33  | 0       |    |     |
|              |  | 방A 천정(㎡)                 | ㎡  | 12  |         |    |     |
|              |  | 방B 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33  | 0       |    |     |
|              |  | 방B 천정(㎡)                 | ㎡  | 12  |         |    |     |
|              |  | 방C 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33  | 0       |    |     |
|              |  | 방C 천정(㎡)                 | ㎡  | 12  |         |    |     |
|              |  | 주방,타일벽지(㎡)               | ㎡  | 4   | 0       |    |     |
|              |  | 벽지뜯기                     | ㎡  | 142 | 0       |    |     |
|              |  | 벽 부직포붙이기                 | ㎡  | 142 | 0       |    |     |
| 2.바닥재        |  | LG청택                     |    |     |         |    |     |
|              |  | 거실 바닥(㎡)                 | ㎡  | 17  |         |    |     |
|              |  | 방A 바닥(㎡)                 | ㎡  | 12  |         |    |     |
|              |  | 방B 바닥(㎡)                 | ㎡  | 12  |         |    |     |
|              |  | 방C 바닥(㎡)                 | ㎡  | 12  |         |    |     |
| 3.도장         |  | KCC합성수지                  |    |     |         |    |     |
|              |  | 베란다 전면(㎡)                | ㎡  | 22  |         |    |     |
|              |  | 베란다 후면(㎡)                | ㎡  | 30  |         |    |     |
|              |  | 내부(문,틀, 울딩,기타)           | ㎡  | 20  |         |    |     |
|              |  | 방화도어 내부                  | ㎡  | 2   |         |    |     |
| 4.청소 및 폐기물   |  | 폐기물(작업부산물)               | 식  | 1   |         |    |     |
|              |  | 준공청소(보통인부)               | 인  | 2   |         |    |     |
| 확인자          |  | 사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)     |    |     |         |    |     |
| 공사검수자        |  | 에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인) |    |     |         |    |     |
| 검수자          |  | L G 화 학 : 이 상 재 (인)      |    |     |         |    |     |

# 수장공사 Check List

2020년 10월 20일

| 품 명          |   | 규 격                      | 단위 | 수 량  | 검 수 현 황 |    | 비 고 |
|--------------|---|--------------------------|----|------|---------|----|-----|
|              |   |                          |    |      | 완료      | 미흡 |     |
| 1동 206호 수장공사 |   |                          |    |      |         |    |     |
| 1.도배         |   | LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)      |    |      |         |    |     |
|              |   | 거실 벽면(㎡)                 | ㎡  | 43   | 0       |    |     |
|              |   | 거실 천정(㎡)                 | ㎡  | 17   |         |    |     |
|              |   | 방A 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33   | 0       |    |     |
|              |   | 방A 천정(㎡)                 | ㎡  | 12   |         |    |     |
|              |   | 방B 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33   | 0       |    |     |
|              |   | 방B 천정(㎡)                 | ㎡  | 12   |         |    |     |
|              |   | 방C 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33   | 0       |    |     |
|              |   | 방C 천정(㎡)                 | ㎡  | 12   |         |    |     |
|              |   | 주방,타일벽지(㎡)               | ㎡  | 4    | 0       |    |     |
|              |   | 벽지돋기                     | ㎡  | 142  | 0       |    |     |
|              |   | 벽 부직포붙이기                 | ㎡  | 142  | 0       |    |     |
|              |   | 2.바닥재                    |    | LG청택 |         |    |     |
| 거실 바닥(㎡)     | ㎡ |                          |    | 17   | 0       |    |     |
| 방A 바닥(㎡)     | ㎡ |                          |    | 12   | 0       |    |     |
| 방B 바닥(㎡)     | ㎡ |                          |    | 12   | 0       |    |     |
| 방C 바닥(㎡)     | ㎡ |                          |    | 12   | 0       |    |     |
| 3.도장         |   | KCC합성수지                  |    |      |         |    |     |
|              |   | 베란다 전면(㎡)                | ㎡  | 22   |         |    |     |
|              |   | 베란다 후면(㎡)                | ㎡  | 30   | 0       |    |     |
|              |   | 내부(문,틀, 올딩,기타)           | ㎡  | 20   |         |    |     |
|              |   | 방화도어 내부                  | ㎡  | 2    |         |    |     |
| 4.청소 및 폐기물   |   | 폐기물(작업부산물)               | 식  | 1    | 0       |    |     |
|              |   | 준공청소(보통인부)               | 인  | 2    | 0       |    |     |
| 확인자          |   | 사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)     |    |      |         |    |     |
| 공사검수자        |   | 에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인) |    |      |         |    |     |
| 검수자          |   | L G 화 학 : 이 상 재 (인)      |    |      |         |    |     |



# 수장공사 Check List

2020년 10월 20일

| 품 명          |  | 규 격                      | 단위 | 수 량 | 검 수 현 황 |    | 비 고              |
|--------------|--|--------------------------|----|-----|---------|----|------------------|
|              |  |                          |    |     | 완료      | 미흡 |                  |
| 1동 205호 수장공사 |  |                          |    |     |         |    |                  |
| 1.도배         |  | LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)      |    |     |         |    | * 뒷베란다 방충망 교체 완료 |
|              |  | 거실 벽면(㎡)                 | ㎡  | 43  | 0       |    |                  |
|              |  | 거실 천정(㎡)                 | ㎡  | 17  | 0       |    |                  |
|              |  | 방A 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33  | 0       |    |                  |
|              |  | 방A 천정(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |                  |
|              |  | 방B 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33  | 0       |    |                  |
|              |  | 방B 천정(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |                  |
|              |  | 방C 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33  | 0       |    |                  |
|              |  | 방C 천정(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |                  |
|              |  | 주방,타일벽지(㎡)               | ㎡  | 4   | 0       |    |                  |
|              |  | 벽지붙이기                    | ㎡  | 142 | 0       |    |                  |
|              |  | 벽 부직포붙이기                 | ㎡  | 142 | 0       |    |                  |
| 2.바닥재        |  | LG청택                     |    |     |         |    |                  |
|              |  | 거실 바닥(㎡)                 | ㎡  | 17  | 0       |    |                  |
|              |  | 방A 바닥(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |                  |
|              |  | 방B 바닥(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |                  |
|              |  | 방C 바닥(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |                  |
| 3.도장         |  | KCC합성수지                  |    |     |         |    |                  |
|              |  | 베란다 전면(㎡)                | ㎡  | 22  |         |    |                  |
|              |  | 베란다 후면(㎡)                | ㎡  | 30  |         |    |                  |
|              |  | 내부(문,틀, 울딩,기타)           | ㎡  | 20  |         |    |                  |
|              |  | 방화도어 내부                  | ㎡  | 2   |         |    |                  |
| 4.청소 및 폐기물   |  | 폐기물(작업부산물)               | 식  | 1   | 0       |    |                  |
|              |  | 준공청소(보통인부)               | 인  | 2   | 0       |    |                  |
| 확인자          |  | 사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)     |    |     |         |    |                  |
| 공사검수자        |  | 에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인) |    |     |         |    |                  |
| 검수자          |  | L G 화 학 : 이 상 재 (인)      |    |     |         |    |                  |




# 수장공사 Check List

2020년 10월 20일

| 품 명          |  | 규 격                      | 단위 | 수 량 | 검 수 현 황 |    | 비 고 |
|--------------|--|--------------------------|----|-----|---------|----|-----|
|              |  |                          |    |     | 완료      | 미흡 |     |
| 1동 303호 수장공사 |  |                          |    |     |         |    |     |
| 1.도배         |  | LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)      |    |     |         |    |     |
|              |  | 거실 벽면(㎡)                 | ㎡  | 43  | 0       |    |     |
|              |  | 거실 천정(㎡)                 | ㎡  | 17  | 0       |    |     |
|              |  | 방A 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33  | 0       |    |     |
|              |  | 방A 천정(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
|              |  | 방B 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33  | 0       |    |     |
|              |  | 방B 천정(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
|              |  | 방C 벽면(㎡)                 | ㎡  | 33  | 0       |    |     |
|              |  | 방C 천정(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
|              |  | 주방,타일벽지(㎡)               | ㎡  | 4   | 0       |    |     |
|              |  | 벽지준기                     | ㎡  | 142 | 0       |    |     |
|              |  | 벽 부직포붙이기                 | ㎡  | 142 | 0       |    |     |
| 2.바닥재        |  | LG청택                     |    |     |         |    |     |
|              |  | 거실 바닥(㎡)                 | ㎡  | 17  | 0       |    |     |
|              |  | 방A 바닥(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
|              |  | 방B 바닥(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
|              |  | 방C 바닥(㎡)                 | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
| 3.도장         |  | KCC합성수지                  |    |     |         |    |     |
|              |  | 베란다 전면(㎡)                | ㎡  | 22  | 0       |    |     |
|              |  | 베란다 후면(㎡)                | ㎡  | 30  |         |    |     |
|              |  | 내부(문,틀, 물딩,기타)           | ㎡  | 20  |         |    |     |
|              |  | 방화도어 내부                  | ㎡  | 2   |         |    |     |
| 4.청소 및 폐기물   |  | 폐기물(작업부산물)               | 식  | 1   | 0       |    |     |
|              |  | 준공청소(보통인부)               | 인  | 2   | 0       |    |     |
| 확인자          |  | 사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)     |    |     |         |    |     |
| 공사검수자        |  | 에스엔 아이 코퍼레이션 : 이 종 근 (인) |    |     |         |    |     |
| 검수자          |  | L G 화 학 : 이 상 재 (인)      |    |     |         |    |     |

# 수장공사 Check List


2020년 10월 20일

| 품 명          | 규 격                                                                                                        | 단위 | 수 량 | 검 수 현 황 |    | 비 고 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|----|-----|
|              |                                                                                                            |    |     | 완료      | 미흡 |     |
| 1동 103호 수장공사 |                                                                                                            |    |     |         |    |     |
| 1.도배         | LG취양세 광폭(1롤 16.51㎡)                                                                                        |    |     |         |    |     |
|              | 거실 벽면(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 43  | 0       |    |     |
|              | 거실 천정(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 17  | 0       |    |     |
|              | 방A 벽면(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 33  | 0       |    |     |
|              | 방A 천정(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
|              | 방B 벽면(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 33  | 0       |    |     |
|              | 방B 천정(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
|              | 방C 벽면(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 33  | 0       |    |     |
|              | 방C 천정(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
|              | 주방,타일벽지(㎡)                                                                                                 | ㎡  | 4   | 0       |    |     |
|              | 벽지뜯기                                                                                                       | ㎡  | 142 | 0       |    |     |
|              | 벽 부직포붙이기                                                                                                   | ㎡  | 142 | 0       |    |     |
| 2.바닥재        | LG청택                                                                                                       |    |     |         |    |     |
|              | 거실 바닥(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 17  | 0       |    |     |
|              | 방A 바닥(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
|              | 방B 바닥(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
|              | 방C 바닥(㎡)                                                                                                   | ㎡  | 12  | 0       |    |     |
| 3.도장         | KCC합성수지                                                                                                    |    |     |         |    |     |
|              | 베란다 전면(㎡)                                                                                                  | ㎡  | 22  |         |    |     |
|              | 베란다 후면(㎡)                                                                                                  | ㎡  | 30  | 0       |    |     |
|              | 내부(문,틀, 울딩,기타)                                                                                             | ㎡  | 20  |         |    |     |
|              | 방화도어 내부                                                                                                    | ㎡  | 2   |         |    |     |
| 4.청소 및 폐기물   | 폐기물(작업부산물)                                                                                                 | 식  | 1   | 0       |    |     |
|              | 준공청소(보통인부)                                                                                                 | 인  | 2   | 0       |    |     |
| 확인자          | 사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)  |    |     |         |    |     |
| 공사검수자        | 에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 중 근  |    |     |         |    |     |
| 검수자          | L G 화 학 : 이 상 재 (인)                                                                                        |    |     |         |    |     |



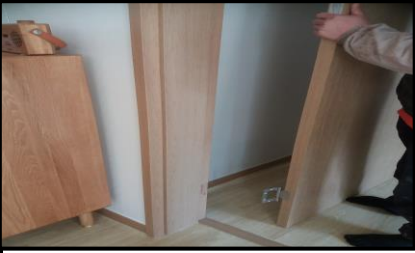
# 수장공사 Check List

2020년 10월 20일

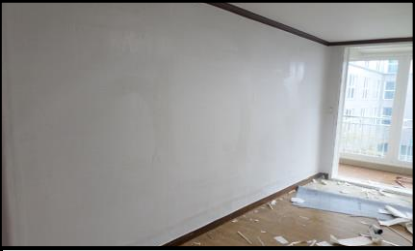
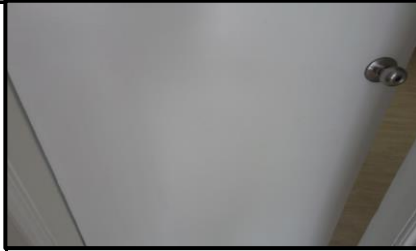
| 품 명          |  | 규 격                                                                                                            | 단위 | 수 량 | 검 수 현 황 |    | 비 고 |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|----|-----|
|              |  |                                                                                                                |    |     | 완료      | 미흡 |     |
| 7동 101호 수장공사 |  |                                                                                                                |    |     |         |    |     |
| 1.도배         |  | LG휘앙세 광폭(1롤 16.51㎡)                                                                                            |    |     |         |    |     |
|              |  | 거실 벽면(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 43  | 0       |    |     |
|              |  | 거실 천정(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 17  |         |    |     |
|              |  | 방A 벽면(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 33  | 0       |    |     |
|              |  | 방A 천정(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 12  |         |    |     |
|              |  | 방B 벽면(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 33  | 0       |    |     |
|              |  | 방B 천정(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 12  |         |    |     |
|              |  | 방C 벽면(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 33  |         |    |     |
|              |  | 방C 천정(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 12  |         |    |     |
|              |  | 주방,타일벽지(㎡)                                                                                                     | ㎡  | 4   |         |    |     |
|              |  | 벽지흔기                                                                                                           | ㎡  | 142 | 0       |    |     |
|              |  | 벽 부직포붙이기                                                                                                       | ㎡  | 142 | 0       |    |     |
| 2.바닥재        |  | LG청택                                                                                                           |    |     |         |    |     |
|              |  | 거실 바닥(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 17  |         |    |     |
|              |  | 방A 바닥(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 12  |         |    |     |
|              |  | 방B 바닥(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 12  |         |    |     |
|              |  | 방C 바닥(㎡)                                                                                                       | ㎡  | 12  |         |    |     |
| 3.도장         |  | KCC합성수지                                                                                                        |    |     |         |    |     |
|              |  | 베란다 전면(㎡)                                                                                                      | ㎡  | 22  |         |    |     |
|              |  | 베란다 후면(㎡)                                                                                                      | ㎡  | 30  |         |    |     |
|              |  | 내부(문,틀,울딩,기타)                                                                                                  | ㎡  | 20  |         |    |     |
|              |  | 방화도어 내부                                                                                                        | ㎡  | 2   |         |    |     |
| 4.청소 및 폐기물   |  | 폐기물(작업부산물)                                                                                                     | 식  | 1   | 0       |    |     |
|              |  | 준공청소(보통인부)                                                                                                     | 인  | 2   | 0       |    |     |
| 확인자          |  | 사택 관리 소장 : 남 해 원 (인)      |    |     |         |    |     |
| 공사검수자        |  | 에스앤 아이 코퍼레이션 : 이 중 근 (인)  |    |     |         |    |     |
| 검수자          |  | L G 화 학 : 이 상 재 (인)                                                                                            |    |     |         |    |     |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2020.10.15- 2020.10.15 |
| 공 사 명 | 사택 102-403 세대내 문보수                                                                | 제출일자 | 2020.10.20             |
| 작업사진  |  |      |                        |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                           |      |                        |
| 작업사진  |  |      |                        |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                           |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |

# 공사 완료 보고서

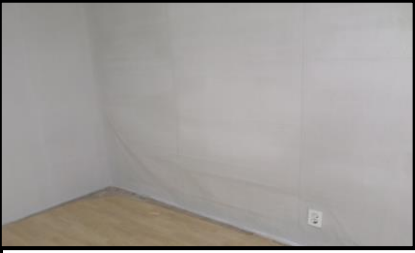
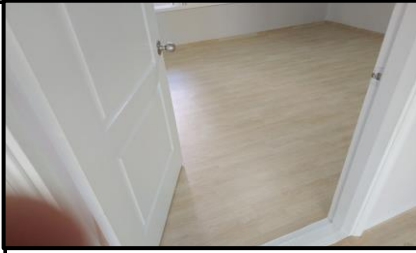
|       |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           | 공사일자                                                                               | 2020.09.18 - 2020.09.28                                                             |
| 공 사 명 | 사택 9-201 수장공사                                                                       | 제출일자                                                                               | 2020.10.20                                                                          |
| 작업사진  |    |  |  |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                             | 장판(작업전)                                                                            | 도장(작업전)                                                                             |
| 작업사진  |    |  |  |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                             | 장판(작업후)                                                                            | 도장(작업후)                                                                             |
| 작업사진  |   |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   | 방충망(작업전)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   | 방충망(작업후)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |



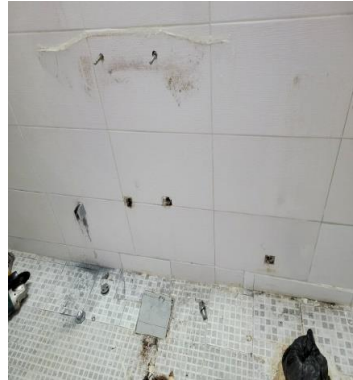
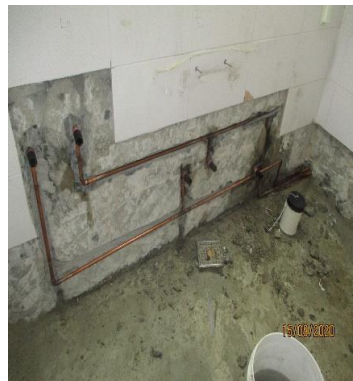
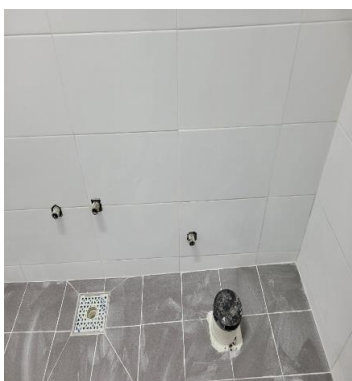
# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자                                                                               | 2020.09.10- 2020.10.13                                                              |
| 공 사 명 | 사택 6-103 화장실 건축 누수보수                                                              | 제출일자                                                                               | 2020.10.20                                                                          |
| 작업사진  |  |  |  |
| 내 용   | 철거(작업후)                                                                           | 방수(작업중)                                                                            | 방수(작업후)                                                                             |
| 작업사진  |  |  |  |
| 내 용   | 방수(테스트후)                                                                          | 타일(작업후)                                                                            | 보수(작업후)                                                                             |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.10.15 - 2020.10.20 |
| 공 사 명 | 사택 6-103 누수부위 훼손 도배 및 장판보수                                                        |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

## 공사 완료 사진

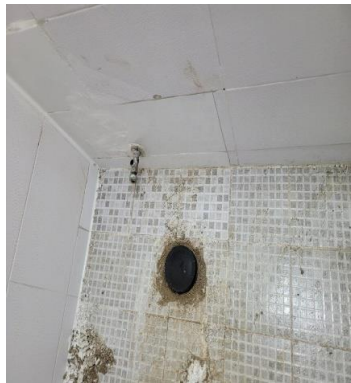
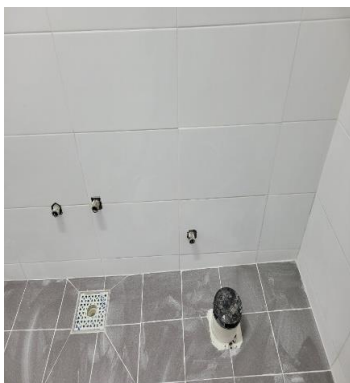
|             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 업 체 명       | 수안이엔지                                                                               |                                                                                      | 공사일자                                                                                  | 2020.09.07-2020.10.12 |
| 공 사 명       | 사택 6-103 화장실 매립배관 교체                                                                |                                                                                      | 제출일자                                                                                  | 2020.10.19            |
| 작업사진<br>(전) |    |    |    |                       |
|             | 내 용                                                                                 | 위생도기 철거                                                                              | 위생도기 철거                                                                               | 위생도기 철거               |
| 작업사진<br>(중) |   |   |   |                       |
|             | 내 용                                                                                 | 매립배관 교체                                                                              | 매립배관 교체                                                                               | 매립배관 교체               |
| 작업사진<br>(후) |  |  |  |                       |
|             | 내 용                                                                                 | 위생도기 재설치                                                                             | 위생도기 재설치                                                                              | 위생도기 재설치              |




# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.09.08- 2020.10.08 |
| 공 사 명 | 사택 6-202 화장실 건축 누수보수                                                              |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20             |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 철거(작업중)                                                                           |                                                                                    | 철거(작업후)                                                                             |                        |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 방수(작업중)                                                                           |                                                                                    | 누수(테스트후)                                                                            |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |

## 공사 완료 사진

|             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 업 체 명       | 수안이엔지                                                                               |                                                                                      | 공사일자                                                                                  | 2020.09.07-2020.10.12 |
| 공 사 명       | 사택 6-202 화장실 매립배관 교체                                                                |                                                                                      | 제출일자                                                                                  | 2020.10.19            |
| 작업사진<br>(전) |    |    |    |                       |
| 내 용         | 위생도기 철거                                                                             |                                                                                      | 위생도기 철거                                                                               |                       |
| 작업사진<br>(중) |   |   |   |                       |
| 내 용         | 매립배관 설치                                                                             |                                                                                      | 매립배관 설치                                                                               |                       |
| 작업사진<br>(후) |  |  |  |                       |
| 내 용         | 위생도기 재설치                                                                            |                                                                                      | 위생도기 재설치                                                                              |                       |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           |                                                                                      | 공사일자                                                                                  | 2020.09.21 - 2020.09.23 |
| 공 사 명 | 기숙사 A동 704-5호 도배보수외 3건                                                              |                                                                                      | 제출일자                                                                                  | 2020.010.20             |
| 작업사진  |    |    |    |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                             |                                                                                      | 도배(작업전)                                                                               | 도장(작업전)                 |
| 작업사진  |    |    |    |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                             |                                                                                      | 도배(작업후)                                                                               | 도장(작업후)                 |
| 작업사진  |   |   |   |                         |
| 내 용   | 롤방충망(작업전)                                                                           |                                                                                      | 문보수(작업전)                                                                              | 유리교체(작업전)               |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 롤방충망(작업후)                                                                           |                                                                                      | 문보수(작업후)                                                                              | 유리교체(작업후)               |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.10.05 - 2020.10.05 |
| 공 사 명 | 기숙사 3동 현관 누수천장 철거 및 원복작업                                                          |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 철거(작업중)                                                                           |                                                                                    | 철거(작업후)                                                                             | 원복(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.09.24- 2020.09.24 |
| 공 사 명 | 사택 5동 경비원 화장실 누수천장 교체                                                             |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20             |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                           |                                                                                    | 교체(작업중)                                                                             |                        |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   | 교체(작업후)                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                          |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.09.16- 2020.09.16 |
| 공 사 명 | 사택 103-102 베란다 누수보수                                                                |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20             |
| 작업사진  |   |  |  |                        |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                            |                                                                                    | 보수(작업전)                                                                             | 보수(작업중)                |
| 작업사진  |   |  |  |                        |
| 내 용   | 보수(작업중)                                                                            |                                                                                    | 보수(작업중)                                                                             | 보수(작업후)                |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                        |



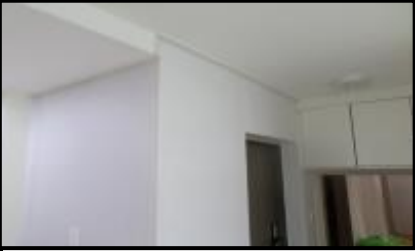
# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.09.25- 2020.09.28 |
| 공 사 명 | 기숙사 3동 504호 소음개선작업                                                                |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20             |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 소음개선(작업전)                                                                         |                                                                                    | 소음개선(작업중)                                                                           | 소음개선(작업중)              |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                        |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.09.23- 2020.10.05 |
| 공 사 명 | 사택 1-103 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20             |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             | 도장(작업전)                |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             | 도장(작업후)                |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.09.24 - 2020.10.05 |
| 공 사 명 | 사택 1-303 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.09.21 - 2020.09.29 |
| 공 사 명 | 사택 5-104 내부 창호교체                                                                  |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                           |                                                                                    | 미장(작업중)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 교체(작업후)                                                                           |                                                                                    | 교체(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                          | 공사일자                                                                               | 2020.09.21 - 2020.09.28                                                             |
| 공 사 명 | 사택 6-203 내부 창호교체                                                                   | 제출일자                                                                               | 2020.10.20                                                                          |
| 작업사진  |   |  |  |
| 내 용   | 철거(작업중)                                                                            | 철거(작업후)                                                                            | 철거(작업후)                                                                             |
| 작업사진  |   |  |  |
| 내 용   | 미장(작업중)                                                                            | 교체(작업중)                                                                            | 교체(작업후)                                                                             |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   | 교체(작업후)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |

# 공사 완료 보고서

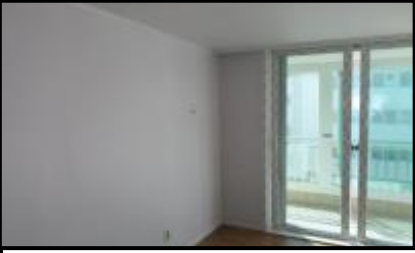
|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.09.21 - 2020.09.25 |
| 공 사 명 | 사택 8-310 내부 창호교체                                                                  |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 철거(작업중)                                                                           |                                                                                    | 미장(작업중)                                                                             | 교체(작업중)                 |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 교체(작업후)                                                                           |                                                                                    | 교체(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서



|       |                                                                                   |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자                                                                                | 2020.09.17 - 2020.09.25 |
| 공 사 명 | 사택 5-203 수장공사                                                                     | 제출일자                                                                                | 2020.10.20              |
| 작업사진  |  |   |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           | 도장(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |  |   |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           | 도장(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |  |                         |
| 내 용   |                                                                                   | 우수관(보수후)                                                                            |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                     |                         |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.10.05- 2020.10.08 |
| 공 사 명 | 사택 6-203 수장공사                                                                       |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20             |
| 작업사진  |    |  |  |                        |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                             |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             |                        |
| 작업사진  |    |  |  |                        |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                             |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             |                        |
| 작업사진  |   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   | 방충망(작업전)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   | 방충망(작업후)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |

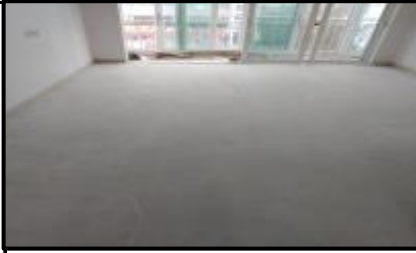
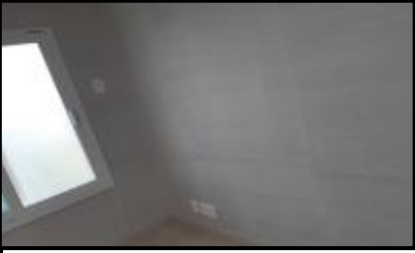
# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           | 공사일자                                                                               | 2020.09.28- 2020.1008                                                               |
| 공 사 명 | 사택 8-310 수장공사                                                                       | 제출일자                                                                               | 2020.10.20                                                                          |
| 작업사진  |    |  |  |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                             | 장판(작업전)                                                                            | 도장(작업전)                                                                             |
| 작업사진  |    |  |  |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                             | 장판(작업후)                                                                            | 도장(작업후)                                                                             |
| 작업사진  |   |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   | 건조대(설치전)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   | 건조대(설치후)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2020.10.19 - 2020.10.19 |
| 공 사 명 | 사택 7-101 수장공사                                                                     | 제출일자 | 2020.10.20              |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.10.13 - 2020.10.16 |
| 공 사 명 | 사택 1-205 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             | 도장(작업전)                 |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             | 도장(작업후)                 |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.10.06- 2020.10.16 |
| 공 사 명 | 사택 1-206 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20             |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           | 장판(작업전)                                                                            | 도장(작업전)                                                                             |                        |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           | 장판(작업후)                                                                            | 도장(작업후)                                                                             |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2020.10.12 - 2020.10.13 |
| 공 사 명 | 사택 1-304 수장공사                                                                     | 제출일자 | 2020.10.20              |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |  |      |                         |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                           |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                         |
| 내 용   |                                                                                   |      |                         |

## 공사 완료 사진

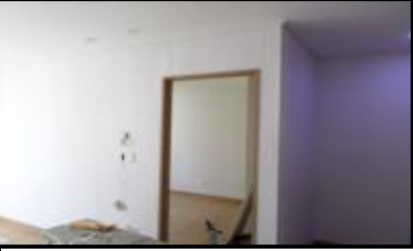
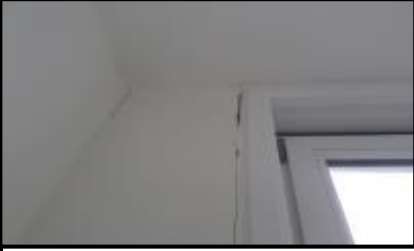
|             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 업 체 명       | 수안이엔지                                                                               |                                                                                      | 공사일자                                                                                 | 09월 23일 |
| 공 사 명       | 사택 6-202 싱크대 하부 난방분배기 누수보수                                                          |                                                                                      | 제출일자                                                                                 | 09월 23일 |
| 작업사진<br>(전) |    |    |                                                                                      |         |
| 내 용         | 싱크대 수전 및 분배기 교체                                                                     |                                                                                      | 싱크대 수전 및 분배기 교체                                                                      |         |
| 작업사진<br>(중) |   |   |  |         |
| 내 용         | 싱크대 수전 및 분배기 교체                                                                     |                                                                                      | 싱크대 수전 및 분배기 교체                                                                      |         |
| 작업사진<br>(후) |  |  |                                                                                      |         |
| 내 용         | 수전 교체 및 분배기 교체 완료                                                                   |                                                                                      | 수전 교체 및 분배기 교체 완료                                                                    |         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                          | 공사일자                                                                               | 2020.09.29 - 2020.09.29                                                             |
| 공 사 명 | 사택 104-501 베란다 누수보수                                                                | 제출일자                                                                               | 2020.10.20                                                                          |
| 작업사진  |   |  |  |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                            | 보수(작업전)                                                                            | 보수(작업중)                                                                             |
| 작업사진  |   |  |  |
| 내 용   | 보수(작업중)                                                                            | 보수(작업중)                                                                            | 보수(작업후)                                                                             |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                           |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.10.08- 2020.10.13 |
| 공 사 명 | 사택 104-501 수장공사                                                                     |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20             |
| 작업사진  |    |  |  |                        |
| 내 용   | 도배(작업전)                                                                             |                                                                                    | 장판(작업전)                                                                             | 도장(작업전)                |
| 작업사진  |    |  |  |                        |
| 내 용   | 도배(작업후)                                                                             |                                                                                    | 장판(작업후)                                                                             | 도장(작업후)                |
| 작업사진  |   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   | 문보수(작업전)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |  |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   | 문보수(작업후)                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                        |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.10.13- 2020.10.15 |
| 공 사 명 | 사택 5-502 지붕 배수로 기와보수                                                              |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20             |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                           |                                                                                    | 보수(작업중)                                                                             |                        |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                        |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                           |                                                                                    | 보수(작업후)                                                                             |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                          |                                                                                     | 공사일자                                                                                | 2020.10.15 - 2020.10.16 |
| 공 사 명 | 사택 8-508 지붕 배수로 기와보수                                                               |                                                                                     | 제출일자                                                                                | 2020.10.20              |
| 작업사진  |   |   |  |                         |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                            |                                                                                     | 보수(작업전)                                                                             |                         |
| 작업사진  |   |   |  |                         |
| 내 용   | 배수로분리(작업중)                                                                         |                                                                                     | 배수로분리(작업후)                                                                          |                         |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                         |
| 내 용   | 보수(작업후)                                                                            |                                                                                     | 보수(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                         |

# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |      |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         | 공사일자 | 2020.10.08- 2020.10.08 |
| 공 사 명 | 사택 지붕 보수용 기와 구입 및 도장작업                                                            | 제출일자 | 2020.10.20             |
| 작업사진  |  |      |                        |
| 내 용   | 도장(작업전)                                                                           |      |                        |
| 작업사진  |  |      |                        |
| 내 용   | 도장(작업후)                                                                           |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |      |                        |
| 내 용   |                                                                                   |      |                        |

# 공사 완료 보고서

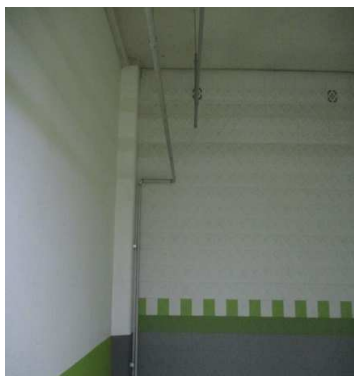
|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.10.07 - 2020.10.07 |
| 공 사 명 | 사택 5-305 외부창호 누수보수                                                                |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20              |
| 작업사진  |  |  |  |                         |
| 내 용   | 보수(작업전)                                                                           | 보수(작업중)                                                                            | 보수(작업후)                                                                             |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                         |



# 공사 완료 보고서

|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 업 체 명 | 주식회사 일성건축                                                                         |                                                                                    | 공사일자                                                                                | 2020.10.06- 2020.10.19 |
| 공 사 명 | 사택 5-105 내부 창호교체                                                                  |                                                                                    | 제출일자                                                                                | 2020.10.20             |
| 작업사진  |  |  |  |                        |
| 내 용   | 교체(작업전)                                                                           |                                                                                    | 미장(작업중)                                                                             |                        |
| 작업사진  |  |  |                                                                                     |                        |
| 내 용   | 교체(작업후)                                                                           |                                                                                    | 교체(작업후)                                                                             |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 작업사진  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |
| 내 용   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                        |

## 공사 완료 사진

|             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 업 체 명       | 수안이엔지                                                                               |                                                                                      | 공사일자                                                                                  | 10월 12일 |
| 공 사 명       | 사택 102동 전기실 에어컨 드레인배관                                                               |                                                                                      | 제출일자                                                                                  | 10월 19일 |
| 작업사진<br>(전) |    |    |    |         |
| 내 용         | 에어컨 드레인 설치공사                                                                        | 에어컨 드레인 설치공사                                                                         | 에어컨 드레인 설치공사                                                                          |         |
| 작업사진<br>(중) |   |   |   |         |
| 내 용         | 배관 설치 진행 중                                                                          | 배관 설치 진행 중                                                                           | 배관 설치 진행 중                                                                            |         |
| 작업사진<br>(후) |  |  |  |         |
| 내 용         | 배관 설치 후 보온작업 진행                                                                     | 배관 설치 후 보온작업 진행                                                                      | 배관 설치 후 보온작업 진행                                                                       |         |

# 공사 완료 사진

|             |                                                                                     |                                                                                      |      |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 업 체 명       | 대양 ENC                                                                              |                                                                                      | 공사일자 | 10월 14일 |
| 공 사 명       | 사택 무정전 전원공급 장치 설치                                                                   |                                                                                      | 제출일자 | 10월 14일 |
| 작업사진<br>(전) |    |                                                                                      |      |         |
| 내 용         | 작업 전                                                                                |                                                                                      |      |         |
| 작업사진<br>(중) |  |  |      |         |
| 내 용         | 케이블 포설                                                                              | 케이블 포설                                                                               |      |         |
| 작업사진<br>(후) |  |  |      |         |
| 내 용         | UPS 설치완료                                                                            | 콘센트 설치완료                                                                             |      |         |



결재상세화면 PO 취소

|      |                                            |  |      |
|------|--------------------------------------------|--|------|
| 작성자  | 에스앤아이코퍼레이션 이종근 선임 (010-2276-1874)          |  |      |
| 작성일  | 2020.10.13 06:26                           |  | 보존년한 |
| 결재유형 | PO취소                                       |  |      |
| 제목   | [4508713859-10]사택 103-202 단열작업취소에 따른 PO취소건 |  |      |

작업 취소에따른 PO취소가 발생하여 아래와 같이 품의상신 하오니 검토후 결재 요청 합니다.

- 1) 정보
- . 업 체 : 일성건축

. 공사명 : 사택 103-202 단열작업

. 금 액 : 매입 2,516,000원 / PO 2,704,700원(매입 x 7.5%\_ Cost-Fee)

. 번 호: 4508713859-10(PO) / 92306327-130(PR)
- 2) 사유
- . 입주민의 작업취소 요청(코로나19로 인하여 외부인원 출입제한)으로 PO취소

파일첨부

다운로드

파일 이름

참조

| 결재상태           | 결재유형 | 결재번호 | 결재제목 | 작성자 | 작성일 | 결재완료일 |  |
|----------------|------|------|------|-----|-----|-------|--|
| 조회된 데이터가 없습니다. |      |      |      |     |     |       |  |

승인자정보

| 구분 | 성명  | 직책/직급호칭 | 부서         | 결재시간                | 결재결과 | 결재의견      |  |
|----|-----|---------|------------|---------------------|------|-----------|--|
| 작성 | 이종근 | 선임      | 에스앤아이코퍼레이션 | 2020/10/13 06:26:33 | 결재의뢰 |           |  |
| 결재 | 이상재 | 책임      | 대전.업무지원팀   | 2020/10/13 08:00:57 | 승인   | 결재 승인합니다. |  |

## PO변경 품목

## PO 변경사유

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 취소사유 | <div> <div> 사택 103동 202호 입주민(코로나19로 인한 외부인원 출입제한) 요청에 따른 작업 취소 </div> </div> |
|------|------------------------------------------------------------------------------|

PO변경 품목

| ✓ | PO번호       | 품목번호 | 변경구분 | 자재코드 | MPN 자재 | 공급업체 자재번호 | 품명              | 오더단위 | PO수량 | PO단가         | 가격단위 | PO금액         | 납기   |
|---|------------|------|------|------|--------|-----------|-----------------|------|------|--------------|------|--------------|------|
| ✓ | 4508713859 | 10   | 취소   |      | Q      |           | 사택 103동 202호 단열 | AU   | 1.00 | 2,704,700.00 | 1.00 | 2,704,700.00 | 2020 |
