

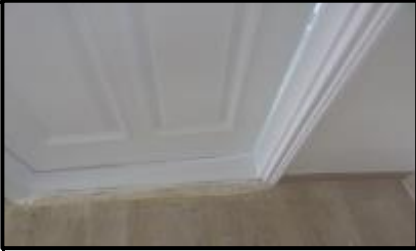
기숙사 및 사택 9월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	B-A (차액)	A/B (요율)
					31,045,000 14,341,000 29,180,000 1,548,000 3,132,000 79,246,000	29,244,250 13,109,625 28,614,300 1,506,075 3,076,650 75,550,900	==>일성-일반(10 건) ==>일성-임차사택(5 건) ==>동운(1 건) ==>이에이치솔루텍(1 건) ==>서울방재전문기술단(1 건) 9월 마감건(18 건)	- 3,695,100	-6% -9% -2% -3% -2% -5%
1	09월30일	사택 외부계단 및 화단 경계벽돌 보수		2023-08-18	3,240,000	3,132,550	일성건축	- 107,450	-3%
2	09월30일	사택 2-406 수장공사		2023-08-24	3,470,000	3,407,750	일성건축	- 62,250	-2%
3	09월30일	사택 2-205 수장공사		2023-08-31	4,041,000	3,968,900	일성건축	- 72,100	-2%
4	09월30일	사택 2-307 가구 폐기물 처리	변경전: 사다리차 o 변경후: 사다리차 X	2023-08-24	1,622,000	629,950	일성건축	- 992,050	-157%
5	09월30일	사택 5-304 주방벽 철거 및 타일교체		2023-08-31	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
6	09월30일	사택 8-108 주방벽 철거 및 타일교체		2023-08-31	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
7	09월30일	사택 8-202 주방벽 철거 및 타일교체		2023-08-31	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
8	09월30일	사택 8-406 주방벽 철거 및 타일교체		2023-08-24	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
9	09월30일	사택 8-505 내부 창호교체(고층장비)		2023-09-01	12,147,000	11,681,975	일성건축	- 465,025	-4%
10	09월30일	사택 8-505 주방벽 및 현관타일 교체		2023-08-31	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
11	09월30일	기숙사 AB동 옥외 누수 오배수배관 보수(1차)		2023-09-22	29,180,000	28,614,300	동운	- 565,700	-2%
12	09월30일	사택 103동 화재수신반 증기기 보수		2023-09-22	3,132,000	3,076,650	서울방재전문기술단	- 55,350	-2%
13	09월30일	사택 2동 도시가스 보호덮개 설치 작업		2023-09-08	1,548,000	1,506,075	이에이치솔루텍	- 41,925	-3%
14	09월30일	임차사택 수장공사 박현영(양극재)		2023-08-31	2,261,000	2,230,625	일성건축	- 30,375	-1%
15	09월30일	임차사택 수장공사 김지태(구조분석)		2023-08-18	2,261,000	2,230,625	일성건축	- 30,375	-1%
16	09월30일	임차사택 수장공사 박병훈(개발팀)		2023-08-17	3,273,000	3,208,875	일성건축	- 64,125	-2%
17	09월30일	임차사택 수장공사 이상현(건설전크)		2023-08-30	3,273,000	3,208,875	일성건축	- 64,125	-2%
18	09월30일	임차사택 수장공사 정다솔(자동차개발)	장판 취소(PO변경 완료) 도배 및 청소 작업 변경전(3,208,875) 변경후(2,230,625)	2023-08-30	3,273,000	2,230,625	일성건축	- 1,042,375	-47%

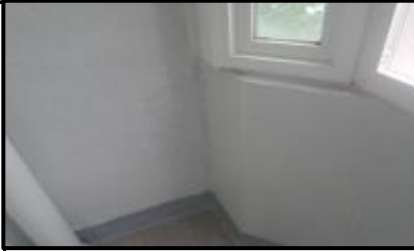
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.03 - 2023.08.18
공 사 명	사택 외부계단 및 화단 경계벽돌 보수		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.17 - 2023.08.30
공 사 명	사택 2-406 수장공사		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.17 - 2023.08.30
공 사 명	사택 2-205 수장공사		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.08.24 - 2023.08.24
공 사 명	사택 2-307 폐기물 처리	제출일자	2023.09.20
작업사진			
내 용	폐기물 처리(작업전)	폐기물 처리(작업전)	폐기물 처리(작업전)
작업사진			
내 용	폐기물 처리(작업후)	폐기물 처리(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

[illegible]

공사 완료 보고서

[illegible]

공사 완료 보고서

[illegible]

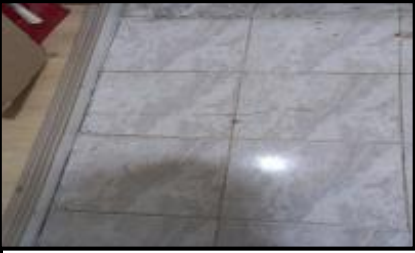
공사 완료 보고서

[illegible]

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.23 - 2023.08.30
공 사 명	사택 8-505 내부 청호교체(고층장비)		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		미장(작업후)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

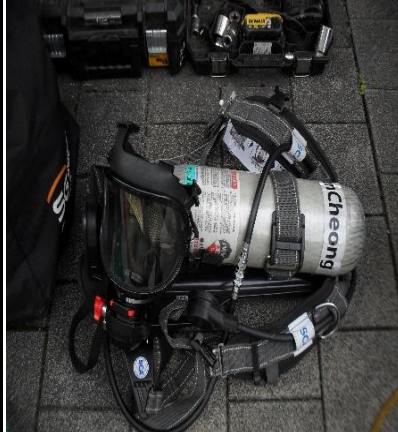
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.23 - 2023.08.29
공 사 명	사택 8-505 주방벽 및 현관타일 교체		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	타일(작업전)		철거(작업중)	타일(작업후)
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업후)	타일(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.08.21~2023.09.04
공 사 명	기숙사 AB동 옥외 누수 오배수 배관 보수	제출일자	2023.09.12
작업사진			
내 용	작업 구역 통제	작업 구역 통제	작업 구역 통제
작업사진			
내 용	준설 작업	1차 준설 작업	1차 준설 작업
작업사진			
내 용	1차 준설 작업	1차 준설 완료	1차 준설 완료

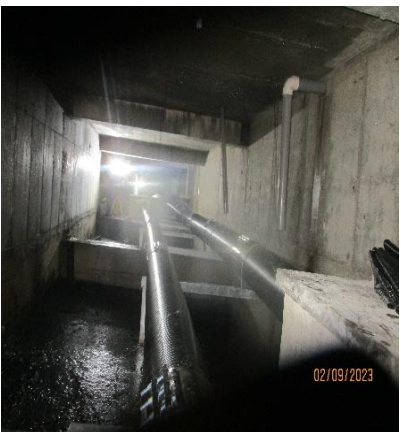
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.08.21~2023.09.04	
공 사 명	기숙사 AB동 옥외 누수 오배수 배관 보수		제출일자	2023.09.12	
작업사진					
내 용	작업 관련 안전사항 확인		송기 마스크 구비		송기 마스크 구비
작업사진					
내 용	작업 시 안전 조치		산소 농도 측정		작업등 설치
작업사진					
내 용	2차 준설 작업		2차 준설 작업		2차 준설 작업

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.08.21~2023.09.04
공 사 명	기숙사 AB동 옥외 누수 오배수 배관 보수	제출일자	2023.09.12
작업사진			
내 용	주 배관 철거 작업	주 배관 철거 작업	주 배관 철거 작업
작업사진			
내 용	주 배관 철거 작업	주 배관 철거 작업	주 배관 철거 작업
작업사진			
내 용	외부 반출 완료	외부 반출 완료	외부 반출 완료

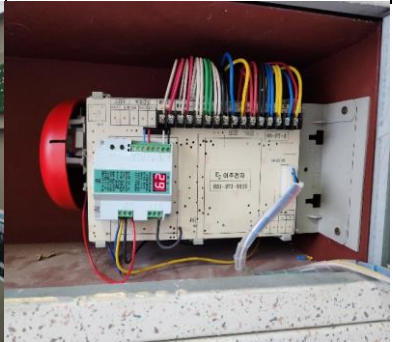
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.08.21~2023.09.04
공 사 명	기숙사 AB동 옥외 누수 오배수 배관 보수	제출일자	2023.09.12
작업사진			
내 용	반출 후 폐기	폐기	폐기 완료
작업사진			
내 용	주 배관 설치 작업	주 배관 설치 작업	주 배관 설치 작업
작업사진			
내 용	주 배관 설치 작업	주 배관 설치 작업	주 배관 설치 작업

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2023.08.21~2023.09.04
공 사 명	기숙사 AB동 옥외 누수 오배수 배관 보수	제출일자	2023.09.12
작업사진			
내 용	주배관, 가지배관 연결	주배관, 가지배관 연결	주배관, 가지배관 연결
작업사진			
내 용	주배관, 가지배관 연결	주배관, 가지배관 연결	주배관, 가지배관 연결
작업사진			
내 용	주배관, 가지배관 연결	공동구 청소 완료	공동구 청소 완료

공사 완료 사진

업 체 명	(주)서울방재전문기술단		공사일자	2023.08.28
공 사 명	[ESPR:92683318]사택 103동 화재수신반 중계기 보수		제출일자	08월 29일
작업사진	  			
내 용	103동 중계기 전원 보수 전	103동 중계기 전원 보수 중	103동 중계기 전원 보수 중	
작업사진	  			
내 용	103동 중계기 전원 보수 중	103동 중계기 전원 보수 후	103동 중계기 전원 보수 후	

사 진 대 지

공사명 : [ESPR_92683979] 사택 2동 도시가스 보호덮개 설치 작업_CI23012763



차량보호대입고-작업전



기존입상관-작업전



기존입상관-작업전



차량보호대설치-작업중



차량보호대설치-작업완료



차량보호대설치-작업완료

사 진 대 지

공사명 : [ESPR_92683979]사택 2동 도시가스 보호덮개 설치 작업_CI23012763



차량보호대설치-작업완료



차량보호대설치-작업완료



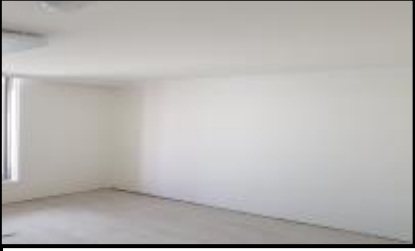
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.08.16- 2023.08.19
공 사 명	임차사택 수장공사 박현영(양극재)	제출일자	2023.09.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.17- 2023.08.18
공 사 명	임차사택 수장공사 김지태(구조분석)		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

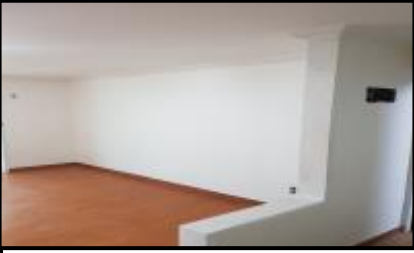
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.14- 2023.08.19
공 사 명	임차사택 수장공사 박병훈(개발팀)		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.28- 2023.08.29
공 사 명	임차사택 수장공사 이상현(건설전극)		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.24- 2023.08.30
공 사 명	임차사택 수장공사 정다솔(자동차개발)		제출일자	2023.09.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					원료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-205호								
1.도배	LG취안세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12	✓	✓			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16	✓	✓			
	방화도어 내부	m²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40	✓	✓			
5.기타	뒤베란다곰파이제거, 누수확인및보수, 앞,뒤베란다탄성코트 부분보수, 뒤베란다벽단열재크랙전체보수, 뒤베란다 바닥 타일 줄눈보수, 신발장시트지교체, 거실 걸레받이부분보수, 방충망-7개(앞베란다(5개),뒤베란다(2개))				✓	✓		
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.09.11							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 23.09.12							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-406호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40	✓	✓			
5.기타	뒤베란다벽면크랙전체보수, 주방우측방 누수점검및보수, 뒤베란다우수관주변누수점검및보수, 싱크대상,하부장 문짝전체교체, 주방렌지후드교체, 화장실수납장교체, 거실내부샤시방충망(1개)교체, 문골림-1곳(뒤베란다문)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.09.11							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 23.09.12							

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공사명:임차사택 수장공사 박현영(양극재)												
1.도배	LG휘앙세 광폭											
	거실 벽면	㎡	40	1,086	43,440	5,261	210,440				253,880	
	거실 천정	㎡	24	1,086	26,064	6,839	164,136				190,200	
	방A 벽면	㎡	32	1,086	34,752	5,261	168,352				203,104	
	방A 천정	㎡	16	1,086	17,376	6,839	109,424				126,800	
	방B 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방B 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	방C 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방C 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	147			1,283	188,858				188,858	
소 계			184		199,824		1,254,718				1,454,542	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 철거	㎡										
	방A 바닥 철거	㎡										
	방B 바닥 철거	㎡										
	방C 바닥 철거	㎡										
	접착제(부분접착)	kg										
	거실 바닥	㎡										
	방A 바닥	㎡										
	방B 바닥	㎡										
	방C 바닥	㎡										
소 계			0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			6,200	279,000				279,000	2022년 실내건축 일위
소 계							279,000				279,000	
합 계					199,824		1,533,718		0		1,733,542	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,075,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 박현영 근무부서: 양극재팀 전화번호: 010-4934-3297 사택명: 하문다과트

의견조회

점수가 자동계산됩니다.

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 이상현(건식전극)												
1.도배	LG휘앙세 광폭											
	거실 벽면	㎡	40	1,086	43,440	5,261	210,440				253,880	
	거실 천정	㎡	24	1,086	26,064	6,839	164,136				190,200	
	방A 벽면	㎡	32	1,086	34,752	5,261	168,352				203,104	
	방A 천정	㎡	16	1,086	17,376	6,839	109,424				126,800	
	방B 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방B 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	방C 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방C 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	147			1,283	188,858				188,858	
소 계			184		199,824		1,254,718				1,454,542	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 철거	㎡	15			3,849	57,735				57,735	
	방A 바닥 철거	㎡	8			3,849	30,792				30,792	
	방B 바닥 철거	㎡	7			3,849	26,943				26,943	
	방C 바닥 철거	㎡	6			3,849	23,094				23,094	
	접착제(부분접착)	kg	4	16,157	64,628						64,628	
	거실 바닥	㎡	15	14,003	210,045	3,515	52,725				262,770	
	방A 바닥	㎡	8	14,003	112,024	3,515	28,120				140,144	
	방B 바닥	㎡	7	14,003	98,021	3,515	24,605				122,626	
	방C 바닥	㎡	6	14,003	84,018	3,515	21,090				105,108	
소 계			36		568,736		265,104			833,840		
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			6,200	279,000				279,000	2022년 실내건축 일위
소 계						279,000				279,000		
합 계					768,560		1,798,822		0		2,567,382	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,985,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 이상현 근무부서: CTO

전화번호: 010-7615-6161 사택명: 세종아파트

Cell선행, 선행공정철, 전식전극2팀

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 정다솔(자동차개발)												
1.도배	LG취양세 광폭											
	거실 벽면	㎡	40	1,086	43,440	5,261	210,440				253,880	
	거실 천정	㎡	24	1,086	26,064	6,839	164,136				190,200	
	방A 벽면	㎡	32	1,086	34,752	5,261	168,352				203,104	
	방A 천정	㎡	16	1,086	17,376	6,839	109,424				126,800	
	방B 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방B 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	방C 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방C 천정	㎡	11	1,086	11,946	6,839	75,229				87,175	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	147			1,283	188,858				188,858	
소 계			184		199,824		1,254,718				1,454,542	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 철거	㎡										
	방A 바닥 철거	㎡										
	방B 바닥 철거	㎡										
	방C 바닥 철거	㎡										
	접착제(부분접착)	kg										
	거실 바닥	㎡										
	방A 바닥	㎡										
	방B 바닥	㎡										
	방C 바닥	㎡										
소 계			0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			6,200	279,000				279,000	2022년 실내건축 일위
소 계						279,000				279,000		
합 계					199,824		1,533,718		0		1,733,542	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩2,075,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: MSCLIN 근무부서: Ford 제품개발 전화번호: 010 5520834 사택명: 세종아파트
