

기숙사 및 사택 2월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

24-2-16

NO.	발주	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요일)
						29,517,000	27,957,525	==>일성-일반(8 건)		-6%
						4,672,000	4,408,575	==>대양이엔씨(3 건)		-6%
						34,189,000	32,366,100	2월 마감건(11 건)	- 1,822,900	-6%
00	P	계약파기	[계약파기]사택 5-204 화장실 건축 누수보수	5-104 (공가 배정시 고려)						
00	P	계약파기	[계약파기]사택 5-204 화장실 매립배관 교체	5-104 (공가 배정시 고려)						
7	P	02월29일	사택 7-304 LED등기구 교체	단기입주세대	2023-09-22	1,003,000	975,025	대양이엔씨	- 27,975	-3%
8	L	02월29일	사택 어린이집 노후시설 보수(건축)		2023-12-07	1,973,000	1,928,550	일성건축	- 44,450	-2%
9	L	02월29일	사택 어린이집 노후시설 보수(전기)		2023-12-07	2,666,000	2,585,375	대양이엔씨	- 80,625	-3%
1	K	02월29일	기숙사 B동 904-3호 발코니 수납장 내부 누수 보수		2024-02-09	509,000	504,175	일성건축	- 4,825	-1%
2	K	02월29일	사택 7-408 외벽세대 단열작업		2024-02-09	4,361,000	4,257,000	일성건축	- 104,000	-2%
3	K	02월29일	사택 9-305 천장 누수 보수 작업	주방천장 물딩 및 석고붙임 교체 물량 최소 (재실측)	2024-02-09	2,695,000	2,008,100	일성건축	- 686,900	-34%
4	K	02월29일	사택 7-408 LED등기구 교체	전력량계 자재비 하락분 반영후 재계약	2024-02-09	1,003,000	848,175	대양이엔씨	- 154,825	-18%
5	K	02월29일	사택 7-408 수장공사		2024-02-09	3,482,000	3,416,350	일성건축	- 65,650	-2%
6	K	02월29일	사택 7-408 앞뒤 베란다 다용도실 단열작업		2024-02-09	2,013,000	1,979,075	일성건축	- 33,925	-2%
10	K	02월29일	사택 9-406 다용도실 및 뒤베란다 외벽 단열		2024-02-09	2,277,000	2,243,525	일성건축	- 33,475	-1%
11	K	02월29일	사택 9-406 내부 창호교체(고층장비)		2024-02-09	12,207,000	11,620,750	일성건축	- 586,250	-5%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.01.03- 2024.01.03
공 사 명	기숙사 B동 904-3호 발코니 수납장 내부 누수보수		제출일자	2024.02.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)	철거(작업후)	재설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.12.21- 2024.01.10
공 사 명	사택 7-408 외벽세대 단열작업	제출일자	2024.02.20
작업사진			
내 용	단열(작업전)	단열(작업전)	철거(작업후)
작업사진			
내 용	철거(작업후)	단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	단열(작업후)	재설치(작업후)
작업사진			
내 용	재설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

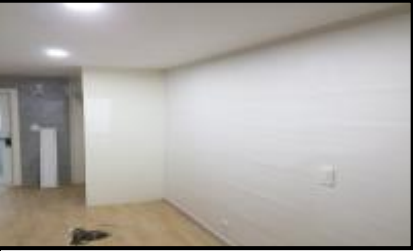
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.01.11 - 2024.01.24
공 사 명	사택 9-305 천장 누수 보수 작업		제출일자	2024.02.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		철거(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년
공 사 명	사택 7-408 LED등기구 교체		제출일자	2024년
작업사진				
내 용	전등 설치		전등 설치	
작업사진				
내 용	전등 설치		전등 설치	
작업사진				
내 용	전등 설치		전등 설치	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.01.15 - 2024.01.30
공 사 명	사택 7-408 수장공사		제출일자	2024.02.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.12.21 - 2024.12.28
공 사 명	사택 7-408 앞뒤 베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2024.02.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년
공 사 명	사택 7-304 LED등기구 교체		제출일자	2024년
작업사진				
내 용	전등 설치	전등 설치	전등 설치	
작업사진				
내 용	전등 설치	전등 설치	전등 설치	
작업사진				
내 용	전등 설치	전등 설치		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.01.03 - 2024.01.04
공 사 명	사택 어린이집 노후시설 보수(건축)		제출일자	2024.02.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	제거(작업전)			
작업사진				
내 용	제거(작업후)			


■ 건축 (1월3일 ~ 4일) => 작업 완료

- ◎ 1층 화장실 핸드타올 걸이대 벌어진 부위 재부착
- ◎ 교실 출입문 시트지 까짐 보수(별님반)
- ◎ 1층 창의교실 전선 늘어짐 정리 다목적실 벽면 파손 수리
- ◎ 경첩고장(달님반 상부장, 은하수반 교구장, 2층 여아화장실 상부장)
- ◎ 2층 손끼임 방지대 교체 및 수리 위해 제거
(화장실 회색 방지대, 화장실 내 세탁실 출입문, 놀이터 출입구)
- ◎ 3층 유아놀이터 출입구 좌측 고정문 파손 수리
- ◎ 2층 및 3층 놀이터 청소

■ 전기 (1월4일) => 작업 완료

- ◎ 천장 평판등(LED): 13개 교체=> 잔여 2개는 어린이집 지급 예정
(1층 복도, 해님반, 달님반, 별님반, 무지개반, 은하수반, 유희실, 창의교실, 다목적실)
- ◎ 전등 불 켜짐 지연으로 접촉불량(달님반)=> 4구 스위치 교체
- ◎ 1층 창의교실 전선 늘어짐 정리 및 물딩 작업=> 20개 설치

■ 주요 공정 사진



■ 어린이집 보수 내용(접수 목록)

LG대전어린이집 보수 · 수리 의뢰

- 현관 의약품냉장고 및 체온측정기 전선 늘어짐 정리
- 1층 화장실 핸드타올 걸이대 벌어진 부위 재부착
- 전등 교체
(1층 복도, 해님반, 달님반, 별님반, 무지개반, 은하수반, 유희실, 창의교실, 다목적실)
- 전등 불 켜짐 지연으로 접촉불량 여부 확인 (달님반)
- 교실 출입문 시트지 까짐 보수(별님반)
- 1층 창의교실 전선 늘어짐 정리
다목적실 벽면 파손 수리
- 경첩 고장(달님반 상부장, 은하수반 교구장, 2층 여아화장실 상부장)
- 손끼임 방지대 교체 및 수리 위해 제거
(2층 남아 화장실 회색 방지대, 2층 여아화장실 내 세탁실 출입문, 2층 놀이터 출입구)
- 3층 유아놀이터 출입구 좌측 고정문 파손 수리

※ 2024년 1월 5일 금요일 어린이집 평가제 예정

	보수사항	보수 수리 이유	사진 첨부
해님반 1층	현관 의약품냉장고 전선 정리	전선 늘어짐	
	현관 체온측정기 전선 정리	전선 늘어짐	
해님반 1층	교실 내 일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	

달님반 1층	교실 내 일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
	교실 상부 장 경첩 수리 또는 교체 (항만 예시했을 때 아래 경첩)	경첩 고장	
별님반 1층	출입문 시트지 교체	시트지 찢김	
복도 1층	일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
1층 화장실	핸드타올 걸이 재부착	고장부위 일부 뜯어짐	

2층 화장실 남아	손끼임 방지대(회색만) 제거	색상고쳐 위해 제거	
2층 남아 놀이터 출입문	손끼임 방지대 제거	파손	
2층 간이창고	간이 창고 고정장치 벽면과의 고정 볼가로 교체	고정 장치 교체	
3층 남아 놀이터 출입문	좌측 고정문 고정	좌측 고정문 파손	

유희실 1층	일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
1층 창의교실	전선 물림	전선 늘어짐	
다목적실 2층	일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
	벽면 수리	벽면 하부 파손	

무지개반 2층	일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
은하수반 2층	일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
	교구장 경첩 수리 또는 교체	경첩고장	
2층 화장실 여아	2층 여아화장실 상부장 경첩 수리 또는 교체	경첩고장	
	2층 여아화장실 내 세탁실 손끼임 방지대 교체 위해 기존 방지대 제거	파손	

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년
공 사 명	사택 어린이집 노후시설 보수(전기)		제출일자	2024년
작업사진				
내 용	전등 설치	전등 설치	전등 설치	
작업사진				
내 용	전등 설치	전등 설치		
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

■ 건축 (1월3일 ~ 4일) => 작업 완료

- ◎ 1층 화장실 핸드타올 걸이대 벌어진 부위 재부착
- ◎ 교실 출입문 시트지 까짐 보수(별님반)
- ◎ 1층 창의교실 전선 늘어짐 정리 다목적실 벽면 파손 수리
- ◎ 경첩고장(달님반 상부장, 은하수반 교구장, 2층 여아화장실 상부장)
- ◎ 2층 손끼임 방지대 교체 및 수리 위해 제거
(화장실 회색 방지대, 화장실 내 세탁실 출입문, 놀이터 출입구)
- ◎ 3층 유아놀이터 출입구 좌측 고정문 파손 수리
- ◎ 2층 및 3층 놀이터 청소

■ 전기 (1월4일) => 작업 완료

- ◎ 천장 평판등(LED): 13개 교체=> 잔여 2개는 어린이집 지급 예정
(1층 복도, 해님반, 달님반, 별님반, 무지개반, 은하수반, 유희실, 창의교실, 다목적실)
- ◎ 전등 불 켜짐 지연으로 접촉불량(달님반)=> 4구 스위치 교체
- ◎ 1층 창의교실 전선 늘어짐 정리 및 몰딩 작업=> 20개 설치

■ 주요 공정 사진



■ 어린이집 보수 내용(접수 목록)

LG대전어린이집 보수 · 수리 의뢰

- 현관 의약품냉장고 및 체온측정기 전선 늘어짐 정리
- 1층 화장실 핸드타올 걸이대 벌어진 부위 재부착
- 전등 교체
(1층 복도, 해님반, 달님반, 별님반, 무지개반, 은하수반, 유희실, 창의교실, 다목적실)
- 전등 불 켜짐 지연으로 접촉불량 여부 확인 (달님반)
- 교실 출입문 시트지 까짐 보수(별님반)
- 1층 창의교실 전선 늘어짐 정리
다목적실 벽면 파손 수리
- 경첩 고장(달님반 상부장, 은하수반 교구장, 2층 여아화장실 상부장)
- 손끼임 방지대 교체 및 수리 위해 제거
(2층 남아 화장실 회색 방지대, 2층 여아화장실 내 세탁실 출입문, 2층 놀이터 출입구)
- 3층 유아놀이터 출입구 좌측 고정문 파손 수리

※ 2024년 1월 5일 금요일 어린이집 평가제 예정

	보수사항	보수 수리 이유	사진 첨부
해님반 1층	현관 의약품냉장고 전선 정리	전선 늘어짐	
	현관 체온측정기 전선 정리	전선 늘어짐	
해님반 1층	교실 내 일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	

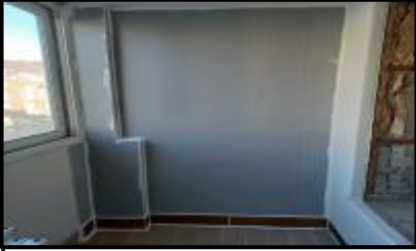
달님반 1층	교실 내 일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
	교실 상부 장 경첩 수리 또는 교체 (항면 예시했을 때 아래 경첩)	경첩 고장	
별님반 1층	출입문 시트지 교체	시트지 찢김	
복도 1층	일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
1층 화장실	핸드타올 걸이 재부착	고장부위 일부 뜯어짐	

2층 화장실 남아	손끼임 방지대(회색만) 제거	색상고쳐 위해 제거	
2층 영아 놀이터 출입문	손끼임 방지대 제거	파손	
2층 간이창고	간이 창고 고정장치 벽면과의 고정 볼가로 교체	고정 장치 교체	
3층 영아 놀이터 출입문	좌측 고정문 고정	좌측 고정문 파손	

유희실 1층	일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
1층 창의교실	전선 물림	전선 늘어짐	
다목적실 2층	일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
	벽면 수리	벽면 하부 파손	

무지개반 2층	일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
은하수반 2층	일부 전등 교체 *포스트잇으로 표시해둠	전등 태두리 부근 나감	
	교구장 경첩 수리 또는 교체	경첩고장	
2층 화장실 여아	2층 여자화장실 상부장 경첩 수리 또는 교체	경첩고장	
	2층 여자화장실 내 세탁실 손끼임 방지대 교체 위해 기존 방지대 제거	파손	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.01.22 - 2024.01.25
공 사 명	사택 9-406 다용도실 및 뒤베란다 외벽 단열		제출일자	2024.02.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		곰팡이(제거후)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용	단열(작업전)		곰팡이(제거후)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.01.22 - 2024.01.29
공 사 명	사택 9-406 내부 창호교체(고층장비)		제출일자	2024.02.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		미장(작업후)	
작업사진				
내 용	설치(작업중)		설치(작업중)	
작업사진				
내 용	설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
