

목 록

4월 마감자료 목록_솔루션	1
4월 완료사진_솔루션	2
01완료사진_(사택 9-501 안방 단열 및 뒤베란다 곰팡이제거 도장)	3
02완료사진_(기숙사 A동 302-2호 도배보수와 10세대)	4
03완료사진_(사택 2-104 수장공사)	5
04완료사진_(사택 2-104 썬크대 상하부장 문짝교체)	6
05완료사진_(사택 2-305 수장공사)	7
06완료사진_(사택 5-205 수장공사)	8
07완료사진_(사택 5-205 썬크대 상하부장 문짝교체)	9
08완료사진_(사택 5-301 수장공사)	10
09완료사진_(사택 7-401 수장공사)	11
10완료사진_(사택 7-401 외벽세대 단열작업)	12
11완료사진_(사택 7-401 LED등기구 교체)	13
12완료사진_(사택 8-408 수장공사)	14
13완료사진_(사택 5-404 수장공사)	15
14완료사진_(사택 5-404 썬크대 상하부장 문짝교체)	16
15완료사진_(사택 5-404 불박이장 신설(고층))	17
16완료사진_(사택 9-406 썬크대 썬크볼 교체)	18
17완료사진_(기숙사 AB동 지하 주차장 천장 단열재 탈락보수)	19
18완료사진_(사택 5-402 수장공사)	20
19완료사진_(사택 5-402 썬크대 상하부장 문짝교체)	21
20완료사진_(사택 2-101 썬크대 상하부장 문짝교체)	22
21완료사진_(사택 9-105 안방 단열작업 및 부분도배)	23
22완료사진_(사택 8-210 썬크대 상하부장 문짝교체)	24
23완료사진_(사택 102-504 안방 단열재 들뜸보수)	25
24완료사진_(사택 102-506 세대내 고장 보일러 교체)	26
4월 체크시트_솔루션	27

기숙사 및 사택 4월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

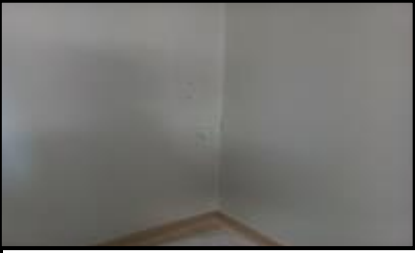
24-4-16

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요율)
					55,354,000	54,220,850	==>일성-일반(22 건)		-2%
					1,551,000	1,290,000	==>아트이엔지(1 건)		-20%
					868,000	847,100	==>대양이엔씨(1 건)		-2%
					57,773,000	56,357,950	4월 마감건(24 건)	- 1,415,050	-3%
1	04월30일	사택 9-501 안방 단열 및 뒤베란다 곰팡이제거 도장		2024-02-16	1,378,000	1,358,800	일성건축	- 19,200	-1%
2	04월30일	기숙사 A동 302-2호 도배보수외 10세대		2024-03-13	4,077,000	4,021,575	일성건축	- 55,425	-1%
3	04월30일	사택 2-104 수장공사		2024-03-25	3,623,000	3,559,325	일성건축	- 63,675	-2%
4	04월30일	사택 2-104 썬크대 상하부장 문짝교체		2024-03-12	1,059,000	1,018,025	일성건축	- 40,975	-4%
5	04월30일	사택 2-305 수장공사		2024-03-26	3,623,000	3,559,325	일성건축	- 63,675	-2%
6	04월30일	사택 5-205 수장공사		2024-03-25	4,460,000	4,384,925	일성건축	- 75,075	-2%
7	04월30일	사택 5-205 썬크대 상하부장 문짝교체		2024-03-07	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
8	04월30일	사택 5-301 수장공사		2024-03-21	4,460,000	4,384,925	일성건축	- 75,075	-2%
9	04월30일	사택 7-401 수장공사		2024-03-27	3,446,000	3,384,100	일성건축	- 61,900	-2%
10	04월30일	사택 7-401 외벽세대 단열작업		2024-03-26	3,965,000	3,885,050	일성건축	- 79,950	-2%
11	04월30일	사택 7-401 LED등기구 교체		2024-03-25	868,000	847,100	대양이엔씨	- 20,900	-2%
12	04월30일	사택 8-408 수장공사		2024-02-20	4,711,000	4,628,950	일성건축	- 82,050	-2%
13	04월30일	사택 5-404 수장공사		2024-03-08	4,460,000	4,384,925	일성건축	- 75,075	-2%
14	04월30일	사택 5-404 썬크대 상하부장 문짝교체		2024-03-08	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
15	04월30일	사택 5-404 불박이장 신설(고층)		2024-03-08	2,727,000	2,613,325	일성건축	- 113,675	-4%
16	04월30일	사택 9-406 썬크대 썬크볼 교체		2024-03-14	541,000	520,300	일성건축	- 20,700	-4%
17	04월30일	기숙사 AB동 지하 주차장 천장 단열재 탈락보수		2024-03-14	1,814,000	1,796,325	일성건축	- 17,675	-1%
18	04월30일	사택 5-402 수장공사		2024-03-26	4,460,000	4,384,925	일성건축	- 75,075	-2%
19	04월30일	사택 5-402 썬크대 상하부장 문짝교체		2024-03-27	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
20	04월30일	사택 2-101 썬크대 상하부장 문짝교체		2024-03-27	1,059,000	1,018,025	일성건축	- 40,975	-4%
21	04월30일	사택 9-105 안방 단열작업 및 부분도배		2024-03-20	888,000	872,900	일성건축	- 15,100	-2%
22	04월30일	사택 8-210 썬크대 상하부장 문짝교체		2024-03-27	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
23	04월30일	사택 102-504 안방 단열재 들뜸보수		2024-03-21	555,000	549,325	일성건축	- 5,675	-1%
24	04월30일	사택 102-506 세대내 고장 보일러 교체	기실적 기준으로 투입인원 2차 비용 내고	2024-03-28	1,551,000	1,290,000	아트이엔지	- 261,000	-20%

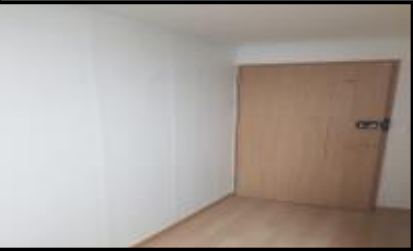
목 록

01완료사진_(사택 9-501 안방 단열 및 뒤베란다 곰팡이제거 도장).....	1
02완료사진_(기숙사 A동 302-2호 도배보수와 10세대).....	2
03완료사진_(사택 2-104 수장공사).....	3
04완료사진_(사택 2-104 썬크대 상하부장 문짝교체).....	4
05완료사진_(사택 2-305 수장공사).....	5
06완료사진_(사택 5-205 수장공사).....	6
07완료사진_(사택 5-205 썬크대 상하부장 문짝교체).....	7
08완료사진_(사택 5-301 수장공사).....	8
09완료사진_(사택 7-401 수장공사).....	9
10완료사진_(사택 7-401 외벽세대 단열작업).....	10
11완료사진_(사택 7-401 LED등기구 교체).....	11
12완료사진_(사택 8-408 수장공사).....	12
13완료사진_(사택 5-404 수장공사).....	13
14완료사진_(사택 5-404 썬크대 상하부장 문짝교체).....	14
15완료사진_(사택 5-404 불박이장 신설(고층)).....	15
16완료사진_(사택 9-406 썬크대 썬크볼 교체).....	16
17완료사진_(기숙사 AB동 지하 주차장 천장 단열재 탈락보수).....	17
18완료사진_(사택 5-402 수장공사).....	18
19완료사진_(사택 5-402 썬크대 상하부장 문짝교체).....	19
20완료사진_(사택 2-101 썬크대 상하부장 문짝교체).....	20
21완료사진_(사택 9-105 안방 단열작업 및 부분도배).....	21
22완료사진_(사택 8-210 썬크대 상하부장 문짝교체).....	22
23완료사진_(사택 102-504 안방 단열재 들뜸보수).....	23
24완료사진_(사택 102-506 세대내 고장 보일러 교체).....	24

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.2.16- 2024.02.16
공 사 명	사택 9-501 안방 단열 및 뒤베란다 곰팡이제거 도장		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용	도장(작업전)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.12- 2024.03.13
공 사 명	기숙사 A동 302-2호 도배보수외 10세대		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.08 - 2024.03.25
공 사 명	사택 2-104 수장공사		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.3.12- 2024.03.12
공 사 명	사택 2-104 싱크대 상하부장 문짝교체		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)			
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.04- 2024.03.26
공 사 명	사택 2-305 수장공사		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

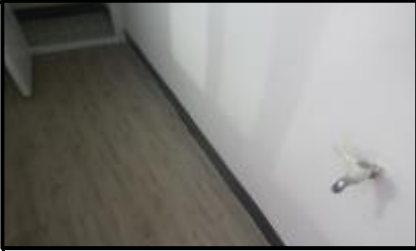
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.05- 2024.03.25
공 사 명	사택 5-205 수장공사		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.3.07- 2024.03.07
공 사 명	사택 5-205 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.07- 2024.03.21
공 사 명	사택 5-301 수장공사		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.04 - 2024.03.27
공 사 명	사택 7-401 수장공사		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

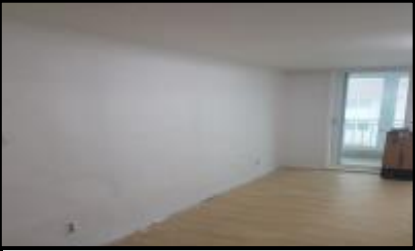
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.3.08- 2024.03.26
공 사 명	사택 7-401 외벽세대 단열작업		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	철거(작업후)
작업사진				
내 용	철거(작업후)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	재설치(작업후)
작업사진				
내 용	재설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

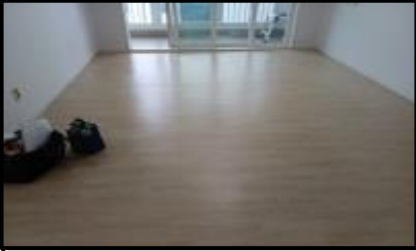
공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	03월 25일
공 사 명	사택 7-401 LED등기구 교체		제출일자	04월 16일
작업사진				
내 용	설치 위치	설치 위치	주방 LED 라인등	
작업사진				
내 용	방 및 거실 LED 사각등	LED등 설치 준비	LED등 설치	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.02.29 - 2024.03.21
공 사 명	사택 8-408 수장공사		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.02.28 - 2024.03.20
공 사 명	사택 5-404 수장공사		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.3.08- 2024.03.08
공 사 명	사택 5-404 싱크대 상하부장 문짝교체		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)			
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.3.08- 2024.03.08
공 사 명	사택 5-404 불박이장 신설(고층)		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)			
작업사진				
내 용	설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.3.14- 2024.03.14
공 사 명	사택 9-406 싱크대 싱크볼 교체		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.13 - 2024.03.14
공 사 명	기숙사 AB동 지하주차장 천장 단열재 탈락보수		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.14- 2024.03.26
공 사 명	사택 5-402 수장공사		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.3.27- 2024.03.27
공 사 명	사택 5-402 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.3.27- 2024.03.27
공 사 명	사택 2-101 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.3.20- 2024.03.20
공 사 명	사택 9-105 안방 단열작업 및 부분도배		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.3.27- 2024.03.27
공 사 명	사택 8-210 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.04.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.21- 2024.03.21
공 사 명	사택 102-504 안방 단열재 들뜸보수		제출일자	2024.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)	보수(작업후)	도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	03월 28일
공 사 명	사택 102-506 세대내 고장 보일러 교체		제출일자	2024/04/16
작업사진 (전)	 			
내 용	보일러 반입		보일러 반입	신규 보일러 사양
작업사진 (중)	 			
내 용	보일러 철거		철거 보일러 사양(단종)	각방제어 콘트롤러
작업사진 (후)	 			
내 용	보일러 교체 위치		보일러 교체 위치	

수장공사 체크리스트

5 동 402 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개)교체, 주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장포함)전체교체, 난방분배기 교체), 앞베란다 외부샤시 안쪽상부 크랙 실리콘코킹작업		○	○		☐ 설치상태 ☐ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 4 월 / 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

7 동 401 호 18평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찍힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	화장실(좌측방,우측방-2곳)불박이장뒤 벽체단열재시공, 화장실(좌측방, 우측방-2곳)방문바닥(패임)보수작업,뒤 베란다 벽체 전체 크랙보수(창고포함), 방충망-1개(앞베란다)교체, 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 4 월 / 일					
현장점검인		이광희 점검인(인)					
최종점검인		유지환 점검인(인)					

수장공사 체크리스트

5 동 205 호 24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다창고단열재시공, 뒤베란다 누수점검및보수, 방충망교체(7개), 싱크대(상부장,하부장)문짝전체교체, 난방분배기교체, 타일부분교체, 양변기내부크랙교체, 화장실문틀시트지포는교체, 문걸림보수(1개)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 3 월 27 일

현장점검인

이영희 점검인(인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

2 동 305 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞,뒤베란다탄성코트 부분보수, 주방걸레받이 보수또는 교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 3 월 29 일					
현장점검인		6/02/24 점검인 (인)					
최종점검인		점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

2 동 104 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	뒤베란다창틀누수점검및보수, 방충망교체(7개), 앞,뒤베란다 벽면전체크랙보수, 싱크대(상부장,하부장)문짝전체교체, 화장실문짝파손및뒤틀림교체(화장실문턱백시멘트 보수작업포함),화장실거울교체, 화장실수납장교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 3 월 27 일					
현장점검인		이영희 점검인 (인)					
최종점검인		점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

5 동 301 호 24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	앞베란다우수관주변누수점검및보수, 내부샤시교체,방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체,안방불박이장교체, 주방(싱크대상하문짝교체,타일부분교체,난방분배기교체, 화장실수납장교체, 화장실거울교체, 화장실벽타일부분교체,문골림-4개		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 3 월 22 일

현장점검인

이정원 점검인 (인)

최종점검인

이정원 점검인 (인)

수장공사 체크리스트

5 동 404 호 24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 안방불박이장교체, 주방(싱크대(상부장,하부장))문짝전체교체, 난방분배기교체, 타일부분교체, 화장실문테두리물딩전체교체, 문걸림-1개,		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 3 월 22 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

8 동 408 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개)교체, 주방(싱크대(상부장,하부장)문짝전체교체, 타일부분교체, 난방분배기교체), 문골림-1개(뒤베란다창고문), 뒤베란다창문시트지제거		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 3 월 22 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)
