

콘텐츠

12월 마감자료 목록_솔루션	4
12월 완료사진_솔루션	3
01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차)	5
02완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-5차)	6
03완료사진_(기숙사 및 사택 자동제어 DDC 납품)	8
감지_납품 전후 사진대지	8
납품전_AB동	9
납품전_AB동	10
납품후_AB동	11
납품전_3동	12
납품후_3동	13
납품전_101동-104동	14
납품후_101동-104동	15
납품전_관제점(관리소)	16
납품후_관제점(관리소)	17
04완료사진_(기숙사 AB동 EHP용 중앙 제어기 교체)	18
감지_AB동 중앙제어기 교체	18
교체전후_AB동 중앙제어기 교체	19
화면_AB동 중앙제어기 교체	20
05완료사진_(사택 1동-2동 사이 낭떠러지 안전헨스 구매납품(54M))	21
06완료사진_(사택 1동-2동 사이 낭떠러지 안전헨스 교체(54M))	22
07완료사진_(사택 1동 후면 낭떠러지 안전헨스 구매납품(68M))	23
08완료사진_(사택 1동 후면 낭떠러지 안전헨스 교체(68M))	24
09완료사진_(기숙사 AB동 부스터펌프 인버터교체 및 개선(개별))	25
10완료사진_(사택 어린이집 LED등 천장속 보강)	26
11완료사진_(사택 어린이집 전열교환기 취출구 천장속 보강)	27
12완료사진_(사택 102동 부스터펌프 인버터교체 및 개선(개별))	28
13완료사진_(기숙사 AB동 전면부 외벽 훼손 도장 보수)	29
14완료사진_(사택 5-203 누수 난방분배기 및 빨래 건조대 교체)	30
15완료사진_(사택 5-203 불박이장 신설(고층장비))	31
16완료사진_(사택 5-203 수장공사)	32
17완료사진_(사택 5-203 씽크대 상하부장 문짝교체)	33
18완료사진_(기숙사 3동 입주세대 EHP 중앙제어기 설치)	34
감지_3동 중앙제어기 신설	34
지하 MDF실 ACP 설치_3동 중앙제어기 신설	35
실외기 랜선포설_3동 중앙제어기 신설	36
실외기 통신보드_3동 중앙제어기 신설	37
19완료사진_(사택 2동 현관문 외풍 감소재 설치 및 스톤코트 보수)	38
20완료사진_(사택 101동 3-4 라인 승강기 하부 피트 누수보수)	39
21완료사진_(사택 5-401 수장공사)	40
22완료사진_(사택 5-401 씽크대 문짝 및 하부장 부분 교체)	41
23완료사진_(사택 5-401 누수 난방분배기 교체)	42
24완료사진_(사택 8-410 씽크대 상하부장 문짝교체)	43
25완료사진_(사택 1동-2동 재활용 분리수거장 전면 주차장 라인 변경)	44
26완료사진_(기숙사 A동 304-3호외 4세대 도배 및 기타보수)	45
27완료사진_(사택 1동-2동 재활용 분리장 설치)	46
28완료사진_(사택 102-401 세대내 고장 보일러 교체)	47
12월 체크시트(관리소)_솔루션	48
01기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차	48
02기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-5차	49
03기숙사 및 사택 자동제어 DDC 납품	50

04기숙사 AB동 EHP용 중앙 제어기 교체.....	50
05사택 1동-2동 사이 낭떠러지 안전휀스 구매납품(54M).....	52
06사택 1동-2동 사이 낭떠러지 안전휀스 교체(54M).....	53
07사택 1동 후면 낭떠러지 안전휀스 구매납품(68M).....	54
08사택 1동 후면 낭떠러지 안전휀스 교체(68M).....	55
09기숙사 AB동 부스터펌프 인버터교체 및 개선(개별).....	56
10사택 어린이집 LED등 천장속 보강.....	57
11사택 어린이집 전열교환기 취출구 천장속 보강.....	58
12사택 102동 부스터펌프 인버터교체 및 개선(개별).....	59
13기숙사 AB동 전면부 외벽 훼손 도장 보수.....	60
14사택 5-203 누수 난방분배기 및 빨래 건조대 교체.....	61
15사택 5-203 불박이장 신설(고층장비).....	62
16사택 5-203 수장공사.....	63
17사택 5-203 씽크대 상하부장 문짝교체.....	64
18기숙사 3동 입주세대 EHP 중앙제어기 설치.....	65
19사택 2동 현관문 외풍 감소재 설치 및 스톤코트 보수.....	66
20사택 101동 3-4 라인 승강기 하부 피트 누수보수.....	67
21사택 5-401 수장공사.....	68
22사택 5-401 씽크대 문짝 및 하부장 부분 교체.....	69
23사택 5-401 누수 난방분배기 교체.....	70
24사택 8-410 씽크대 상하부장 문짝교체.....	71
25사택 1동-2동 재활용 분리수거장 전면 주차장 라인 변경.....	72
26기숙사 A동 304-3호외 4세대 도배 및 기타보수.....	73
27사택 1동-2동 재활용 분리장 설치.....	74
28사택 102-401 세대내 고장 보일러 교체.....	75


콘텐츠

01	완료사진_	(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차)	2
02	완료사진_	(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-5차)	3
03	완료사진_	(기숙사 및 사택 자동제어 DDC 납품)	5
	감지_	납품 전후 사진대지	5
	납품전_	AB동	6
	납품전_	AB동	7
	납품후_	AB동	8
	납품전_	3동	9
	납품후_	3동	10
	납품전_	101동 - 104동	11
	납품후_	101동 - 104동	12
	납품전_	관제점(관리소)	13
	납품후_	관제점(관리소)	14
04	완료사진_	(기숙사 AB동 EHP용 중앙 제어기 교체)	15
	감지_	AB동 중앙제어기 교체	15
	교체전후_	AB동 중앙제어기 교체	16
	화면_	AB동 중앙제어기 교체	17
05	완료사진_	(사택 1동-2동 사이 낭떠러지 안전휀스 구매납품(54M))	18
06	완료사진_	(사택 1동-2동 사이 낭떠러지 안전휀스 교체(54M))	19
07	완료사진_	(사택 1동 후면 낭떠러지 안전휀스 구매납품(68M))	20
08	완료사진_	(사택 1동 후면 낭떠러지 안전휀스 교체(68M))	21
09	완료사진_	(기숙사 AB동 부스터펌프 인버터교체 및 개선(개별))	22
10	완료사진_	(사택 어린이집 LED등 천장속 보강)	23
11	완료사진_	(사택 어린이집 전열교환기 취출구 천장속 보강)	24
12	완료사진_	(사택 102동 부스터펌프 인버터교체 및 개선(개별))	25
13	완료사진_	(기숙사 AB동 전면부 외벽 훼손 도장 보수)	26
14	완료사진_	(사택 5-203 누수 난방분배기 및 빨래 건조대 교체)	27
15	완료사진_	(사택 5-203 불박이장 신설(고층장비))	28
16	완료사진_	(사택 5-203 수장공사)	29
17	완료사진_	(사택 5-203 씽크대 상하부장 문짝교체)	30
18	완료사진_	(기숙사 3동 입주세대 EHP 중앙제어기 설치)	31
	감지_	3동 중앙제어기 신설	31
	지하_	MDF실 ACP 설치 3동 중앙제어기 신설	32
	실외기	랜선포설 3동 중앙제어기 신설	33
	실외기	통신보드 3동 중앙제어기 신설	34
19	완료사진_	(사택 2동 현관문 외풍 감소재 설치 및 스톤코트 보수)	35
20	완료사진_	(사택 101동 3-4 라인 승강기 하부 피트 누수보수)	36
21	완료사진_	(사택 5-401 수장공사)	37
22	완료사진_	(사택 5-401 씽크대 문짝 및 하부장 부분 교체)	38
23	완료사진_	(사택 5-401 누수 난방분배기 교체)	39
24	완료사진_	(사택 8-410 씽크대 상하부장 문짝교체)	40
25	완료사진_	(사택 1동-2동 재활용 분리수거장 전면 주차장 라인 변경)	41
26	완료사진_	(기숙사 A동 304-3호외 4세대 도배 및 기타보수)	42
27	완료사진_	(사택 1동-2동 재활용 분리장 설치)	43
28	완료사진_	(사택 102-401 세대내 고장 보일러 교체)	44

기숙사 및 사택 12월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	비용 구분	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	시공사	B-A (차액)	A/B (요일)
				시공사별 분리		63,197,000	61,527,625	==>일성-일반(15 건)		-3%
						2,935,950	2,908,950	==>대양이앤씨(1 건)		-1%
						37,350,000	35,475,000	==>LG전자(1 건)		-5%
						13,886,000	12,824,750	==>디앤와이(2 건)		-8%
						7,274,000	6,468,490	==>하이엠솔루텍(1 건)		-11%
					47,821,000	42,833,375	==>아트이앤지(7 건)		-10%	
				투자 및 수선 분리	수선성 (22 건)	93,959,000	89,738,850	수장 작업 및 기타 보수		
					투자성 (6 건)	87,447,000	76,427,985			
					합계	181,406,000	166,166,835	12월 마감건(27 건)	- 15,144,315	-9%
0	N/A	12월31일	사택 2-207 세대내 비품 반출 및 폐기 처리	Cell선행.기획팀 PR 발행분	2024-12-13	1,484,000	1,432,975	일성건축	- 51,025	-3%
1	수선	12월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차		2024-12-13	4,827,000	4,732,150	일성건축	- 94,850	-2%
2	수선	12월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-5차	감액후(매입:7,599,000 / PO:8,168,925) 감액전(매입:8,432,000 / PO:9,064,400)	2024-12-13	9,505,000	8,168,925	아트이앤지	- 1,336,075	-14%
3	투자	12월31일	기숙사 및 사택 자동제어 DDC 납품		2024-12-13	37,350,000	35,475,000	LG전자	- 1,875,000	-5%
4	투자	12월31일	기숙사 AB동 EHP용 중앙 제어기 교체	견적 금액 재 협의	2024-12-13	7,274,000	6,468,490	하이엠솔루텍	- 805,510	-11%
5	수선	12월31일	사택 1동-2동 사이 낭떠러지 안전헨스 구매납품(54M)		2024-11-08	6,169,000	5,697,500	디앤와이	- 471,500	-8%
6	수선	12월31일	사택 1동-2동 사이 낭떠러지 안전헨스 교체(54M)		2024-11-08	9,657,000	9,471,825	일성건축	- 185,175	-2%
7	수선	12월31일	사택 1동 후면 낭떠러지 안전헨스 구매납품(68M)		2024-11-08	7,717,000	7,127,250	디앤와이	- 589,750	-8%
8	수선	12월31일	사택 1동 후면 낭떠러지 안전헨스 교체(68M)		2024-11-08	10,008,000	9,805,075	일성건축	- 202,925	-2%
9	투자	12월31일	기숙사 AB동 부스터펌프 인버터교체 및 개선(개별)	견적 금액 재 협의	2024-11-30	16,371,000	14,491,000	아트이앤지	- 1,880,000	-11%
10	수선	12월31일	사택 어린이집 LED등 천장속 보강		2024-11-30	2,935,000	2,908,950	대양이앤씨	- 26,050	-1%
11	수선	12월31일	사택 어린이집 전열교환기 취출구 천장속 보강		2024-11-30	3,094,000	3,048,700	아트이앤지	- 45,300	-1%
12	투자	12월31일	사택 102동 부스터펌프 인버터교체 및 개선(개별)	견적 금액 재 협의	2024-11-30	16,132,000	14,537,225	아트이앤지	- 1,594,775	-10%
13	수선	12월31일	기숙사 AB동 전면부 외벽 훼손 도장 보수		2024-11-18	4,315,000	4,101,125	일성건축	- 213,875	-5%
14	수선	12월31일	사택 5-203 누수 난방분배기 및 빨래 건조대 교체	견적 금액 재 협의	2024-11-30	730,000	656,825	아트이앤지	- 73,175	-10%
15	수선	12월31일	사택 5-203 불박이장 신설(고층장비)		2024-11-25	3,161,000	3,014,300	일성건축	- 146,700	-5%
16	수선	12월31일	사택 5-203 수장공사		2024-12-03	4,993,000	4,892,325	일성건축	- 100,675	-2%
17	수선	12월31일	사택 5-203 씽크대 상하부장 문짝교체		2024-11-25	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
18	투자	12월31일	기숙사 3동 입주세대 EHP 중앙제어기 설치	광통신 개설 취소에 따른 감액 견적 접수후 변경 계약후 비용 변경 예정	2024-12-13	8,943,000	4,128,645		- 4,814,355	-54%
19	수선	12월31일	사택 2동 현관문 외풍 감소제 설치 및 스톤코트 보수		2024-12-06	4,960,000	4,919,200	일성건축	- 40,800	-1%
20	수선	12월31일	사택 101동 3-4 라인 승강기 하부 피트 누수보수		2024-12-04	2,262,000	2,239,225	일성건축	- 22,775	-1%
21	수선	12월31일	사택 5-401 수장공사		2024-12-13	4,876,000	4,785,900	일성건축	- 90,100	-2%
22	수선	12월31일	사택 5-401 씽크대 문짝 및 하부장 부분 교체		2024-12-06	1,222,000	1,173,900	일성건축	- 48,100	-4%
23	수선	12월31일	사택 5-401 누수 난방분배기 교체		2024-12-11	612,000	603,075	아트이앤지	- 8,925	-1%
24	수선	12월31일	사택 8-410 씽크대 상하부장 문짝교체		2024-12-06	1,012,000	973,950	일성건축	- 38,050	-4%
25	수선	12월31일	사택 1동-2동 재활용 분리수거장 전면 주차장 라인 변경		2024-12-13	632,000	624,575	일성건축	- 7,425	-1%
26	수선	12월31일	기숙사 A동 304-3호외 4세대 도배 및 기타보수		2024-12-13	2,616,000	2,574,625	일성건축	- 41,375	-2%
27	수선	12월31일	사택 1동-2동 재활용 분리장 설치		2024-12-13	7,644,000	7,245,500	일성건축	- 398,500	-5%
28	투자	12월31일	사택 102-401 세대내 고장 보일러 교체		2024-12-13	1,377,000	1,327,625	아트이앤지	- 49,375	-4%

공사 완료 보고서

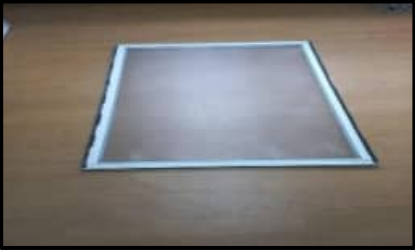업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.02- 2024.12.13
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 보수 작업(건축)-7차	제출일자	2024.12.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진			
내 용	보수(작업후)	보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)		
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	10월 04일
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	제출일자	2024/10/25
작업사진 (전)			
내 용	9동203호 렌지후드교체 작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후


공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	2024-10-23,24
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	제출일자	2024/10/25
작업사진 (전)			
내 용	기숙사3동 급수배관교체 작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

LGES 기숙사 및 사택 자동제어 DDC 납품 시공 전,후 사진대지



1. 시공 전 - AB동

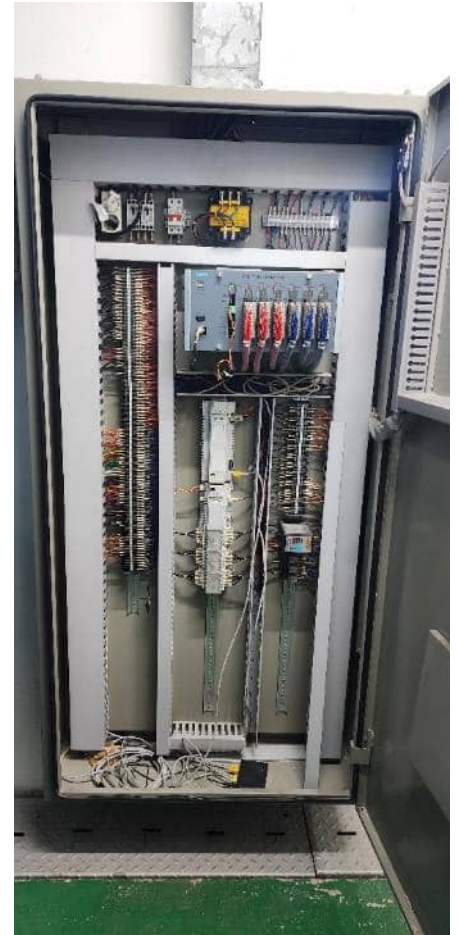


1. 시공 전 - AB동



2. 시공 후 - AB동



3. 시공 전 - 3동

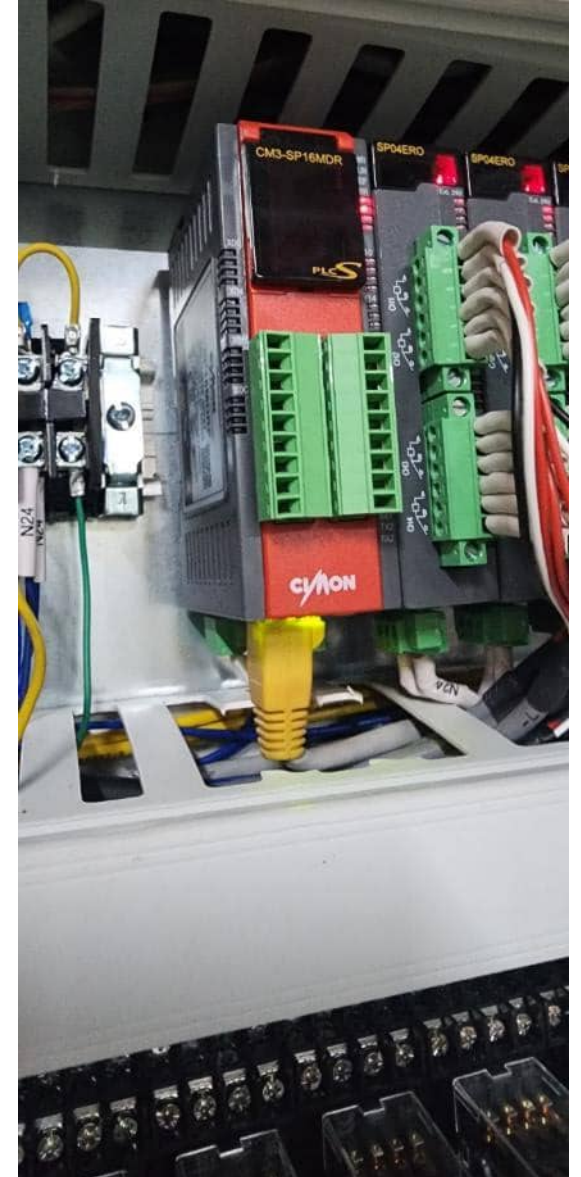

3. 시공 후 - 3동




3. 시공 전 - 101~104동



3. 시공 후 - 101~104동



4. 시공 전 - 자동제어 시스템

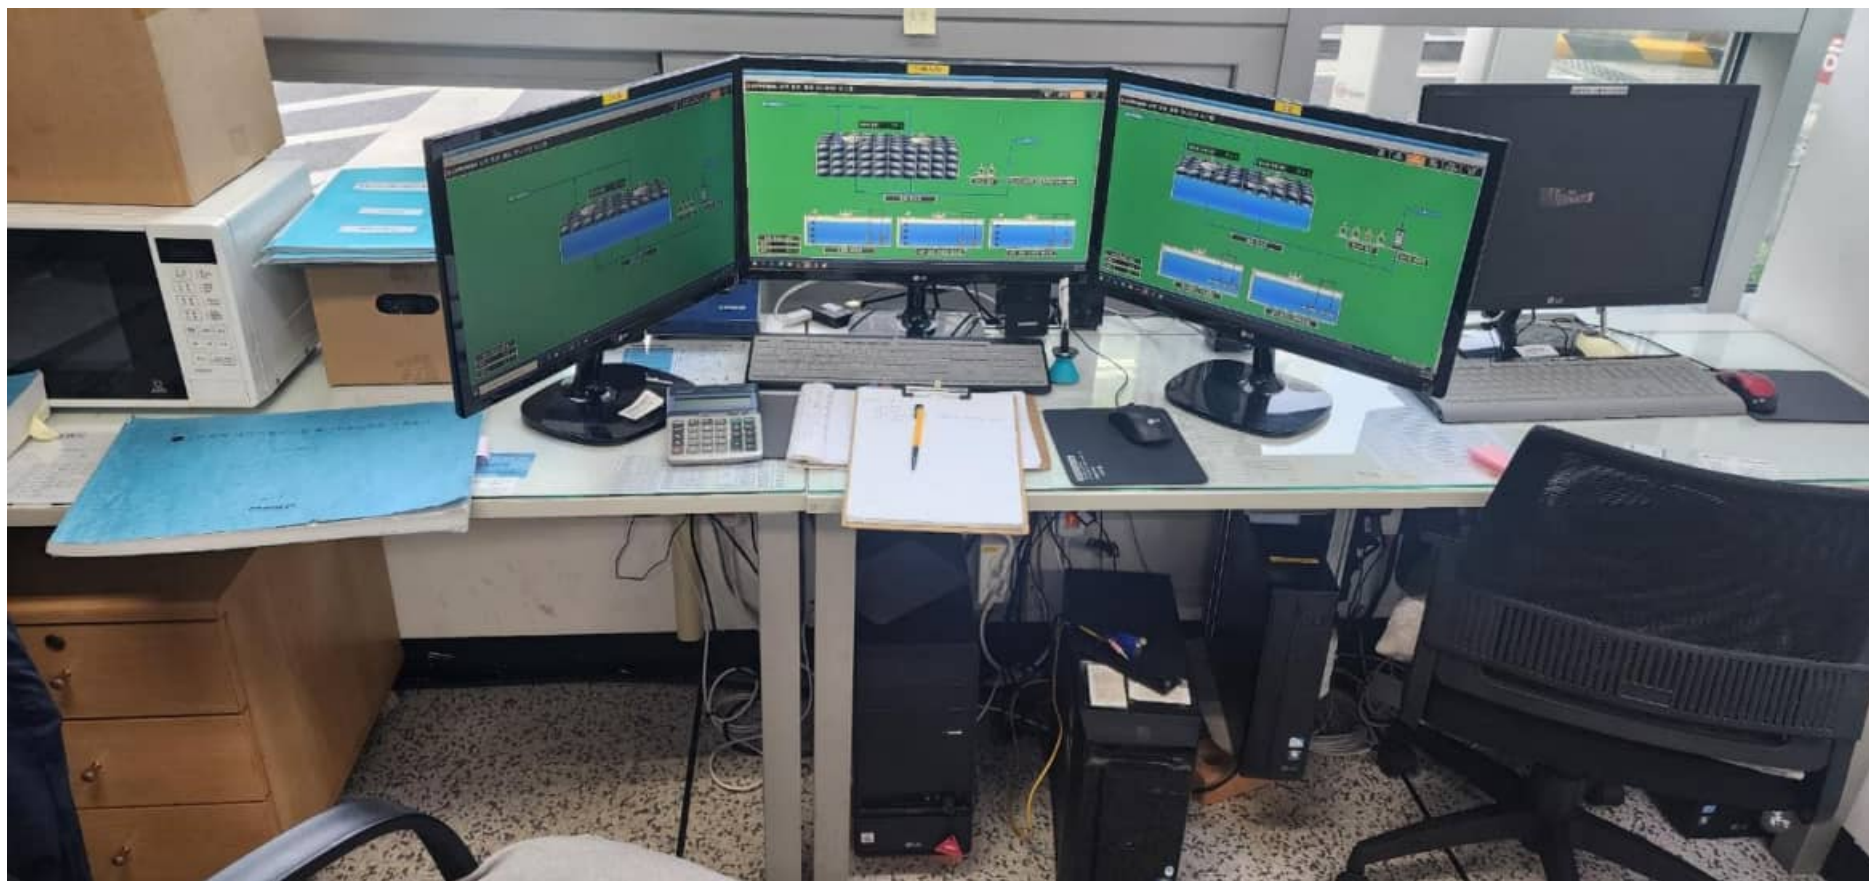

4. 시공 후 - 자동제어 시스템



기술연구원 사택 AB동 ACP 교체



LG전자
에어컨·냉장고·세탁기

하이-엠솔루텍




ACP 교체 비교사진



ACP 부착사진



A동 중앙제어 프로그램 사진

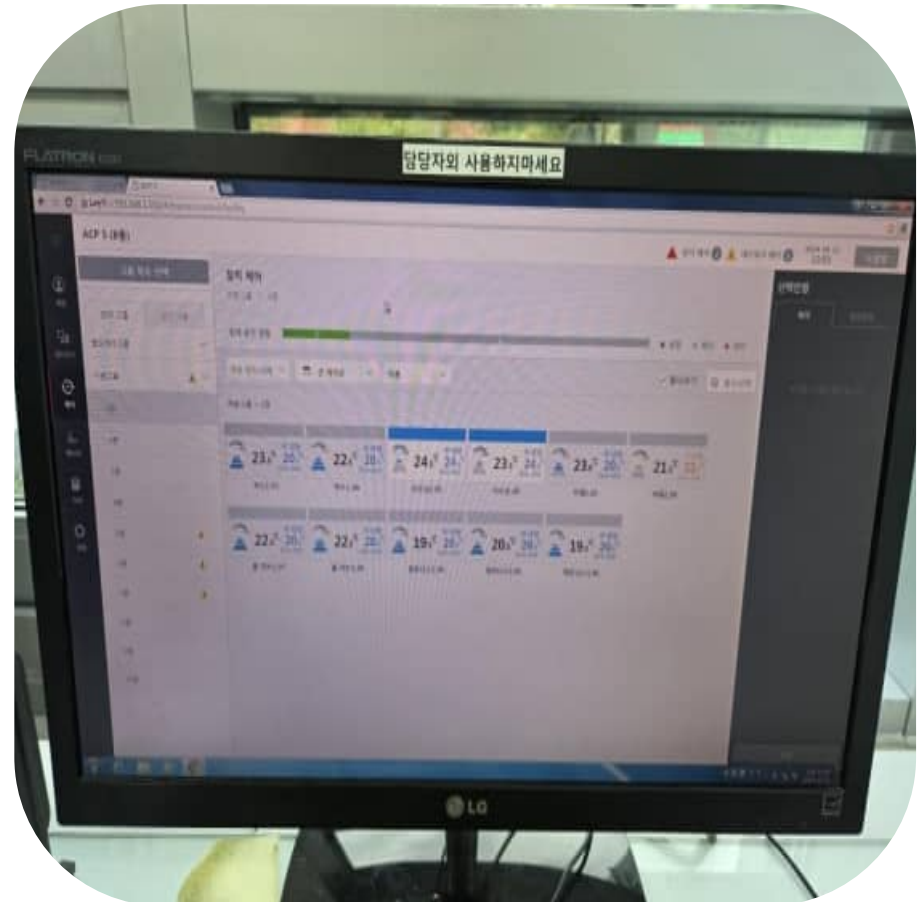

B동 중앙제어 프로그램 사진

공사 완료 보고서

업 체 명	디앤와이		공사일자	
공 사 명	사택 1동-2동 사이 낭떠러지 안전휰스 구매납품(54M)		제출일자	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용	자재 절단		휰스 용접	
작업사진				
내 용	휰스 반입		휰스 하차	
작업사진				
내 용	휰스 검수		휰스 적재	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.10.23- 2024.11.08
공 사 명	사택 1동-2동 사이 낭떠러지 안전휰스 교체(54M)		제출일자	2024.12.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	디앤와이		공사일자	
공 사 명	사택 1동 후면 낭떠러지 안전웬스 구매납품(68M)		제출일자	
작업사진				
내 용	자재 절단		웬스 용접	완성품 포장
작업사진				
내 용	웬스 반입		웬스 하차	웬스 하차
작업사진				
내 용	웬스 검수		웬스 적재	웬스 부속 반입
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.11.11- 2024.11.20
공 사 명	사택 1동 후면 낭떠러지 안전휰스 교체(68M)		제출일자	2024.12.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	11월 26일
공 사 명	기숙사 AB동 부스터펌프 인버터교체 및 개선(개별)		제출일자	2024/12/25
작업사진 (전)				
내 용	작업 전	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)				
내 용	작업 중	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)				
내 용	작업 후	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2024년
공 사 명	사택 어린이집 LED등 천장속 보강		제출일자	2024년 12월16일
작업사진				
내 용	등기구 철거	등기구 철거	등기구 철거	
작업사진				
내 용	등기구 철거	등기구 보강작업	등기구 보강작업	
작업사진				
내 용	등기구 보강작업	타공작업	보강 완료	
작업사진				
내 용	타공작업	타공작업	타공작업	
작업사진				
내 용	보강 완료	보강 완료	보강 완료	

공사 완료 사진

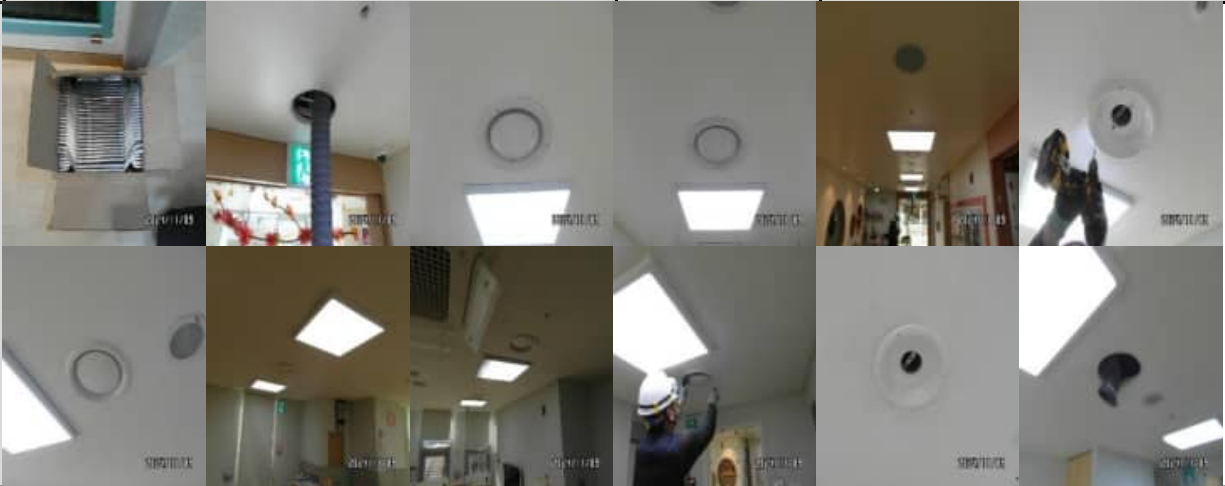업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	2024-11-09,10		
공 사 명	사택 어린이집 전열교환기 취출구 천장속 보강		제출일자	2024/12/25		
작업사진 (전)						
	작업 전		작업 전		작업 전	
작업사진 (중)						
	작업 중		작업 중		작업 중	
작업사진 (후)						
	작업 후		작업 후		작업 후	


공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	11월 26일		
공 사 명	사택 102동 부스터펌프 인버터교체 및 개선(개별)		제출일자	2024/12/25		
작업사진 (전)						
	작업 전		작업 전		작업 전	
작업사진 (중)						
	작업 중		작업 중		작업 중	
작업사진 (후)						
	작업 후		작업 후		작업 후	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.11.14- 2024.11.18
공 사 명	기숙사 AB동 전면부 외벽 훼손 도장 보수		제출일자	2024.12.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

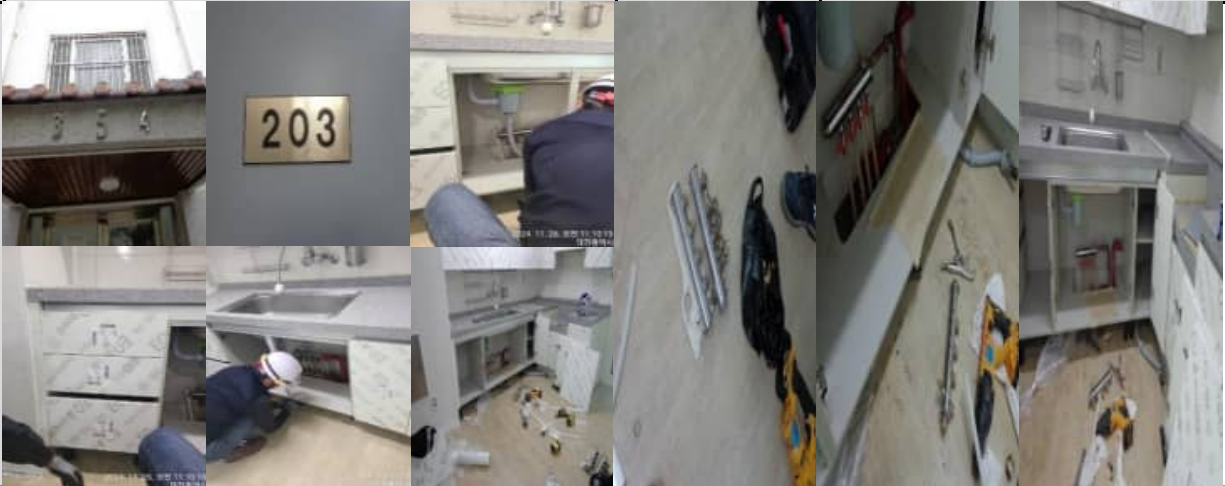업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	11월 26일	
공 사 명	사택 5-203 누수 난방분배기 및 빨래 건조대 교체		제출일자	2024/12/25	
작업사진 (전)					
	작업 전		작업 전		작업 전
작업사진 (중)					
	작업 중		작업 중		작업 중
작업사진 (후)					
	작업 후		작업 후		작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.11.25 - 2024.11.25
공 사 명	사택 5-203 불박이장 신설(고층장비)	제출일자	2024.12.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.11.18- 2024.12.03
공 사 명	사택 5-203 수장공사		제출일자	2024.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.11.25- 2024.11.25
공 사 명	사택 5-203 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.12.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

기술연구원 사택 3동 ACP 설치




LG전자
패인퍼먼스 & 서비스


하이-엠솔루텍



ACP 설치 사진

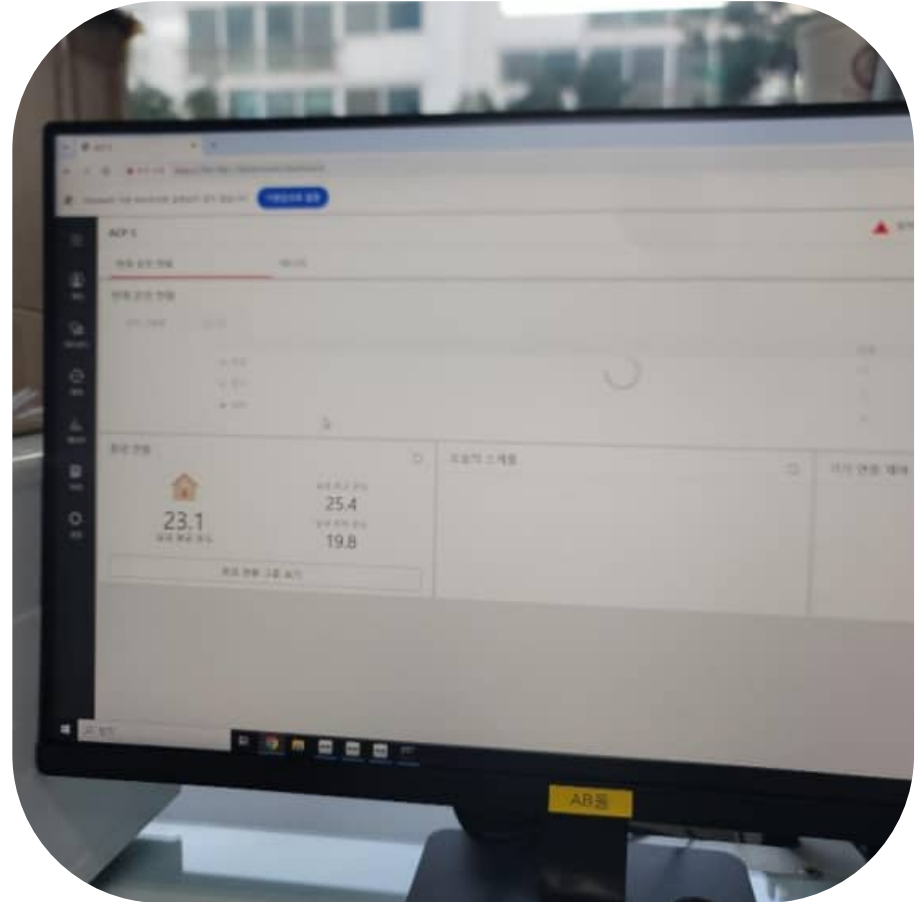

중앙제어 프로그램 사진

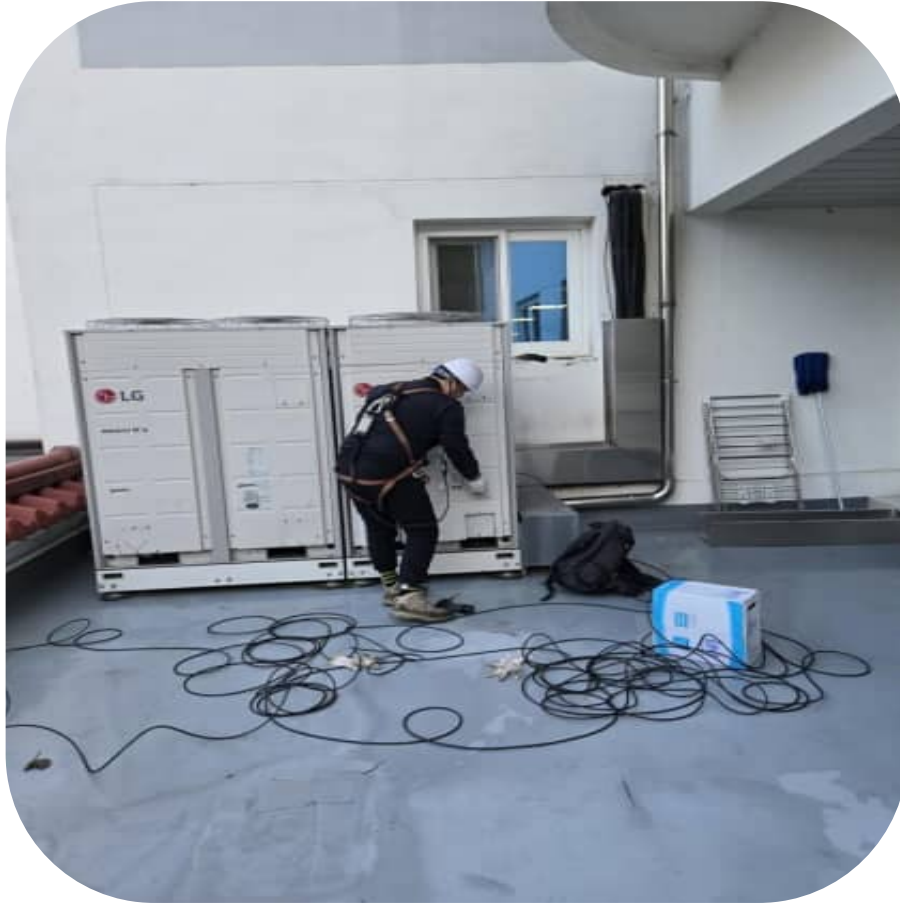


실외기 통신선 작업



실외기 통신선 작업



실외기 통신보드 작업

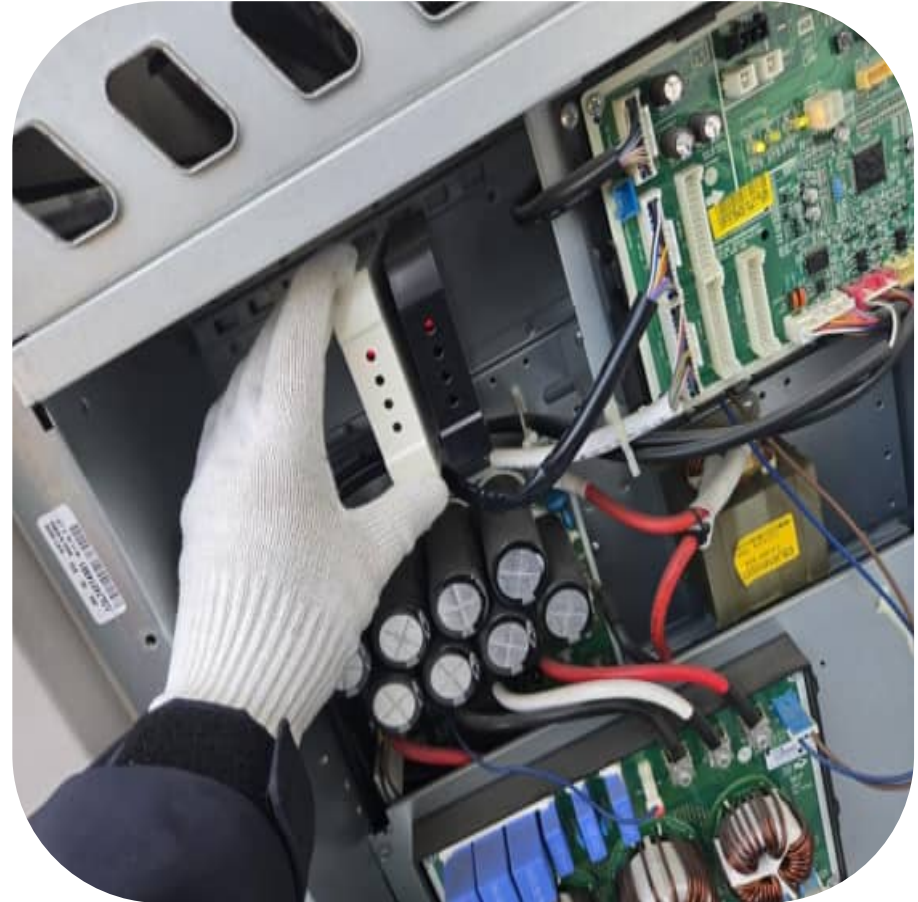

실외기 통신보드 작업

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.11.21- 2024.11.25
공 사 명	사택 2동 현관문 외풍 감소재 설치 및 스톤코트 보수		제출일자	2024.12.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		감소재 설치(작업전)	
작업사진				
내 용	감소재 설치(작업후)		감소재 설치(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.03- 2024.12.04
공 사 명	사택 101동 3-4라인 승강기 하부 피트 누수보수	제출일자	2024.12.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.12.02- 2024.12.13
공 사 명	사택 5-401 수장공사		제출일자	2024.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.12.06- 2024.12.06
공 사 명	사택 5-401 싱크대 문짝 및 하부장 부분 교체		제출일자	2024.12.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)			
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	12월 10일
공 사 명	사택 5-401 누수 난방분배기 교체	제출일자	2024/12/25
작업사진 (전)			
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.06- 2024.12.06
공 사 명	사택 8-410 싱크대 상하부장 문짝교체	제출일자	2024.12.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.12.03- 2024.12.05
공 사 명	아택 1-2동 재활용 분리수거장 전면 주차장 라인 변경		제출일자	2024.12.20
작업사진				
내 용	변경(작업전)			
작업사진				
내 용	변경(작업후)		제거(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2024.12.03- 2024.12.12
공 사 명	기숙사 A동 304-3호외 4세대 도배 및 기타보수	제출일자	2024.12.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도장(작업전)	교체(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도장(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)		
작업사진			
내 용	보수(작업후)		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.12.02- 2024.12.12
공 사 명	사택 1-2동 재활용 분리장 설치		제출일자	2024.12.20
작업사진				
내 용	기초(작업전)		기초(작업중)	
작업사진				
내 용	기초(작업중)		기초(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	2024-12.13
공 사 명	사택 102-401 세대내 고장 보일러 교체		제출일자	2024/12/25
작업사진 (전)				
내 용	작업 전	작업 전	작업 전	
작업사진 (중)	 	 	 	
내 용	작업 중	작업 중	작업 중	
작업사진 (후)				
내 용	작업 후	작업 후	작업 후	

설비 긴급보수(5차) 체크리스트

공사명	설비 긴급보수					공사업체	아트
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 항의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 11 월 26 일						
현장점검인	김맹옥 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	기숙사 및 사택 자동제어 DDC 납품					공사업체	LG전자
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		□				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		●				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		□				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 11 월 19 일						
현장점검인	김맹옥 점검인(인)						
최종점검인	노해원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	1동 후면 남띠러지 안전헬스 구매납품					공사업체	디엔와이
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공약품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024년 10월 23일						
현장점검인	김맹주 점검인 (인)						
최종점검인	노해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	AB동 전면부 외벽 훼손 도장 보수					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024년 11월 18일						
현장점검인	이정희 점검인						
최종점검인	노래원 점검인						

수장공사 체크리스트

5 동 203 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개)교체, 안방불박이장교체, 주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,아래서랍장위 찬넬(1개), 물딩포함)전체교체, 난방분배기교체), 발래건조대 교체, 신발장 시트지 교체		○	○		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 12 월 4 일

현장점검인

점검인 (인)

최종점검인

점검인 (인)

수장공사 체크리스트

5 동 401 호 24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체,주방(싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩,가스렌지대 옆판(2개)포함)전체교체, 난방분배기 교체, 화장실 문틀 물딩 전체 교체(시트지 노후로 인한 훼손), 문걸림-1개(뒤베란다 창고문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 12 월 12 일

현장점검인

이정희

점검인

최종점검인

노재우

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	5-401 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공سا품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024 년 12 월 12 일						
현장점검인	이정현 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	8-410 씽크대 상하부장 문짝교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		*				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		*				
	공사현장 정리/정돈		*				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		*				
	공사 전중후 형의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2024 년 11 월 15 일						
현장점검인	이정현 점검인 (인)						
최종점검인	박희진 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	A-304-3외 4세대 도배 및 기타보수 (h-504-3, h-901-1, B-902-4, B-1001-2)					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 함의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2024 년 12 월 12 일						
현장점검인	이정희 점검인 김민						
최종점검인	김이원 점검인 김민						

