

기숙사 및 사택 12월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					10,645,000	10,355,475	==>일성-일반(3 건)	-3%
					10,237,000	4,957,900	==>동운(1 건)	-106%
					20,882,000	15,313,375	11월 마감건(4 건)	-36%
1	12월31일	사택 9-106 수장공사	도배,도색(벽-거실,방3곳), 도배(천정-거실, 방3곳), 앞,뒤베란다 전부,장판(거실,방3곳) 방화문 내부,수도계량기함), 화장실 좌측 방문끌림, 빨래 건조대 교체	2022-11-14	4,986,000	4,823,525	일성건축	-3%
2	12월31일	사택 9-106 싱크대 교체(저층)	주방 노후 싱크대 철거 작업 신규 싱크대 반입 및 설치 작업	2022-11-07	3,609,000	3,548,575	일성건축	-2%
3	12월31일	사택 9-106 앞뒤 베란다 다용도실 단열작업	앞베란다 창고(2곳)곰팡이 제거 단열재 및 이보드 설치 작업	2022-11-18	2,050,000	1,983,375	일성건축	-3%
4	12월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	■ 긴급누수 대응후 12월말에 변경 - 변경전 (낙찰 8,922,000원/PO 9,591,150원) - 변경후 (낙찰 4,612,000원/PO 4,957,900 원)	2022-11-30	10,237,000	4,957,900	동운	-106%
	4-1	사택 5-105 누수탐지 및 보수						
	4-2	사택 9-102 누수탐지 및 보수						
	4-3	사택 9-101 누수탐지 및 보수						
	4-4	사택 9-106 누수탐지 및 보수						
	4-5	사택 5-206 누수탐지 및 보수						
	4-6	사택 5-204(104호) 천장속 오수배관 누수보수						
	4-7	사택 9동 5-6라인 지하층 음식물처리기용 급수 누수 보수						
	4-8	기숙사 A동 301-4호 베란다 누수 우수관 보수						

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.25 - 2022.11.04
공 사 명	사택 9-106 수장공사		제출일자	2022.12.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	건조대(작업전)			
작업사진				
내 용	건조대(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.18- 2022.11.07
공 사 명	사택 9-106 싱크대 교체(저층)		제출일자	2022.12.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	타일(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.10.17- 2022.10.18
공 사 명	사택 9-106 앞뒤 베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2022.12.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	목재틀설치(작업중)		단열재(부착중)	
작업사진				
내 용	이보드(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

긴급누수 보수 현황 (사택 관리소 관리목록_접수분)

공사건수	일자	호실	점검유무	보수위치	보수내용	보수시간	보수업체	보수인원	비고
01	22.02.09	5-105	누수탐지 O	화장실 세면대 아래 온수배관	세면대 아래 온수배관 T자배관부위 용접 보수	09:00~15:05	동운(미래설비)	1	5-106호 화장실 임시사용
02	22.02.21	9-102	누수탐지 O	주방 싱크대 밑 온수배관	싱크대 아래 온수배관 T자배관부위 용접	09:30~14:00	동운(미래설비)	1	
	22.04.12	8-501	누수탐지 O	없음	누수점검만 했으며 누수되지 않아 미보수	09:00~11:00	동운(미래설비)	1	PR 발행후 비용처리 완료
	22.05.02	9-306	x		분배기 교체 및 입수전 설치	09:00~17:00	동운	2	PR 발행후 비용처리 완료
	22.05.02	101-1.2라인	x	지하주차장 오수 배관	지하주차장 오수 배관 교체	09:00~17:00	동운	2	PR 발행후 비용처리 완료
03	22.05.02	A301-4호	x	베란다 우수관	베란다 우수관 상부 고무 패킹 교체	09:00~17:00	동운	1	
04	22.05.04	9-101호	누수탐지 O	화장실 앞 온수 배관	화장실 앞 온수 배관 보수	09:00~17:00	동운(미래설비)	1	
05	22.05.06	9-106호	누수탐지 O	거실 주방쪽 온수배관	거실 주방쪽 온수 배관 보수	09:00~17:00	동운(미래설비)	1	
06	22.05.31	5-206	누수탐지 O	주방과거실사이	주방~거실사이 온수배관 엘보교체(미래)	09:30~11:30	동운(미래설비)	1	
07	22.07.27	5-204	x	화장실	거실 화장실 양변기 편심 교체후 재설치		동운	2	5-104호 화장실 천장배관누수건
08	22.11.15	9동 지하	x	9동 5,6라인 지하	9동 5,6라인 지하 음식물처리기 급수배관 엘보우 누수로 배관 보수	13:30~14:30	동운	2	

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.02.29
공 사 명	사택 5동 105호 누수탐지 및 보수		제출일자	2022.05.07
작업사진				
내 용	누수부위 확인 작업 전		누수부위 확인 및 용접 작업	작업 완료후 기압테스트
작업사진				
내 용	시멘트 몰탈 작업		타일 작업	위생도기 설치 작업
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022-02-21
공 사 명	사택 9동 102호 누수탐지 및 보수		제출일자	2022-02-21
작업사진				
내 용	사택 9동 102호 누수탐지	사택 9동 102호 누수탐지	누수탐지 중	
작업사진				
내 용	누수탐지 중	바닥 철거	바닥 철거	
작업사진				
내 용	누수탐지 완료	누수 보수중	누수 보수 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022-02-21
공 사 명	사택 9동 102호 누수탐지 및 보수	제출일자	2022-02-21
작업사진			
내 용	압 테스트	압 테스트	압테스트 및 체크완료
작업사진			
내 용	몰탈 복원	복원완료	
작업사진			
내 용			

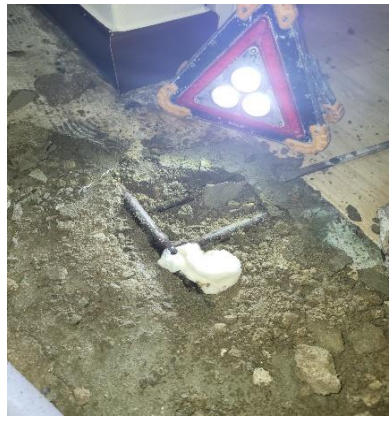
공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022-05-02
공 사 명	기숙사 A동 301-4호 긴급누수 보수	제출일자	2022-05-30
작업사진			
내 용	누수점검	누수점검	기존 가스켓 분리
작업사진			
내 용	기존 및 신규 가스켓	가스켓 교체중	가스켓 교체후
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.05.04
공 사 명	사택 9동 101호 누수탐지 및 보수	제출일자	2022.05.04
작업사진			
내 용	작업을 위한 보양 작업	누수 탐지 작업	누수 부위 확인
작업사진			
내 용	누수 부위 확인	배관 보수 작업	기압테스트-이상무
작업사진			
내 용	시멘트 몰탈 작업	타일 보수 작업	

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.05.06
공 사 명	사택 9동 106호 누수탐지 및 보수		제출일자	2022.05.06
작업사진				
내 용	작업 위치		누수 탐지 작업	누수 탐지 작업
작업사진				
내 용	누수 부위 확인		누수 부위 확인	배관 보수 완료
작업사진				
내 용	시멘트 몰탈 작업		시멘트 몰탈 완료	

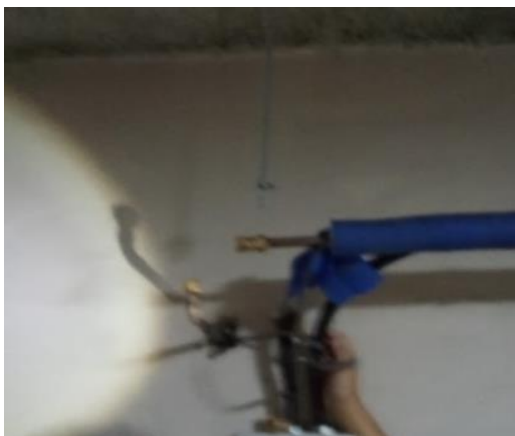

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.05.31
공 사 명	사택 5-206 긴급누수 보수		제출일자	2022.05.31
작업사진				
				
내 용	오수 배관 누수 확인	누수 위치 탐지	배관 부분 교체 및 보호카바 설치	
작업사진				
				
내 용	배관 교체 완료	보수 작업 완료		
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.12.02
공 사 명	사택 5동 204호 누수탐지 및 보수	제출일자	2022.12.02
작업사진			
내 용	오수 배관 누수 확인	누수 위치 작업 전	변기 탈거 및 배관 철거
작업사진			
내 용	배관 교체 완료	보수 작업 완료	
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.11.15
공 사 명	사택 9동 5-6라인 음식물처리기용 누수 급수배관 보수		제출일자	2022.11.30
작업사진				
				
내 용	급수배관 누수 부분	급수배관 누수 보수 중	급수배관 누수 보수 후	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

수장 공사 체크 리스트								
품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-106호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m'	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40	✓	✓			
5.기타	주방(싱크대교체,수전배관이설, 난방분배기교체, 타일교체),화장실좌측방문걸림,앞베란다창고(2곳)단열재시공, 앞베란다 빨래건조대 교체			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							
