

기숙사 및 사택 10월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

23-10-25

[illegible]

기숙사 및 사택 특별방역 진행 현황 ('23년 상반기), 6월28일~29일

■ 바퀴벌레 살충 방역 (세대내)

전체 완료 812 세대 95.3%	호실기준 (세대)				상태기준 (세대)			
	입주사		건물동		공실		입주	
	솔루션	화학	기숙사	사택	기숙사	사택	사택	기숙사
	666	186	543	309	238	65	244	305
	0	0	<=민원 852		303		549	

진행현황 (입주사 기준)				진행현황 (건물동 기준)			
솔루션		화학		기숙사		사택	
완료	미완료	미완료	완료	완료	미완료	미완료	완료
633	33	7	179	543	0	40	269
95.0% 완료		96.2% 완료		100.0% 완료		87.1% 완료	

■ 코로나 및 살충 방역 (다중시설 및 공용) : 라운지, 체력단련실,관리소,우편수발실,카페,휴게실,용역원실, 화장실,경비실, 기계실(살충)

■ 특이 사항: 104동 202호: 방역거부 (화학) => 세스코 개인 계약 세대 , 트랩 400장 확보 (관리소 이관 예정)=> 하반기 예정 5일간 6인씩 (10월16일 ~ 20일)

◎조회(1일 33인, 2일 16인)◎

◎패드,기피제 설치(세대내)◎

◎코로나방역(다중시설,공용)◎

◎바퀴벌레 포획 (트랩 교체)◎

[입주민 요청], 6/29 설치분

◎진행현황 및 이슈 취합◎

기숙사 및 사택 특별방역 진행 현황 ('23년 하반기), 10월16일~20일_5일간

■ 바퀴벌레 살충 방역 (세대내)

전체 완료 787 세대 92.4%	호실기준 (세대)				상태기준 (세대)			
	입주사		건물동		공실		입주	
	솔루션	화학	기숙사	사택	기숙사	사택	사택	기숙사
	666	186	543	309	237	65	244	306
	0	0	<=민원 852		302		550	

진행현황 (입주사 기준)				진행현황 (건물동 기준)			
솔루션		화학		기숙사		사택	
완료	미완료	미완료	완료	완료	미완료	미완료	완료
614	32	13	173	543	0	45	244
92.2% 완료		93.0% 완료		100.0% 완료		79.0% 완료	

■ 코로나 및 살충 방역(다중시설 및 공용) : AB동 공동구내(살충), 라운지, 체력단련실,관리소,우편수발실,카페,휴게실,용역원실, 화장실,경비실,

■ 특이 사항 : 103동 404호: 방역거부 (솔루션) => 트랩 하반기 600장 및 상반기 확보 잔여분 (관리소 이관 예정)

◎조회(1일~5일->5인)◎



◎패드,기피제 설치(세대내)◎



◎코로나방역(공동구/다중시설)◎



◎바퀴벌레 포획 (트랩 교체)◎



◎진행현황 및 이슈 취합◎



발신자: "김규환(Gyuhwan Kim)[sisopapa8286]" <sisopapa8286@lgensol.com>
보낸 날짜: 2023-10-23 09:17:10(LMT), 2023-10-23 00:17:10 (GMT)
수신: 성경호(Kyungho Sung)[khsung] <khsung@lgensol.com> 외 3명
제목: '23년 하반기 사택/기숙사 세스코 방역 결과 공유 件

안녕하세요? 하기와 같이 '23년 하반기 사택/기숙사 세스코 방역 결과 공유 드립니다.

'23년 상반기 대비 전체 세대(호실)수에서는 완료를 차이가 없으나, 상반기 대비 신축보다는 구축의 완료가 저조 하였습니다.

향후 추가 요청 세대(미실시 세대 요청) 발생 시 대응으로는

- ① 관리사무소에서 세스코 패치를 세대 내 설치(소독은 소독액 세스코 측에서 제공 불가로 지원 불가)
- ② 상기 방법으로 해결 안될 시 선일기업을 통한 추가 소독을 실시 할 예정 입니다.

구분	기숙사		구사택							신축사택	계
	A · B동	3동	1동	2동	5동	6동	7동	8동	9동	101동~104동	
세대 수	398	145	32	32	30	24	40	44	30	76	851
소독 완료 세대	398	145	27	27	25	21	33	40	24	68	808
완료율	100.0%	100.0%	84.4%	84.4%	83.3%	87.5%	82.5%	90.9%	80.0%	89.5%	94.9%
'23년 상반기	100.0%	100.0%	84.4%	75.0%	83.3%	95.8%	85.0%	93.2%	90.0%	84.2%	94.9%
직전 비교(P%)	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%	0.0%	-8.3%	-2.5%	-2.3%	-10.0%	5.3%	0.0%
※ 어린이집 完											

감사합니다.

해충방제서비스 완료확인서

1. 용역(건) 명 : 해충방제서비스, 전문살균서비스(공용구획)
2. 계 약 금 액 : (년간금액) 일금 일천칠백팔만일천원 정(₩ 1,7081,000) - 비과세품목 (월간금액) 일금 팔백오십사만오백원 정(₩ 8,540,500) - 비과세품목
3. 계 약 기 간 : 2023년 11월 07일 ~ 2023년 11월 30일까지 (2회_6월,10월)
4. 시 행 일 자 : 2023년 06월 28일,29일
5. 용 역 업 체 : ㈜세스코
6. 확 인 자 : (주)에스앤아이엠퍼트-LG에너지솔루션사원아파트 -이종근-
7. 시행확인 및 검수 : 별첨 참조
— 위 용역(건) 대하여 발주 및 계약서에 준하여 시행되었음을 확인하여 드리며 2023년 06월 29일 <제출자> 주 소 : 서울시 강동구 상일로10길 46(상일동) 상 호 : ㈜세스코 대표자 : 전 찬 혁 
참고의견(확인자용)
첨 부 1. 사업자등록증사본 1부. 2.서비스점검사진대지, 23년 06월 소득증명서 각 1부.



사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 212-81-05946

법인명(단체명) : (주) 세스코

대표자 : 전찬혁

개업연월일 : 1977년 01월 01일 법인등록번호 : 110111-0201163

사업장소재지 : 서울특별시 강동구 상일로10길 46(상일동)

본점소재지 : 서울특별시 강동구 상일로10길 46(상일동)

사업의종류 : **업태** 서비스 (사업관
제조
도소매
도소매
소매
운수업
부동산

종목 소독및구충, 시스템방제, 환경위생
독극물, 쥐약, 살충제
가전제품
위생용품
전자상거래
주차장 운영업
임대

발급사유 : 대표자변경

(별지 출력)

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여(✓) 부() (적용일자: 2015년 01월 01일)


전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2017년 03월 21일

강동세무서장



NTS 국세청



제 02306-JI156 호

소 독 증 명 서

대 상	상 호(명칭)	(주)에스앤아이엠퍼트-LG 에너지솔루션사원아파트	실시면적(용적)	56,499.00	(㎡)
	소 재 지	대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20(도룡동, LG화학사원아파트) 관리실			
	시 설	관리(운영)자 확 인	직 위 대표		
성 명 형원준 (인)					
소독기간	2023 년 06 월 28 일 ~ 2023 년 06 월 29 일				
소 독 내 용	종 류	살충			
	약품사용내역	세빅스에이지100엔트겔(히드라메틸논) 144.00 g 세빅스씨지201로취겔(피프로닐) 240.00 g 세빅스씨지202로취겔(피프로닐) 300.00 g 세록스 씨투폼에어로솔 25.00 EA 세빅스씨지211로취겔(피프로닐) 240.00 g 세빅스에이지300엔트겔(이미다클로프리드) 135.00 g 세빅스씨지290로취페이스트(피프로닐) 470.00 EA			

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제 54 조제 1항 및 같은 법 시행규칙 제 40조 제 2항에 따라 위와 같이 소독을 실시하였음을 증명합니다.

2023 년 06 월 29 일

소독실시자 상호(명칭)

CESCO 주식회사 **세스코**

소 재 지

대전북부지사
대전광역시 서구 유등로17번길 55(북수동) 4층

대 표 이 사

전 찬 혁



제 202306 호

소 독 증 명 서

대 상 시 설	상 호(명칭)	(주)에스앤아이엣스퍼트-LG 에너지솔루션사원아파트	실시면적(용적)	56,499.00	(㎡)
	소 재 지	대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20(도룡동, LG화학사원아파트) 관리실			
	관리(운영)자 확 인	직 위 대표 성 명 형원준 (인)			
소독기간	2023 년 06 월 28 일 ~ 2023 년 06 월 29 일				
소 독 내 용	종 류	살충			
	약품사용내역	세빅스씨지291로취페이스트(피프로닐)			50.00 봉
		세빅스에이알200엔트그래놀(피프로닐)			150.00 g
		세빅스씨알200로취그래놀(피프로닐)			3,950.00 g
		M-트랩 CS			6,200.00 EA

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제 54 조제 1항 및 같은 법 시행규칙 제 40조 제 2항에 따라 위와 같이 소독을 실시하였음을 증명합니다.

2023 년 06 월 29 일

소독실시자 상호(명칭)

CESCO 주식회사 세스코

소 재 지 대전북부지사
대전광역시 서구 유등로17번길 55(복수동) 4층

대 표 이 사

전 찬 혁



■ 사업장 개요

사업장명	(주)에스앤아이엠퍼트-LG 에너지솔루션사원아파트	사업장관리번호(고객코드)	JI1561
업태	아파트 / 기숙사	작업내용	소독, 구충 및 방제서비스
관리감독자	허원기 지부장	안전보건관리책임자	허원기
참여자	허원기 지부장 포함 총 20명		

구분	일정	비고
작업 기간	2023년 10월 16일 ~ 10월 20일	-

서비스	제공내역
구서 방제 (쥐)	건물 주변 쥐 서식처 모니터링 및 물리 / 화학적 방제 (쥐굴 파괴/외곽 분말형 약제 및 블럭약제 투약) 모니터링 방제 서비스 진행 간 쥐 발생 가능 장소 및 유입가능 구획에 대한 시설보완 필요 시 이를 고객사에 보고
구충 방제 (바퀴,개미)	1. 정기관리 : M-Trap 설치(사무실 등 바퀴발생 가능 지역) 바퀴 및 개미 발생 여부 모니터링 하여 발생 시 퇴치 관리 실시(베이트 약제 처리 진행) 2. 퇴치관리 : 바퀴 및 개미 발생 시 바퀴 및 개미의 종류 / 발생 장소 및 환경에 따라 방제공법 선택하여 고객사와 협의하여 약제투약 및 방제 서비스 진행

해충 감소대책 및 조치결과

공정 분류 : 일반 방제서비스

구획	유해위험요인 파악		대책 및 조치결과		비고	
	대상해충	세부 유해위험요인	대책 및 조치결과	작업사진	조치일자	
세대 작업	바퀴/개미서비스	분포현황을 파악하여 보행해충이 번식, 확산되기 전에 관리한다.	육안 및 모니터링트랩을 통한 해충동정 및 위험도 파악	 	23.10.16 ~ 23.10.20	
		2. Monitoring시스템에 의한 관리를 통해 바퀴의 분포도 및 위치를 신속히 파악하고 모든 약제와 작업을 이용하여 신속히 해결하여 청결 유지하도록 관리한다.	집기 선반 / 베란다 주변 내부 약제처리 진행	 	23.10.16 ~ 23.10.20	
로비 /라운지	세균/바이러스 서비스	건물 통로, 화장실등에서 발생할 수 있는 그 밖의 기타 해충과 세균 등은 잔유분무를 실시하여 구제토록 한다.	건물 통로 및 화장실 잔유분무를 실시하여 세균증식을 억제하고 살균 처리하여 전염병의 발생을 막는다.	 	23.10.16 ~ 23.10.20	

해충 감소대책 및 조치결과

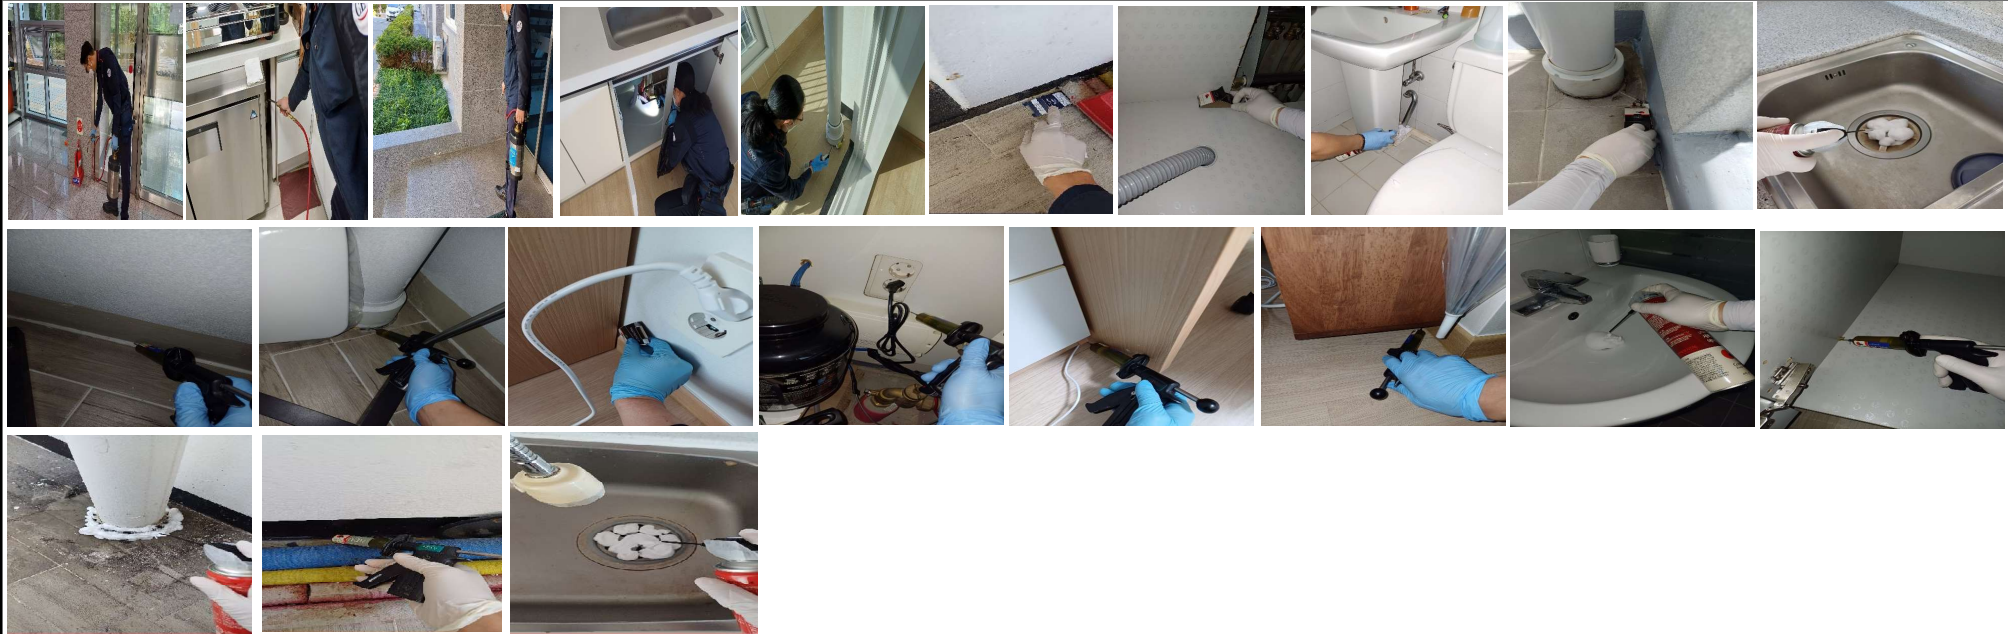
공정 분류 : 일반 방제서비스

구획	유해위험요인 파악		대책 및 조치결과		비고	
	대상해충	세부 유해위험요인	대책 및 조치결과	작업사진	조치일자	
건물외곽 / 화단	외곽바퀴서비스	외곽 화단지역 및 집수구에서 유입되는 바퀴를 구제하기 위하여 먹이 약제를 이용한 방제서비스를 진행한 다.	건물 외곽 화단 지역 및 배수로 주변 바퀴 먹이약제 투약.	 	23.10.16 ~ 23.10.20	
		주변 지역에서 발생되는 쥐를 100% 구제하기는 어려우나 세스코 구서 3 단계 시스템을 실시하여 외곽 화단 및 유희지의 서식처를 관리하여 개 체수를 감소한다	화단 및 유희지의 서식처를 확인하고 살서 제를 처리한다.	 	23.10.16 ~ 23.10.20	
기타시설	구서서비스	주요전선이 분포 되어 있는 전기실 과 기타지역에는 독먹이제로 쥐를 유인하는 효과가 있으므로 R-Trap 을 쥐의 침입로에 '설치하여 구제한 다	기계실 전시실 구서트랩 설치 진행하여 화 재 및 확산을 방지한다.	 	23.10.16 ~ 23.10.20	

사 진 대 지 (해충포획 사진)



사 진 대 지 (작업 사진_세대 공통)



사 진 대 지 (기타구역 사진_공용구역)





사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 212-81-05946

법인명(단체명) : (주) 세스코

대표자 : 전찬혁

개업연월일 : 1977년 01월 01일 법인등록번호 : 110111-0201163

사업장소재지 : 서울특별시 강동구 상일로10길 46(상일동)

본점소재지 : 서울특별시 강동구 상일로10길 46(상일동)

사업의종류 : ☒업태 서비스 (사업관
제조
도소매
도소매
소매
운수업
부동산

☐종목 소독및구충, 시스템방제, 환경위생
독극물, 쥐약, 살충제
가전제품
위생용품
전자상거래
주차장 운영업
임대

발급사유 : 대표자변경

(별지 출력)

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여(✓) 부() (적용일자: 2015년 01월 01일)


전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2017년 03월 21일

강동세무서장



NTS 국세청



제 02310-J1156 호

소 독 증 명 서

대 상

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제 54 조제 1항 및 같은 법 시행규칙 제 40조 제 2항에 따라 위와 같이 소독을 실시하였음을 증명합니다.

2023 년 10 월 31 일

소독실시자 상호(명칭)

CESCO 주식회사 세스코

소 재 지 대전북부지부
대전광역시 서구 유등로17번길 55(복수동) 4층

대 표 이 사 전 찬 혁



제 202310 호

소 독 증 명 서

대 상 시 설	상 호(명칭)	(주)에스앤아이엠퍼트-LG 에너지솔루션사원아파트	실시면적(용적)	56,499.00	(㎡)
	소 재 지	대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20(도룡동, LG화학사원아파트) 관리실			
	관리(운영)자 확 인	직 위 대표 성 명 형원준 (인)			
소독기간	2023 년 10 월 01 일 ~ 2023 년 10 월 31 일				
소 독 내 용	종 류	살충 살서 살균			
	약품사용내역	세빅스씨알200로취그래놀(피프로닐) 450.00 g M-트랩 CS 1,750.00 EA 바이오파워액 10.00 ml			

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제 54 조제 1항 및 같은 법 시행규칙 제 40조 제 2항에 따라 위와 같이 소독을 실시하였음을 증명합니다.

2023 년 10 월 31 일

소독실시자 상호(명칭)

CESCO 주식회사 세스코

소 재 지 대전북부지부
대전광역시 서구 유등로17번길 55(복수동) 4층

대 표 이 사


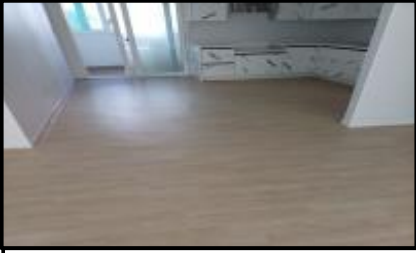
전 찬 혁



해충방제서비스 완료확인서

1. 용역(건) 명 : 해충방제서비스, 전문살균서비스(공용구획)
2. 계 약 금 액 : (년간금액) 일금 일천칠백팔만일천원 정(₩ 1,7081,000) - 비과세품목 (월간금액) 일금 팔백오십사만오백원 정(₩ 8,540,500) - 비과세품목
3. 계 약 기 간 : 2022년 11월 07일 ~ 2023년 11월 30일까지 (2회_6월,10월)
4. 시 행 일 자 : 2023년 10월 16일~20일 (5일간)
5. 용 역 업 체 : ㈜세스코
6. 확 인 자 : (주)에스앤아이엣스퍼트-LG에너지솔루션사원아파트 -이종근-
7. 시행확인 및 검수 : 별첨 참조
— 위 용역(건) 대하여 발주 및 계약서에 준하여 시행되었음을 확인하여 드립니다. 2023년 10월 20일 <제출자> 주 소 : 서울시 강동구 상일로10길 46(상일동) 상 호 : ㈜세스코 대표자 : 전 찬 혁  인)
참고의견(확인자용)
첨 부 1. 사업자등록증사본 1부. 2. 서비스점검사진대지, 23년 10월 소득증명서 각 1부.

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.09.19 - 2023.10.11
공 사 명	사택 5-304 수장공사		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

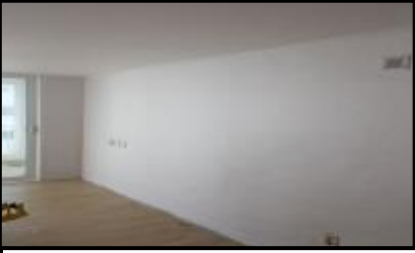
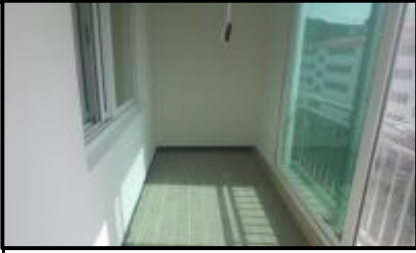
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.09.21 - 2023.10.18
공 사 명	사택 8-108 수장공사		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

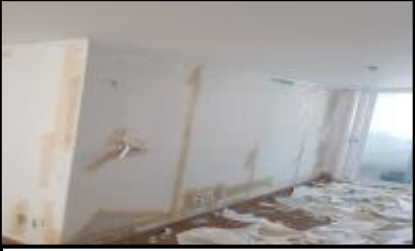
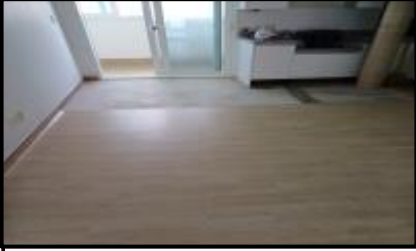
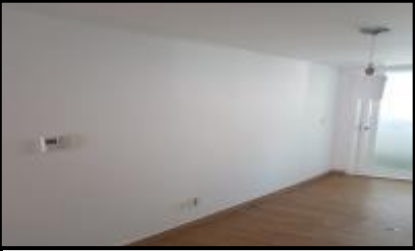
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.09.20 - 2023.10.11
공 사 명	사택 8-202 수장공사		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

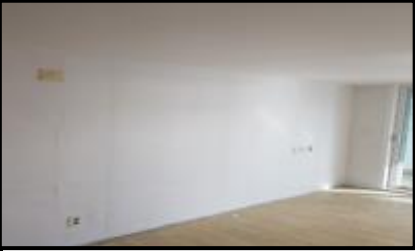
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.09.22 - 2023.10.18
공 사 명	사택 8-406 수장공사		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.09 - 2023.08.24
공 사 명	사택 8-502 수장공사		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.04 - 2023.10.20
공 사 명	사택 8-505 수장공사		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.10- 2023.10.13
공 사 명	사택 101동 주차장 바닥 에폭시라이닝 부분보수		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

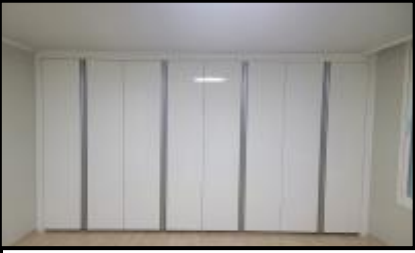
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.10 - 2023.10.13
공 사 명	사택 2동 후면 및 단지내 외벽 도장 보수		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.08.09- 2023.09.14
공 사 명	사택 5-304 싱크대 교체(고층)	제출일자	2023.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.09.08- 2023.09.08
공 사 명	사택 8-108 불박이장 신설(저층)	제출일자	2023.10.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.08.22- 2023.09.08
공 사 명	사택 8-108 싱크대 교체(저층)	제출일자	2023.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.08.10- 2023.09.05
공 사 명	사택 8-202 싱크대 교체(고층장비)	제출일자	2023.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.08.23- 2023.09.07
공 사 명	사택 8-406 싱크대 교체(고층장비)	제출일자	2023.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.09.07- 2023.09.07
공 사 명	사택 8-406 불박이장 신설(고층)	제출일자	2023.10.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.09.06- 2023.09.06
공 사 명	사택 8-505 불박이장 신설(고층)	제출일자	2023.10.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.08.23- 2023.09.06
공 사 명	사택 8-505 싱크대 교체(고층장비)	제출일자	2023.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.12 - 2023.10.19	
공 사 명	기숙사 AB동 옥상 옥상 바닥 보수		제출일자	2023.10.20	
작업사진					
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)		보수(작업중)
작업사진					
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)		보수(작업중)
작업사진					
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)		보수(작업후)
작업사진					
내 용	크랙보수(작업전)		크랙보수(작업중)		크랙보수(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.18- 2023.10.20
공 사 명	기숙사 3동 421호 소음개선작업(벽 전체도배)		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2023년
공 사 명	사택 5동 경비실 주차관제 수동 전원 스위치		제출일자	2023년
작업사진				
내 용	케이블 포설	케이블 포설	케이블 포설	
작업사진				
내 용	케이블 포설	케이블 포설	케이블 포설	
작업사진				
내 용	케이블 포설	수동스위치 설치	주차 차단기 장비 결선	
작업사진				
내 용	주차 차단기 장비 결선			

공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2023년
공 사 명	기숙사 3동 전기실 공통접지 보강 작업		제출일자	2023년
작업사진				
내 용	터파기 작업	케이블 포설	케이블 포설	
작업사진				
내 용	케이블 포설	케이블 포설	단자함 설치	
작업사진				
내 용	케이블 포설	전선관 배관	단자 결선작업	
작업사진				
내 용	작업완료	작업완료	접지저항 측정	

< 기숙사3동1층 아람누리 휴게실 냉난방기 설치 >

아래와 같이 공사내용을 보고 합니다.

1. 벽걸이형 냉난방기 설치 전 후



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.09.09- 2023.09.10
공 사 명	사택 어린이집 환경개선 2차(건축)		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

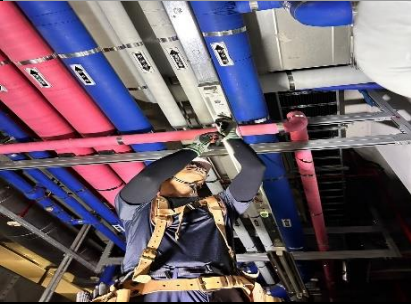
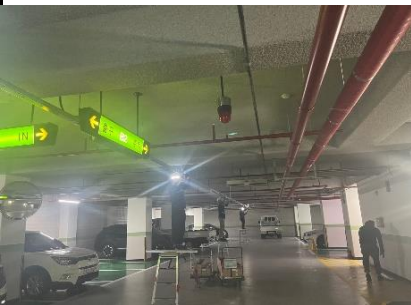
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.10.12- 2023.10.12
공 사 명	사택 8동 지하 주차장 입구측 보행로 설치	제출일자	2023.10.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	(주)서울방재전문기술단	공사일자	2023.10.05
공 사 명	[ESPR:92686111]기숙사 AB동 공동현관 자동문 화재연동 개선	제출일자	10월 16일
작업사진			
내 용	공동현관 화재연동 개선 전	공동현관 화재연동 개선 중	공동현관 화재연동 개선 후


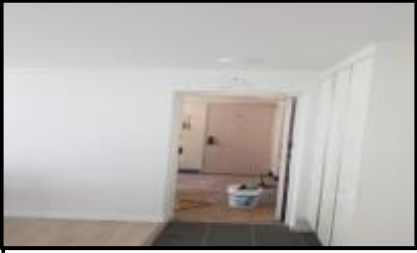
공사 완료 사진

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2023년
공 사 명	기숙사 AB동 지하 주차장 LED등 교체		제출일자	2023년
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체	전등교체	
작업사진				
내 용	전등교체	전등교체		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.19 - 2023.10.19
공 사 명	기숙사 AB동 현관도어 힌지교체		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.10.10- 2023.10.10
공 사 명	임차사택 수장공사 송수빈(기술고문)		제출일자	2023.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-304호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	38	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	25	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	12	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	25	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	13	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	10	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45	✓	✓			
5.기타	앞베란다 우수관주변 누수확인 및 보수, 방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개)), 주방(싱크대교체,수전배관이설,난방분배기교체,타일교체)신발장 시트지교체,문 걸림-3곳(화장실좌측방,화장시우측방,현관앞방문),뒤베란다 창문시트지제거, 앞,뒤베란다 냉,온수 수전배관(3개)교체			✓				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.10.18							
공사 담당	SNI : 이종근 (인) 23.10.18							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-108호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타	앞베란다바닥누수확인 및 보수,현관앞방창문쪽 벽면(석고보드)보수 또는 재시공, 방충망-4곳(뒤베란다(4곳)교체, 안방불박이장설치, 주방(싱크대교체,수전배관이설,난방분배기교체,타일교체),문골림-3곳(현관앞방문, 앞,뒤베란다 창고문(2곳))			✓				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.10.18)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-202호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타	방충망-7곳(앞베란다(3곳),뒤베란다(4곳)교체, 주방(싱크대교체,수전배관이설, 난방분배기교체,타일교체),문골림-1곳 (화장실우측방)			✓				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.10.18							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-406호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타	방충망-7곳(앞베란다(3곳),뒤베란다(4곳))교체, 안방불박이장설치,주방(싱크대 교체,수전배관이설,난방분배기교체, 타일교체), 신발장시트지교체, 빨래건조대교체,문골림-2곳(화장실좌측방,현관앞방문)			✓				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.10.18)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-502호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓	✓			
5.기타	화장실좌측방 천정누수확인 및 보수, 방충망-7곳(앞베란다(3곳),뒤베란다(7곳) 교체			✓				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) 23.10.18							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-505호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	40	✓				
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓				
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓				
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓				
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓				
	방B 천정(석고보드면)	㎡	11	✓				
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓				
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓				
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	15	✓				
	방A 바닥(부분접착)	㎡	8	✓				
	방B 바닥(부분접착)	㎡	8	✓				
	방C 바닥(부분접착)	㎡	12	✓				
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓				
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓				
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21	✓				
	방화도어 내부	㎡	2	✓				
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	40	✓				
5.기타	뒤베란다 천정전체 누수확인 및 보수, 내부샤시교체, 방충망-7곳(앞베란다(3곳), 뒤베란다(7곳)교체, 안방분박이장설치, 주방(싱크대교체,수전배관이설,난방분배기교체,타일교체), 현관바닥타일보수 또는교체			✓				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.10.18)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 송수빈 (기술고문)												
1.도배	LG휘앙세 광목											
	거실 벽면	㎡	40	1,086	43,440	5,261	210,440				253,880	
	거실 천정	㎡	24	1,086	26,064	6,839	164,136				190,200	
	방A 벽면	㎡	32	1,086	34,752	5,261	168,352				203,104	
	방A 천정	㎡										
	방B 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방B 천정	㎡										
	방C 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,261	131,525				158,675	
	방C 천정	㎡										
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	117			1,283	149,854				149,854	
소 계			146		158,556		955,832				1,114,388	
2.바닥재	LG청맥											
	거실 바닥 철거	㎡										
	방A 바닥 철거	㎡										
	방B 바닥 철거	㎡										
	방C 바닥 철거	㎡										
	접착제(부분접착)	kg										
	거실 바닥	㎡										
	방A 바닥	㎡										
	방B 바닥	㎡										
	방C 바닥	㎡										
소 계			0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			6,200	279,000				279,000	2022년 실내건축 일위
소 계							279,000				279,000	
합 계					158,556		1,234,832		0		1,393,388	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,669,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 송수빈 근무부서: 노형개벽 전화번호: 0108839 0409 사택명: 등지 APT
