

기숙사 및 사택 8월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					7,248,000	7,027,275	==>일성-일반(3 건)	-3%
					1,023,000	977,175	==>일성-임차사택(1 건)	-5%
					12,714,000	10,072,750	==>하이엡솔루텍(1 건)	-26%
					20,985,000	18,077,200	8월 마감건(5 건)	-16%
01	08월31일	기숙사동 EHP 오버홀 세척	솔루션 장비수량 포함 2차 네고	2023-08-14	12,714,000	10,072,750	하이엡솔루텍	-26%
02	08월31일	사택 104-301 수장공사		2023-08-10	5,576,000	5,412,625	일성건축	-3%
03	08월31일	사택 104-301 단열작업		2023-07-31	652,000	632,100	일성건축	-3%
04	08월31일	기숙사 B동 세대용 공동현관 방화문 보수		2023-08-08	1,020,000	982,550	일성건축	-4%
05	08월31일	임차사택 수장공사 부헤리(양극재개발)		2023-07-26	1,023,000	977,175	일성건축	-5%

기술연구원 기숙사동 프리미엄세척



LG전자
패인퍼넌스 & 서비스

하이-엠솔루텍



기술연구원 기숙사동 프리미엄세척 (공통)

대상 장비 현황

고객사	1-WAY	2-WAY	4-WAY	입 형	벽 길이	합계
☐ 솔루션						
욕외					1	1
B동	102		4			106
A동	207	2	7			216
8동				1	2	3
5동			1			1
3동	121		5	3		129
104동	1		1			2
102동			20	1		21
솔루션 합계	431	2	38	5	3	479
☐ 화학						
B동	88					88
A동	1		1			2
3동	30					30
화학 합계	119		1			120
총합계	550	2	39	5	3	599

일일 세척 수량

고객사	7월 17일	7월 18일	7월 19일	7월 20일	7월 21일	7월 24일	7월 25일	7월 26일	7월 27일	7월 28일	8월 12일	총합계
☐ 솔루션												
욕외										1		1
B동				16	74	12				4		106
A동	49	86	42	31						8		216
8동											3	3
5동										1		1
3동							16	54	57	2		129
104동											2	2
102동											21	21
솔루션 합계	49	86	42	47	74	12	16	54	57	16	26	479
☐ 화학												
B동						50	38					88
A동	2											2
3동							30					30
화학 합계	2					50	68					120
총합계	51	86	42	47	74	62	84	54	57	16	26	599

세척 투입 현황

건물동	7월 17일	7월 18일	7월 19일	7월 20일	7월 21일	7월 24일	7월 25일	7월 26일	7월 27일	7월 28일	8월 12일	총합계
욕외												
B동					7	6	8			3		24
A동	5	9	5	5								24
8동												
5동												
3동								5	5			10
104동											3	3
102동											3	3
총합계	5	9	5	5	7	6	8	5	5	3	3	61

누기(상부)



누기(하부)



누기(중간)



조회



세대내 보양



분해




드레인판 분리



드레인 수거



드레인판 점검



온수 고압 세척



온수 고압 세척



핀 약품 세척




파트별 고압 세척



파트별 고압 세척



약품 세척



기술연구원 사택 실외기 세척



LG전자
에어컨·냉장고 & 서비스

하이-엠솔루텍



세척전



약품투여



고압세척



세척후

기술연구원 사택 3동 1층



LG전자
메인터넌스 & 서비스

하이-엠솔루텍



세척전



세척후



세척전




세척후

기술연구원 사택 A동 옥상




LG전자
메인テナンス & 서비스

하이-엠솔루텍

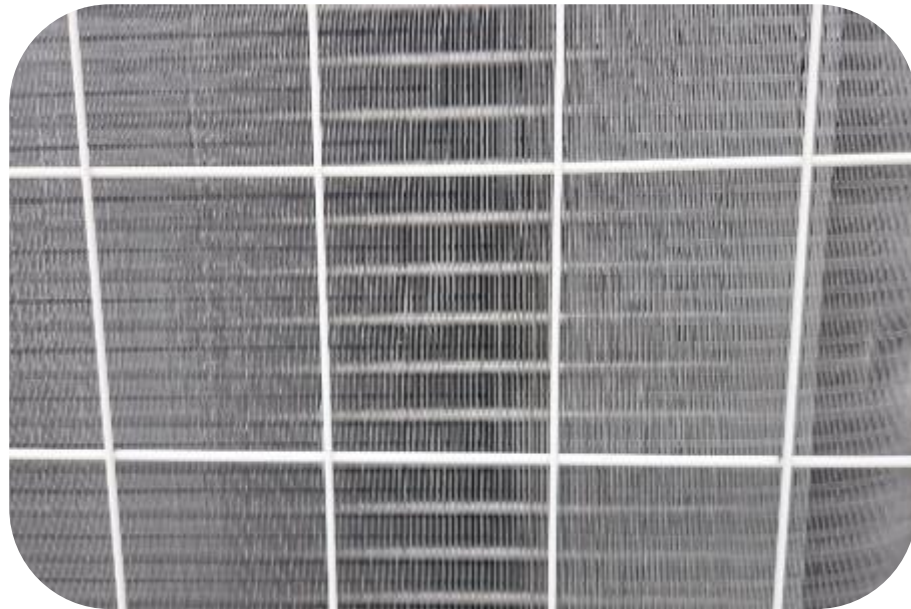

세척전

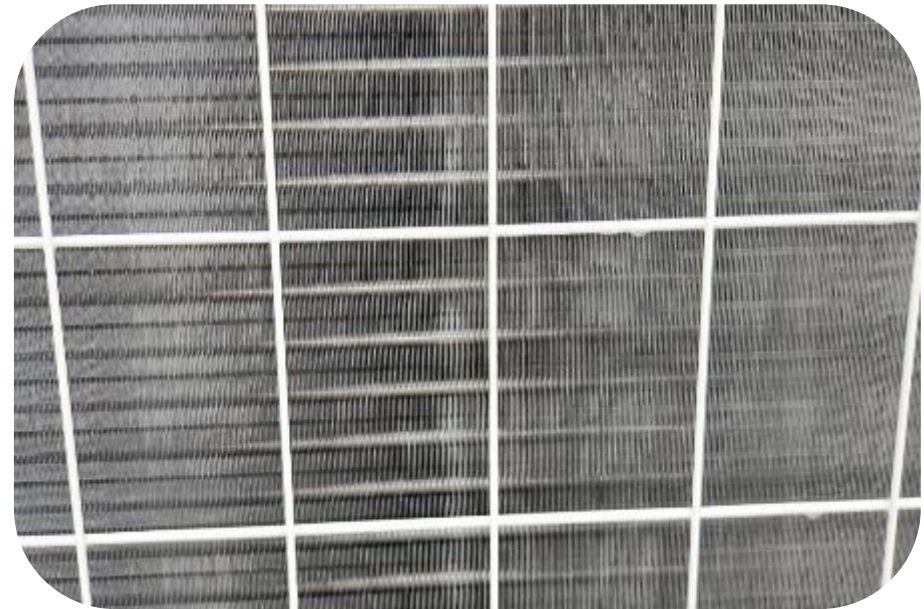


세척후

기술연구원 사택 B동 옥상




LG전자
메인テナンス & 서비스

하이-엠솔루텍

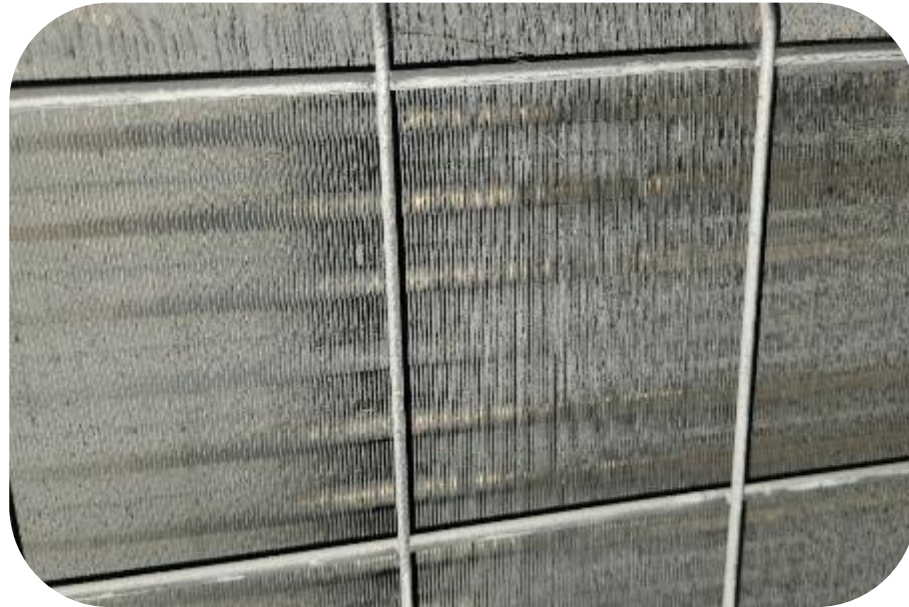

세척전

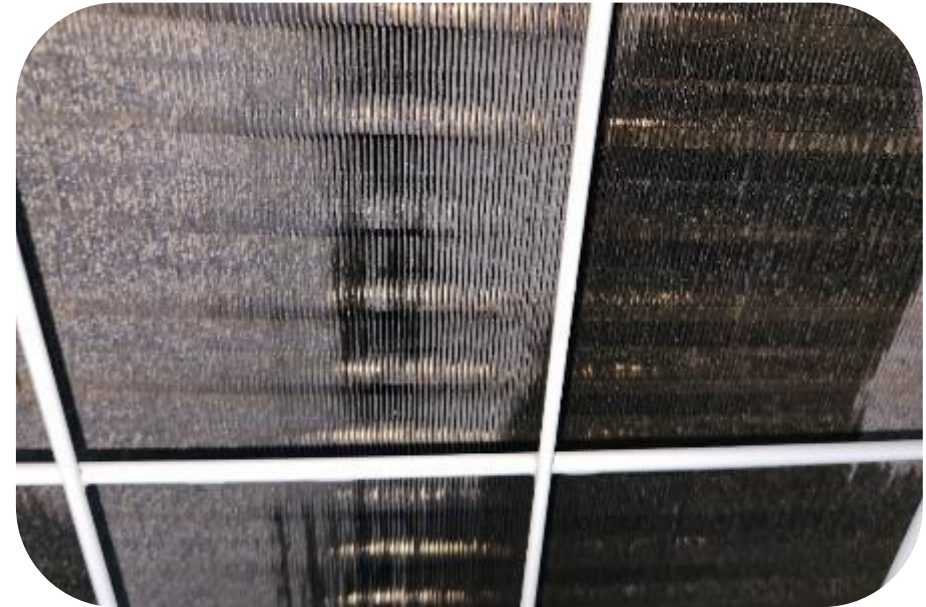

세척후

기술연구원 사택 GS편의점



LG전자
메인テナンス & 서비스

하이-엠솔루텍



세척전



세척후

기술연구원 사택A동 프리미엄세척



LG전자
패턴자산스 & 서비스

하이-엠솔루텍



VIP6



세척전



세척후

기술연구원 사택B동 프리미엄세척



LG전자
패턴자산스 & 서비스

하이-엠솔루텍



기술연구원 사택 B동 201호 프리미엄세척



LG전자
에어컨·냉장고 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전



세척후



세척전



세척후



세척전




세척후



세척전




세척후

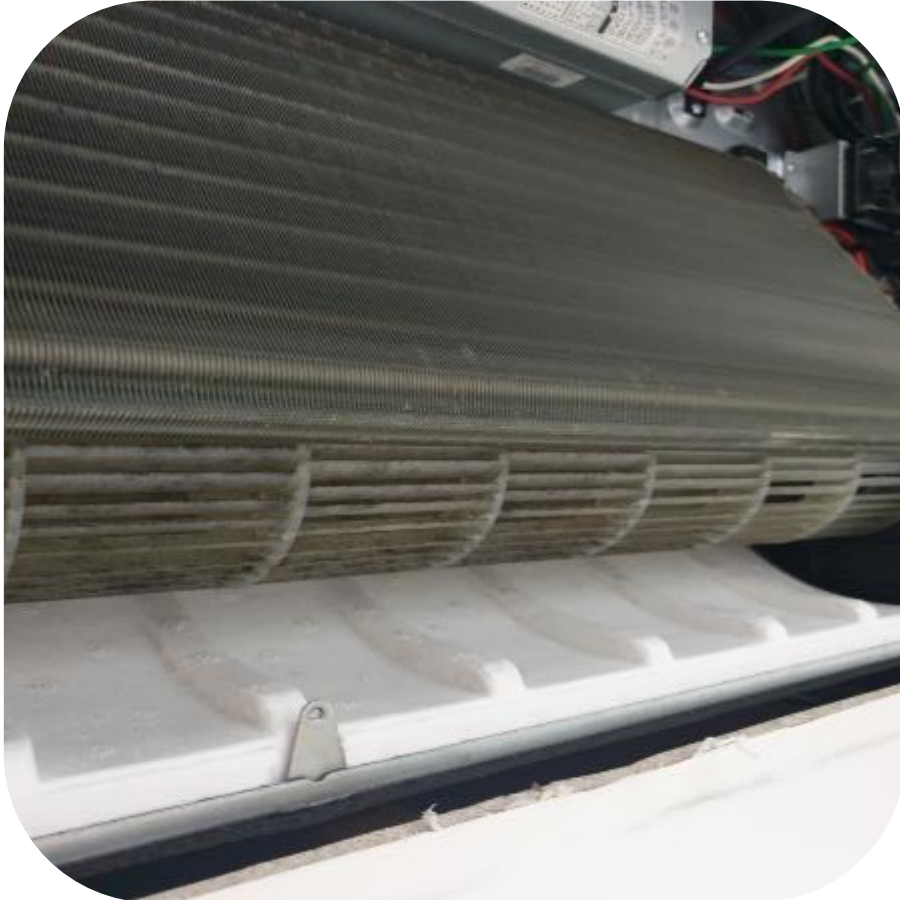

세척전



세척후

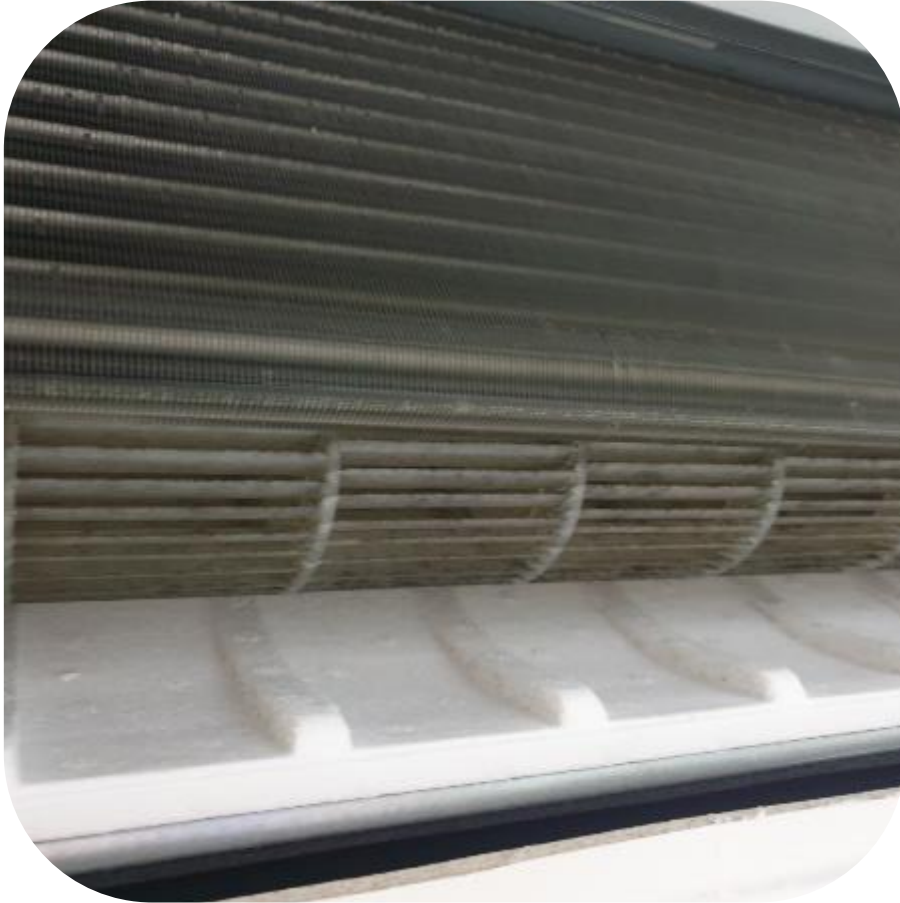

세척전



세척후

기술연구원 사택 B동 202호 프리미엄세척



LG전자
패턴/카운터스 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전



세척후



세척전




세척후




세척전




세척후

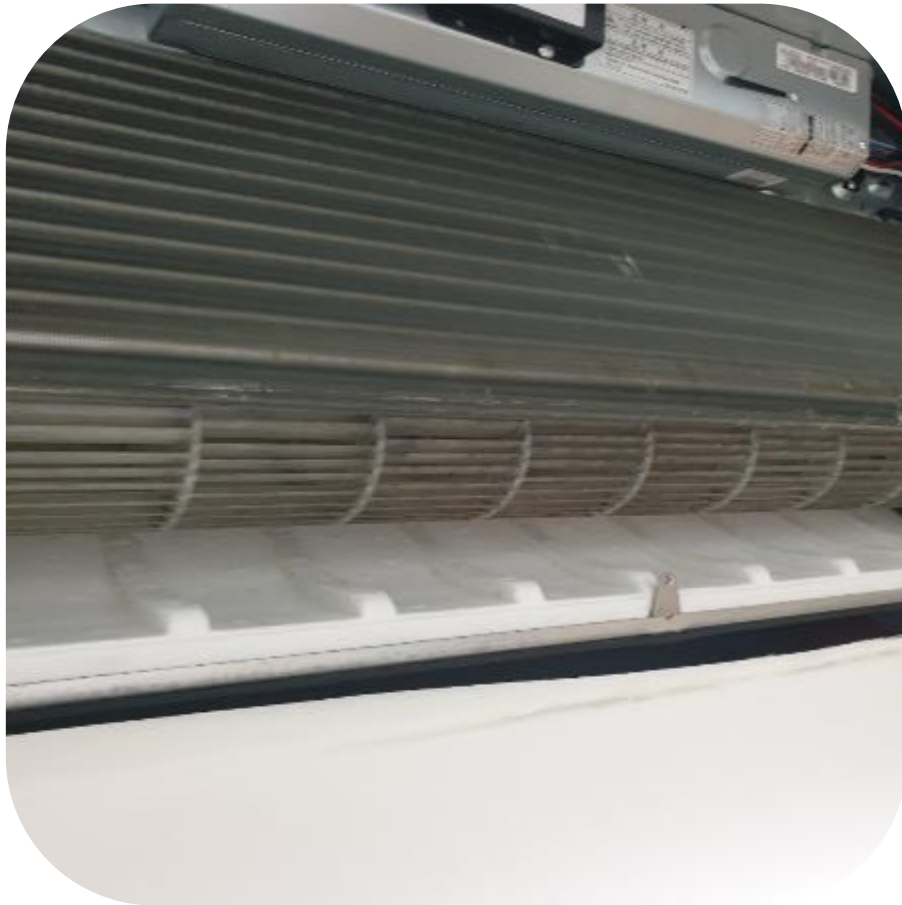

세척전

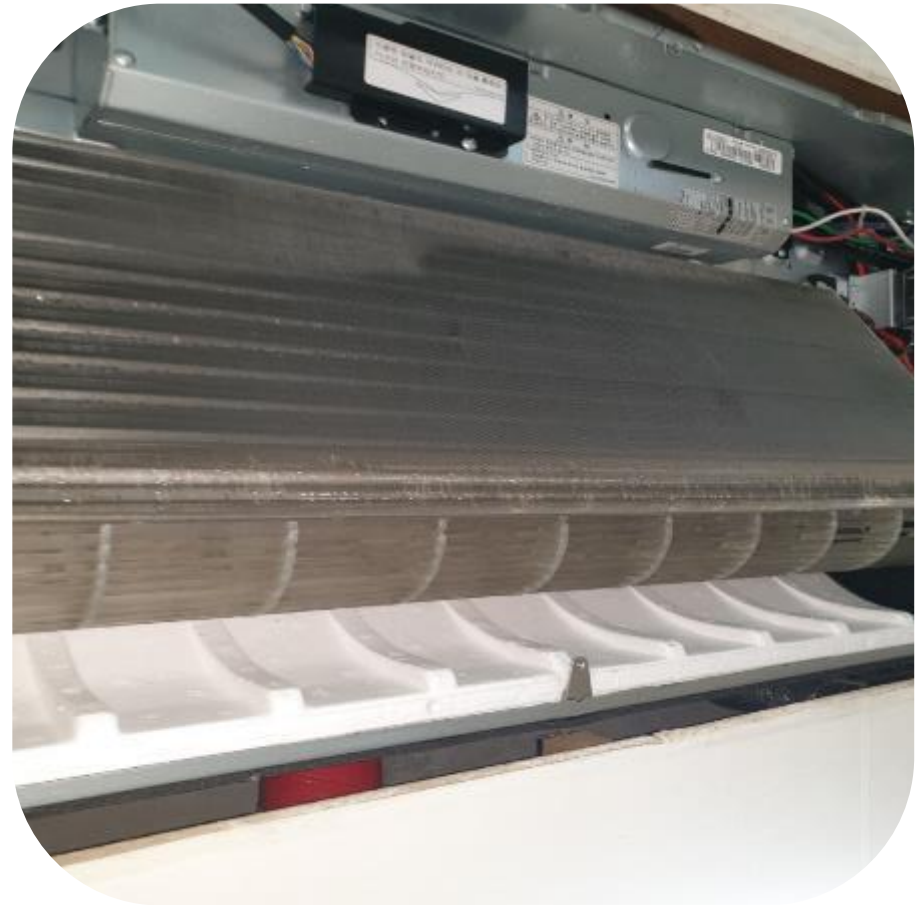

세척후

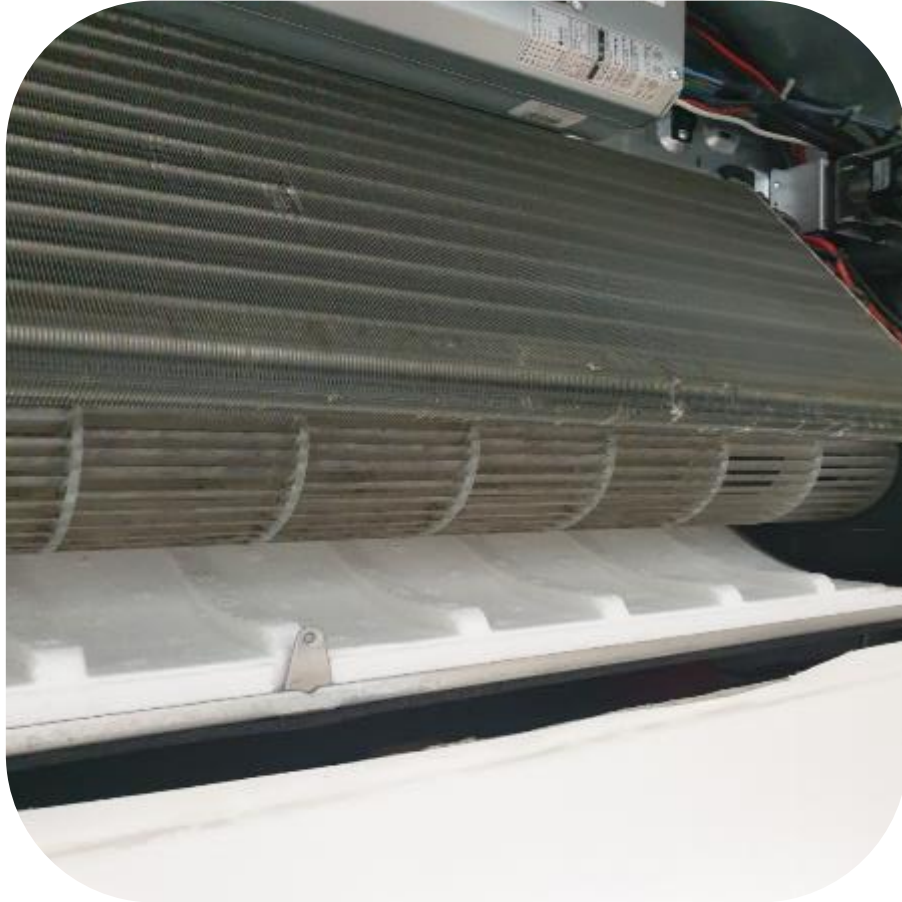


세척전



세척후



세척전

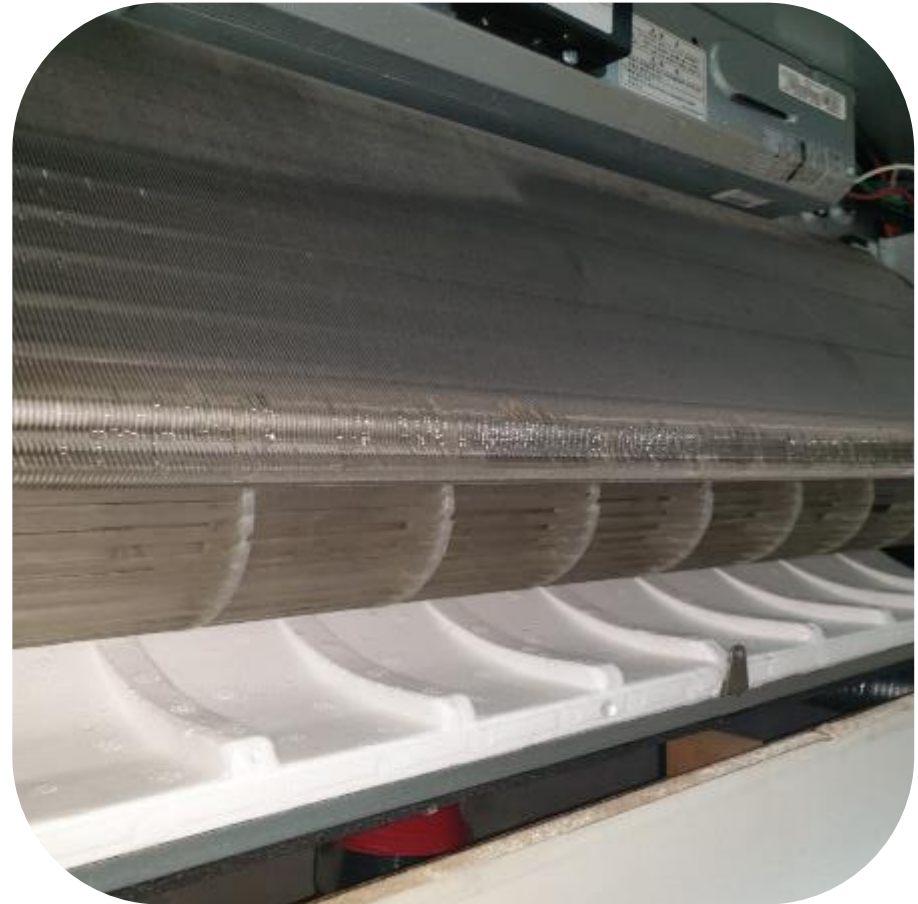

세척후

기술연구원 사택 B동 203호 프리미엄세척



LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후

기술연구원 사택 B동 204호 프리미엄세척



LG전자
패밀리케어 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후

기술연구원 사택 B동 301호 프리미엄세척



LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전




세척후



세척전




세척후

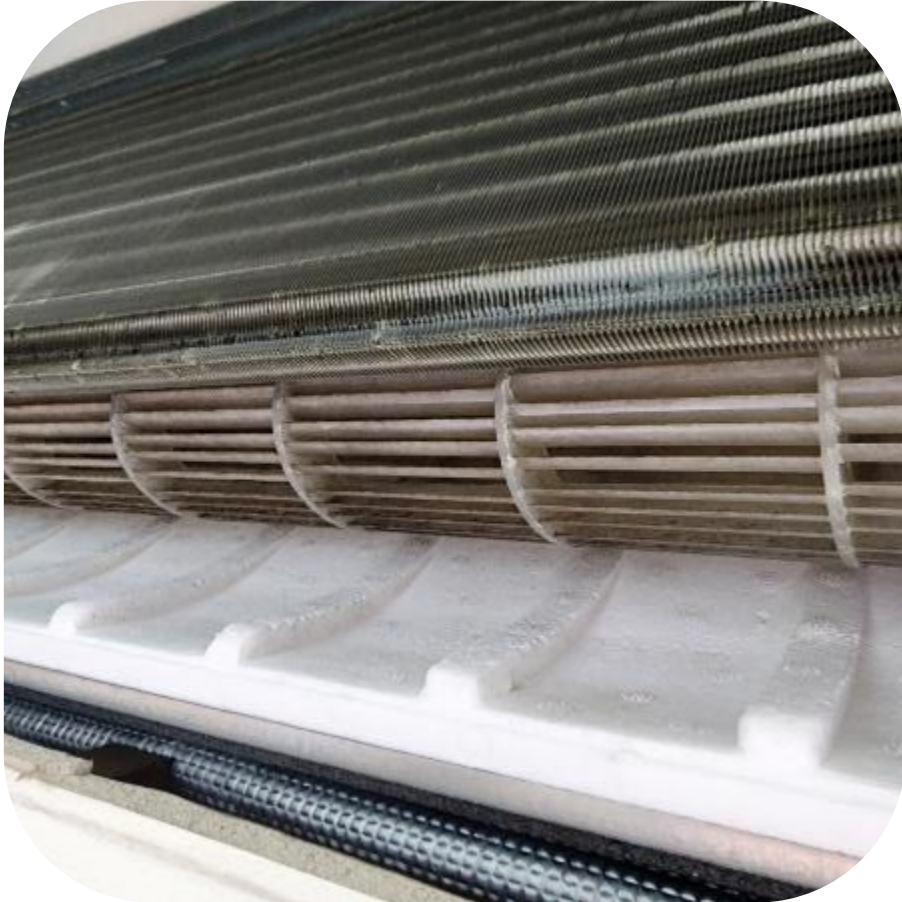

세척전




세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후


기술연구원 사택 B동 302호 프리미엄세척



LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍



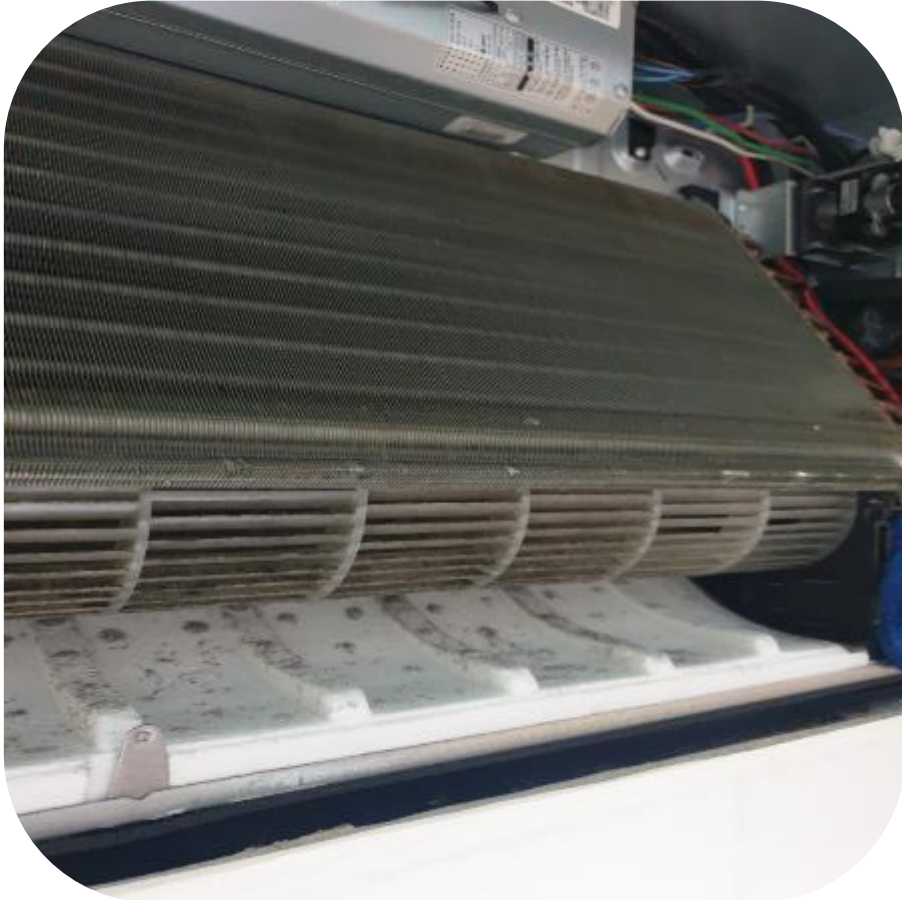

세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후

기술연구원 사택 B동 303호 프리미엄세척



LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍






세척전



세척후

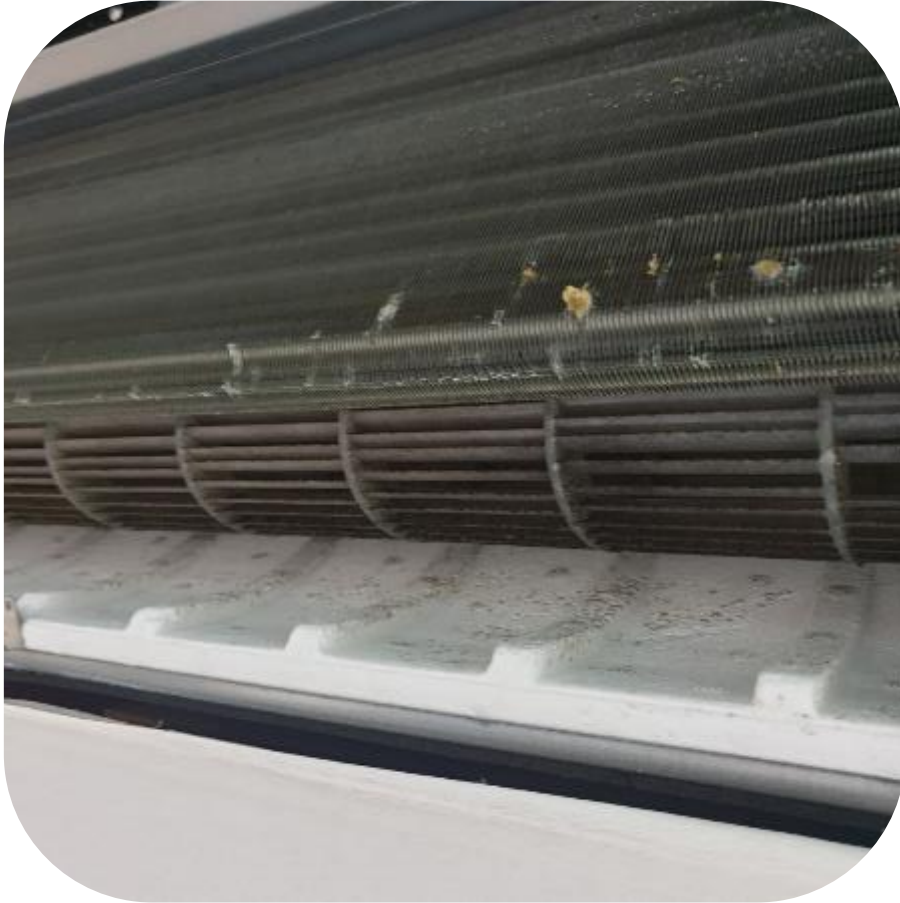

세척전



세척후




세척전




세척후




세척전

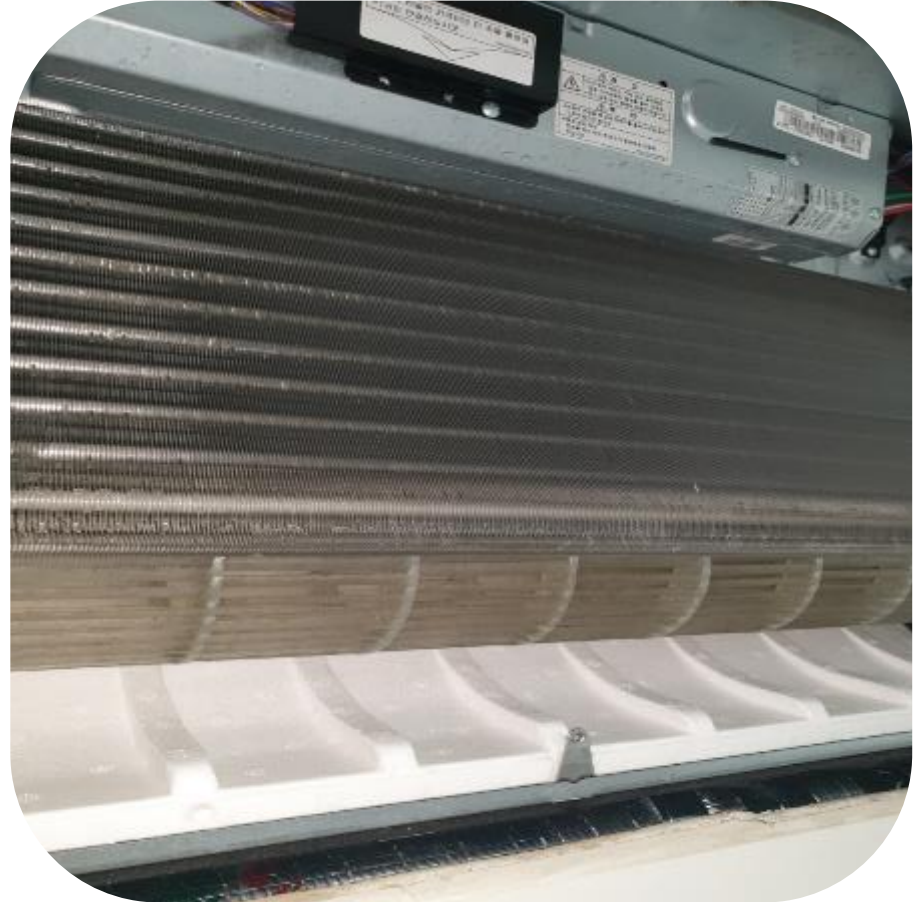

세척후

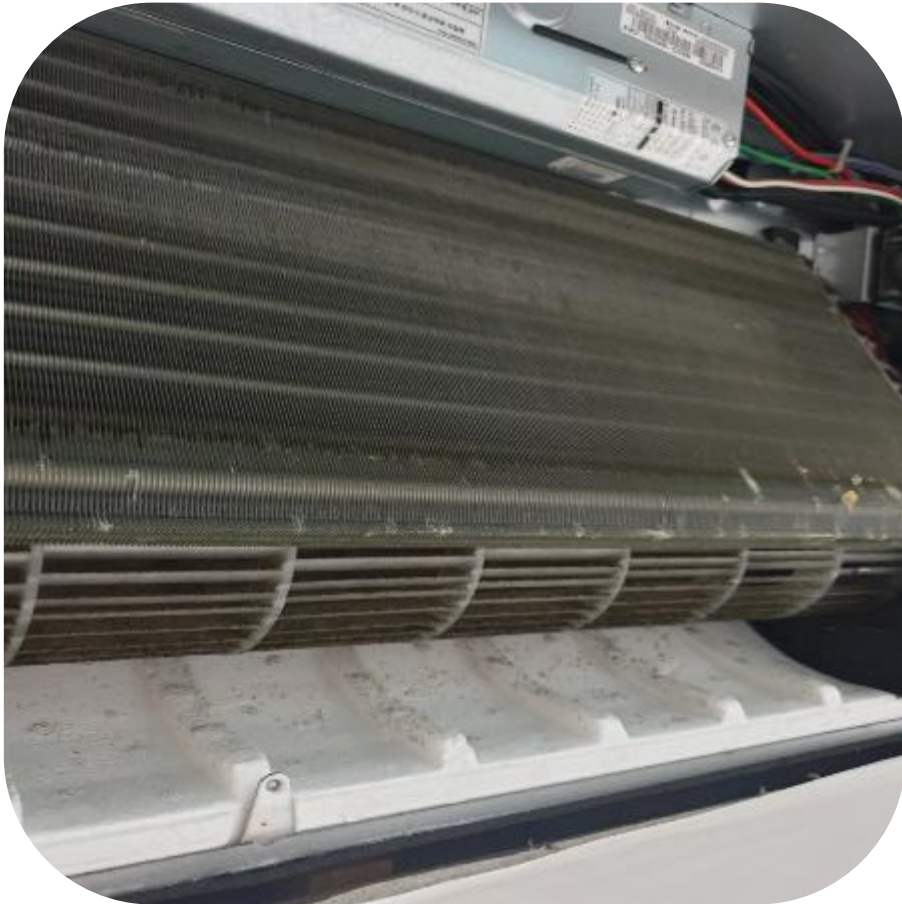

세척전

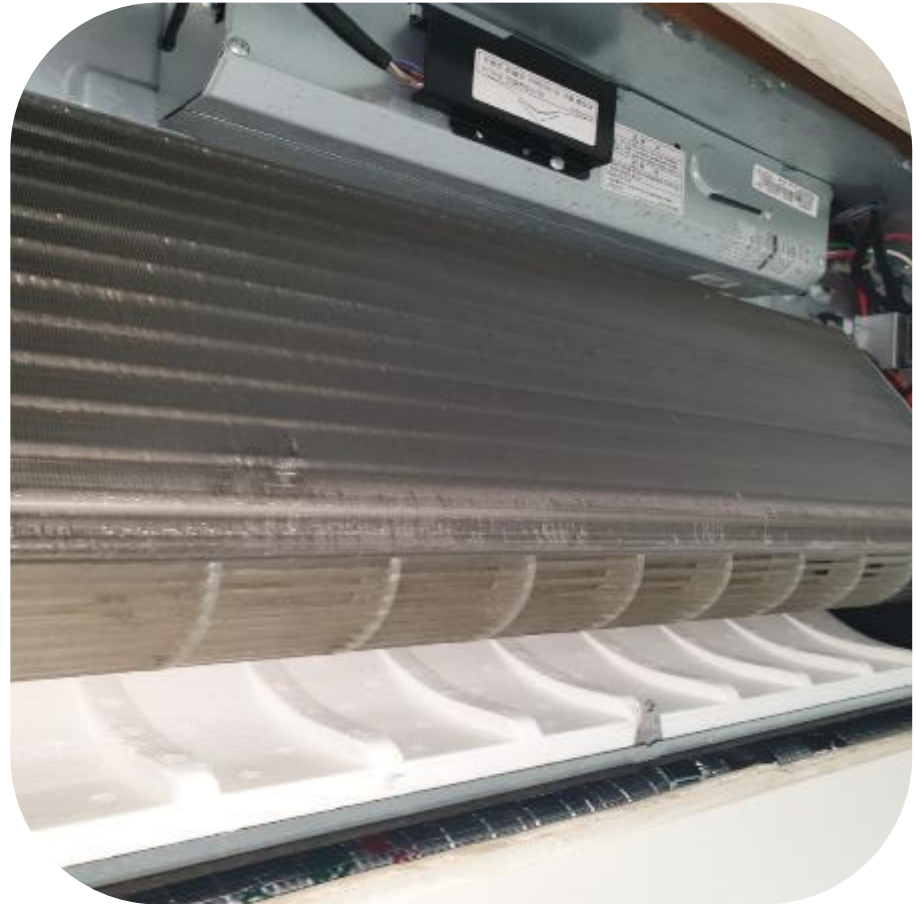

세척후



세척전



세척후

기술연구원 사택 B동 304호 프리미엄세척



LG전자
패턴자산스 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전



세척후



세척전



세척후




세척전



세척후




세척전

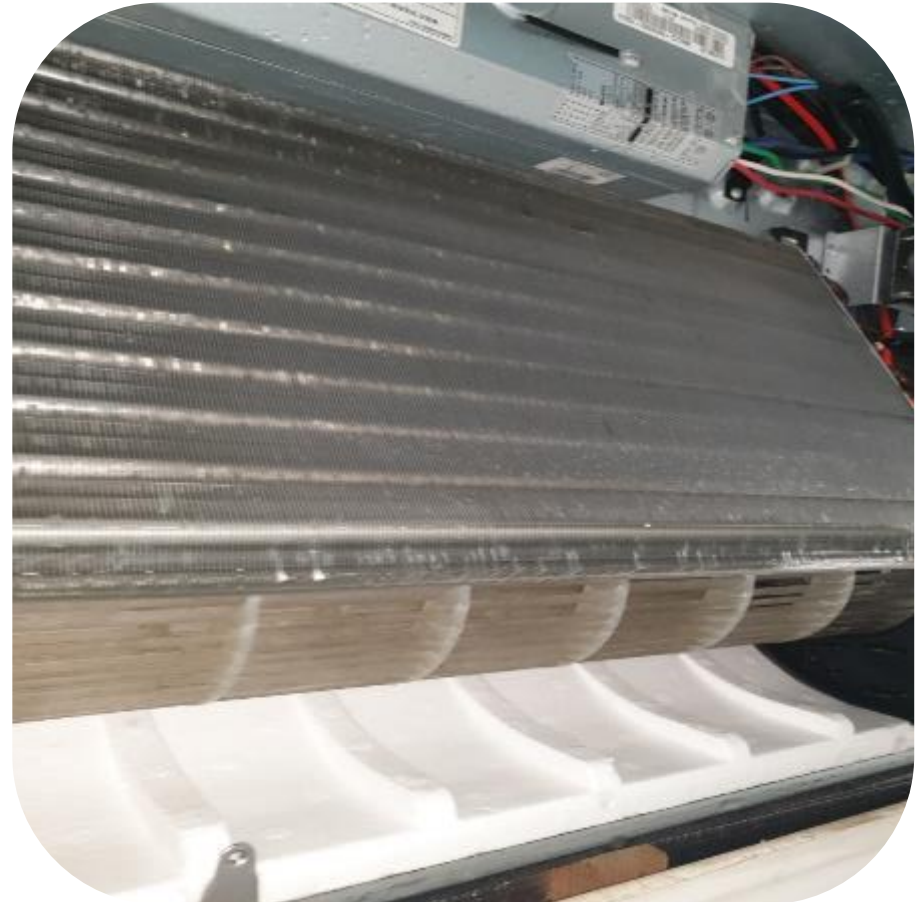

세척후



세척전

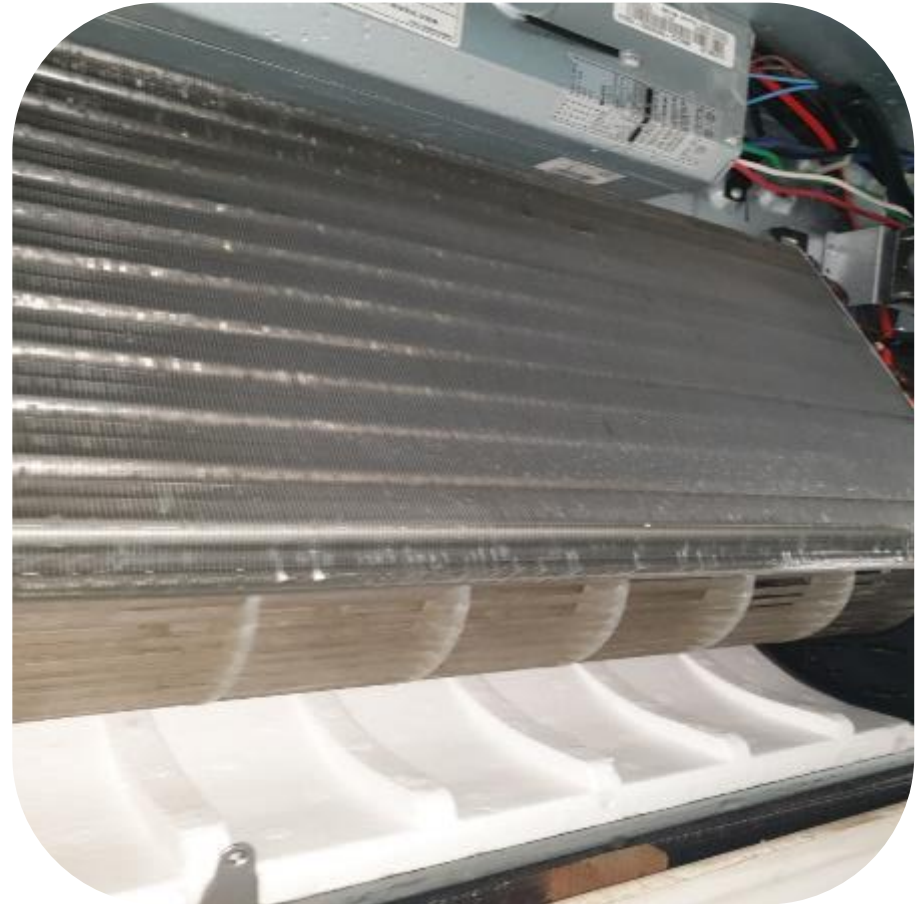

세척후


기술연구원 사택 B동 401호 프리미엄세척



LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍






세척전




세척후

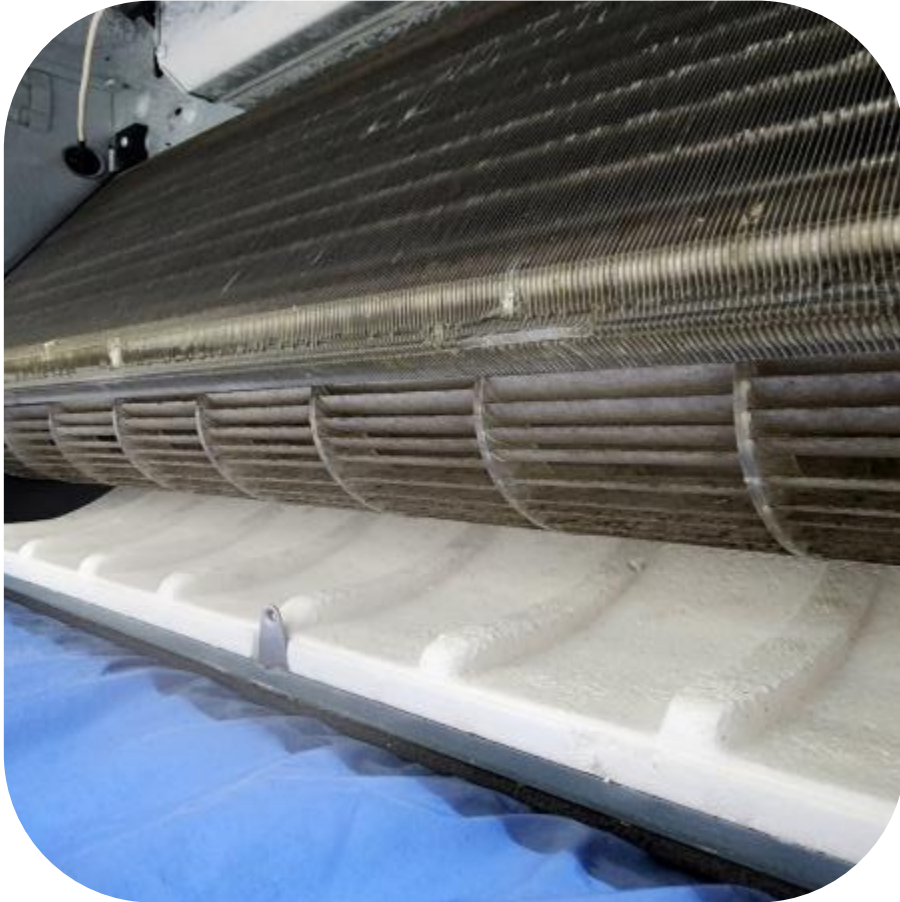

세척전




세척후

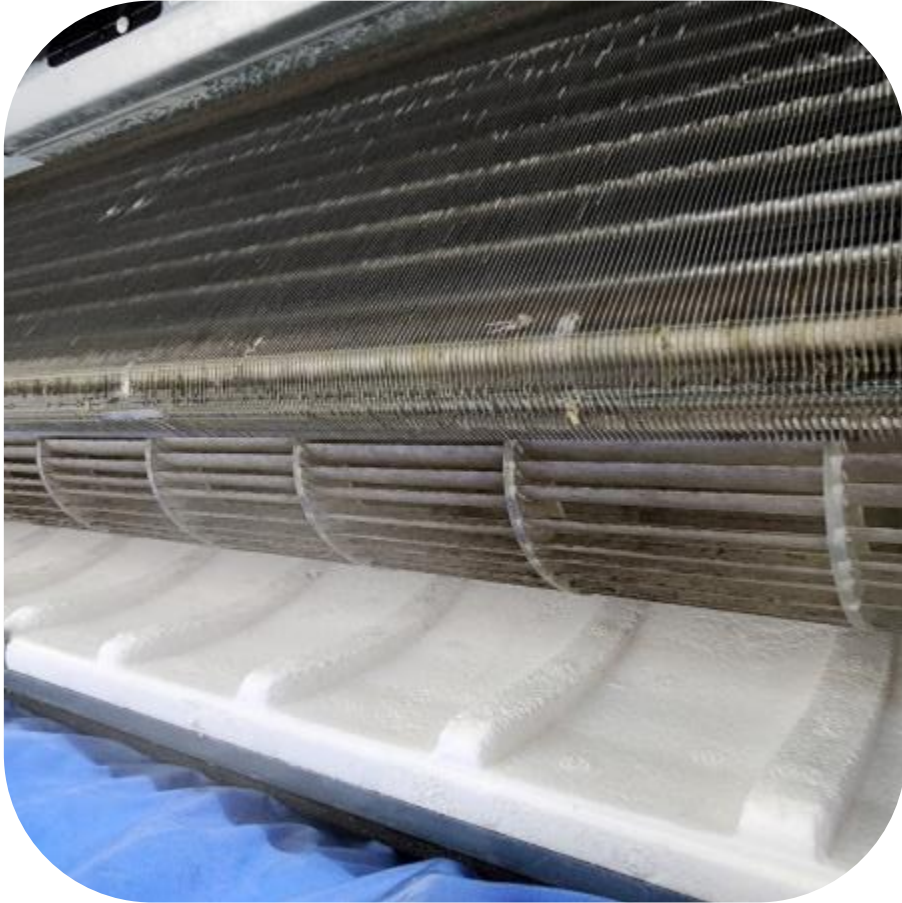

세척전



세척후



세척전





세척후



세척전



세척후

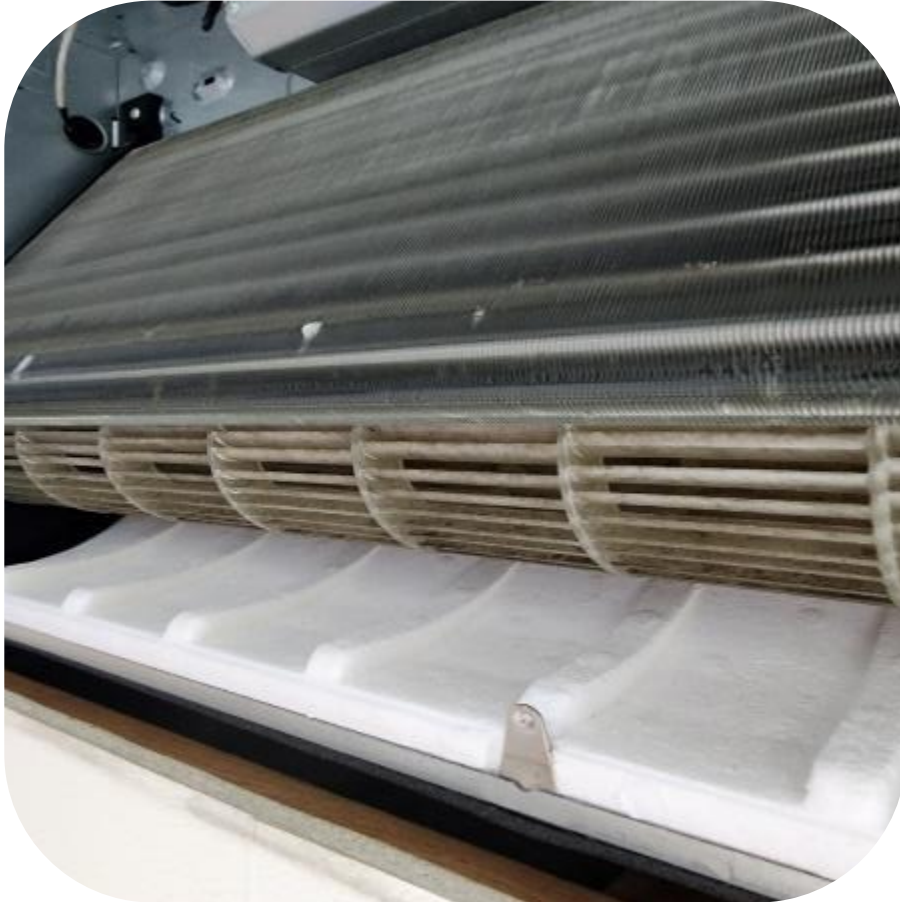

세척전



세척후

기술연구원 사택 B동 402호 프리미엄세척



LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후

기술연구원 사택 B동 403호 프리미엄세척



LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전



세척후



세척전



세척후



세척전




세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후


기술연구원 사택 B동 404호 프리미엄세척



LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전



세척후



세척전




세척후



세척전



세척후



세척전



세척후

기술연구원 사택 B동 501호 프리미엄세척



LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후




세척전



세척후



세척전

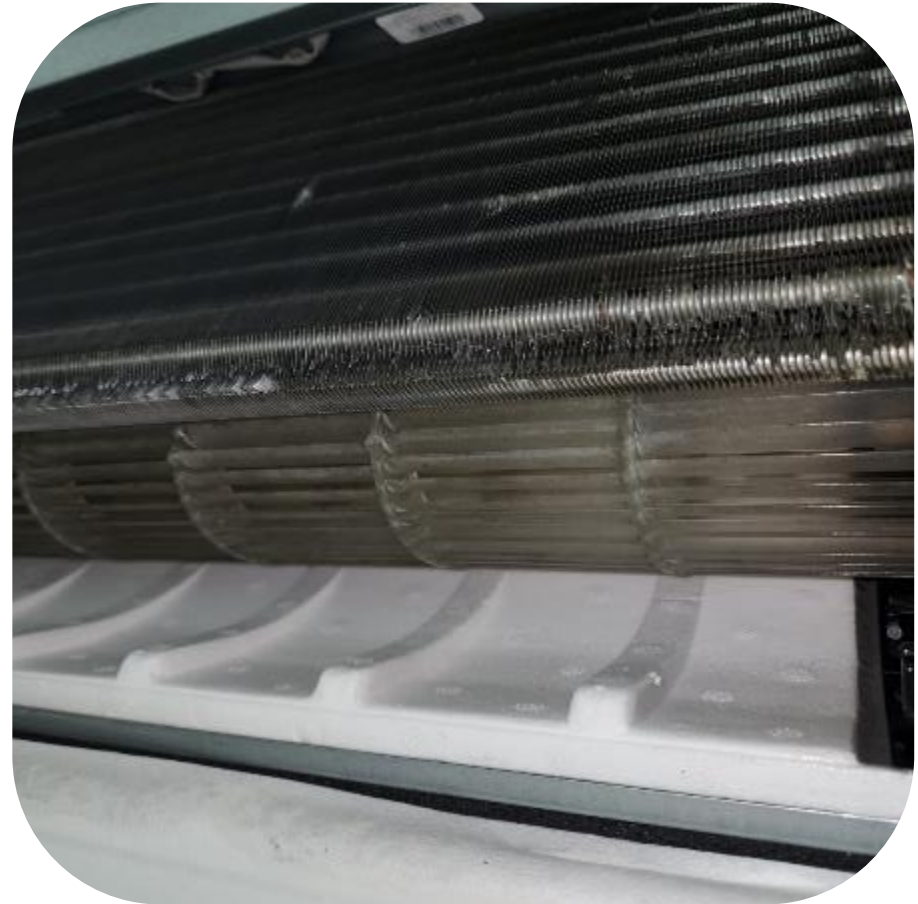

세척후

기술연구원 사택 B동 502호 프리미엄세척




LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍






세척전

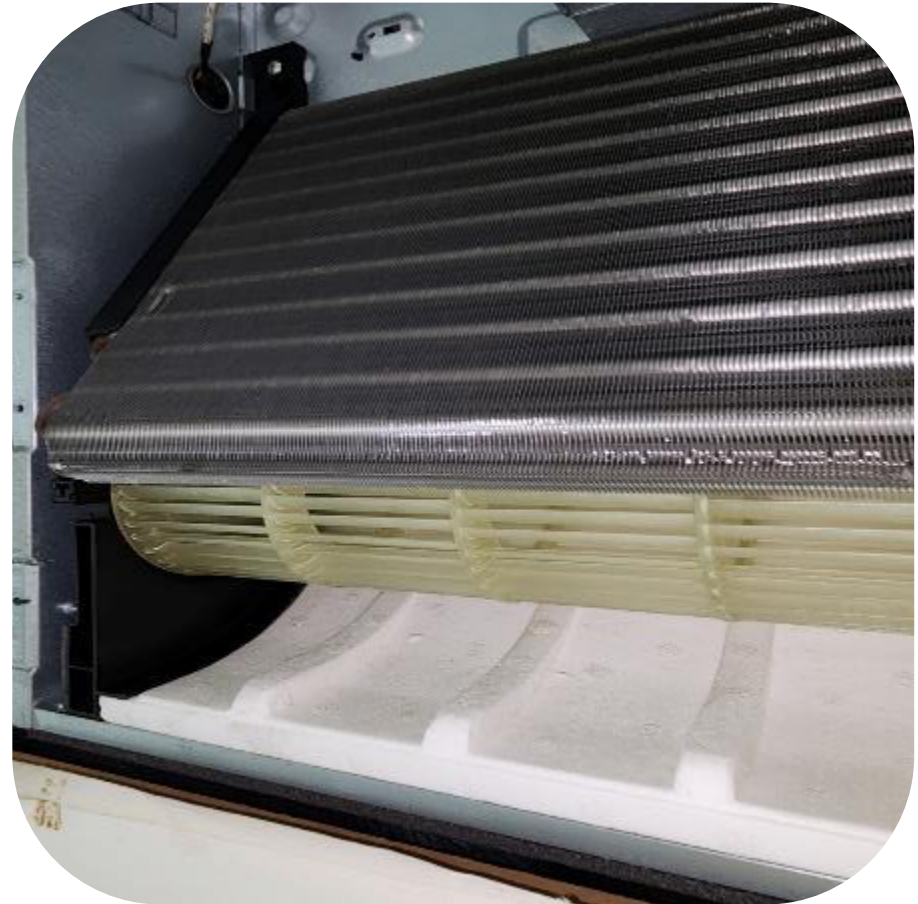

세척후




세척전

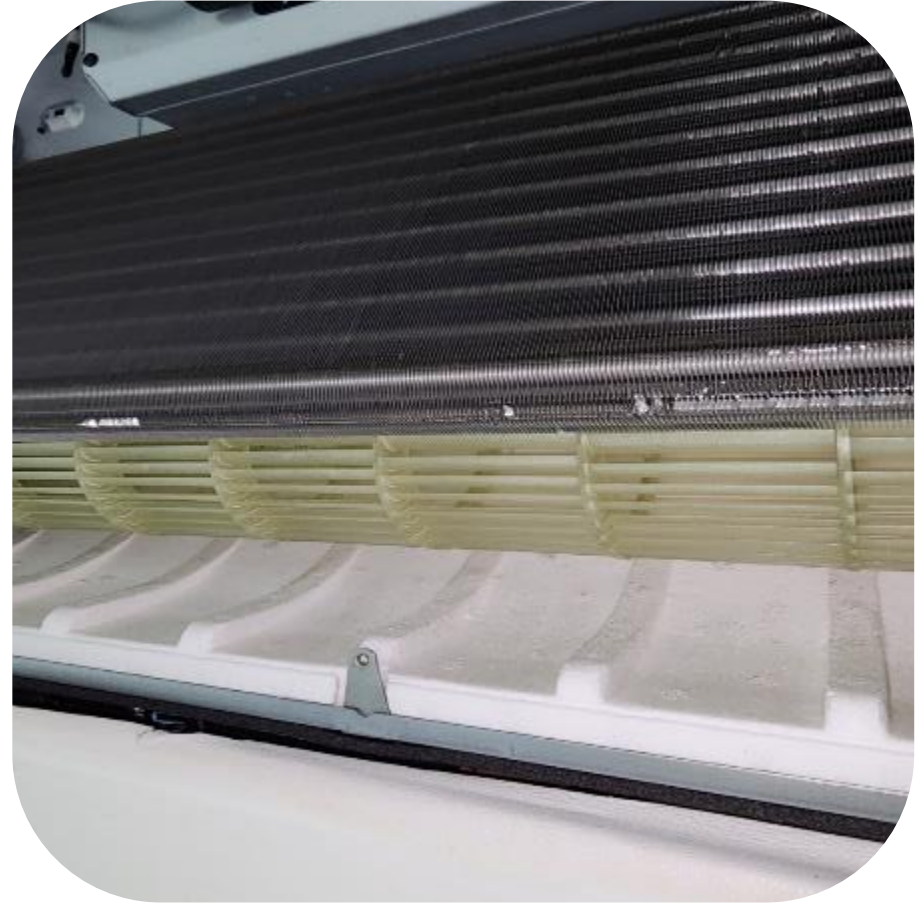


세척후



세척전

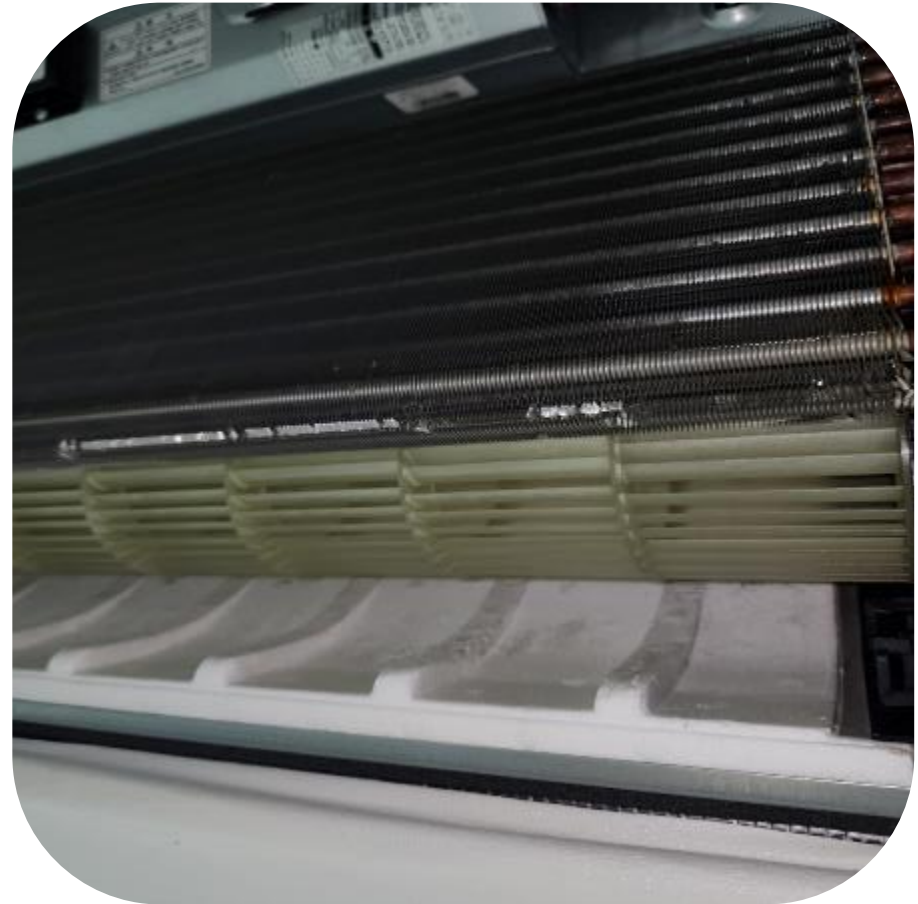


세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후

기술연구원 사택 B동 503호 프리미엄세척



LG전자
패인자란스 & 서비스

하이-엠솔루텍






세척전



세척후




세척전




세척후



세척전

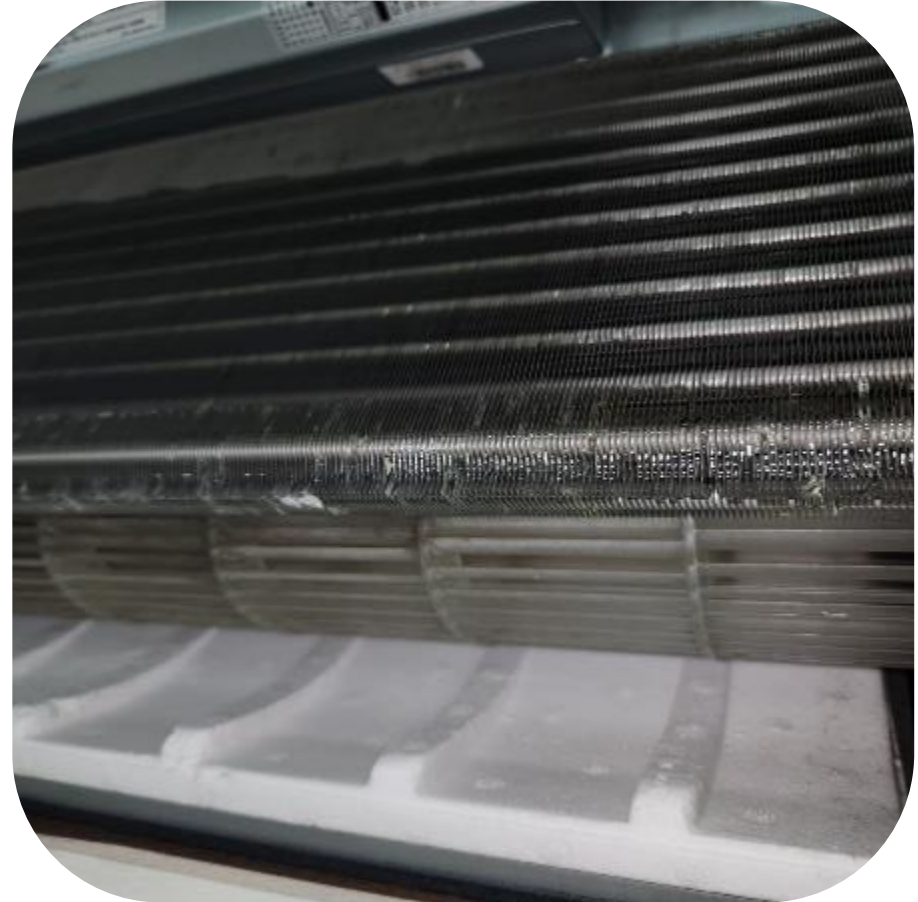

세척후



세척전




세척후



세척전



세척후



세척전



세척후

기술연구원 사택 B동 504호 프리미엄세척



LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전



세척후



세척전




세척후



세척전



세척후



세척전



세척후

기술연구원 사택 3동 5층 프리미엄세척




LG전자
패턴솔루션 & 서비스

하이-엠솔루텍





세척전

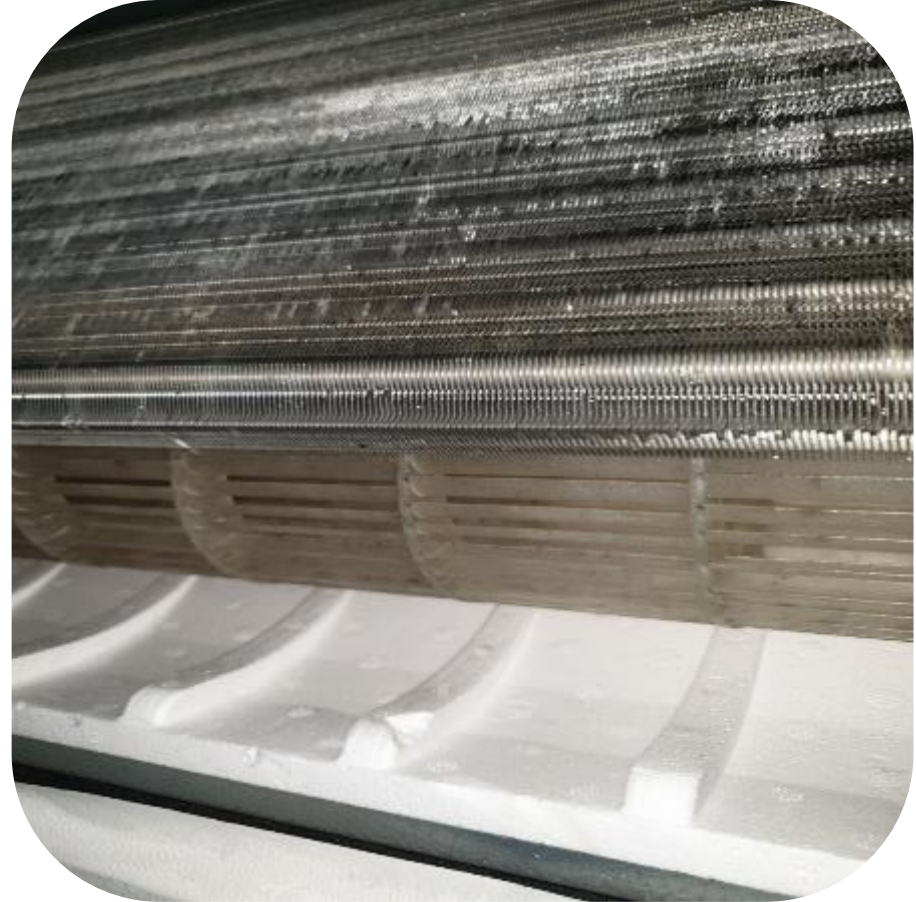

세척후



세척전



세척후



세척전




세척후



세척전



세척후

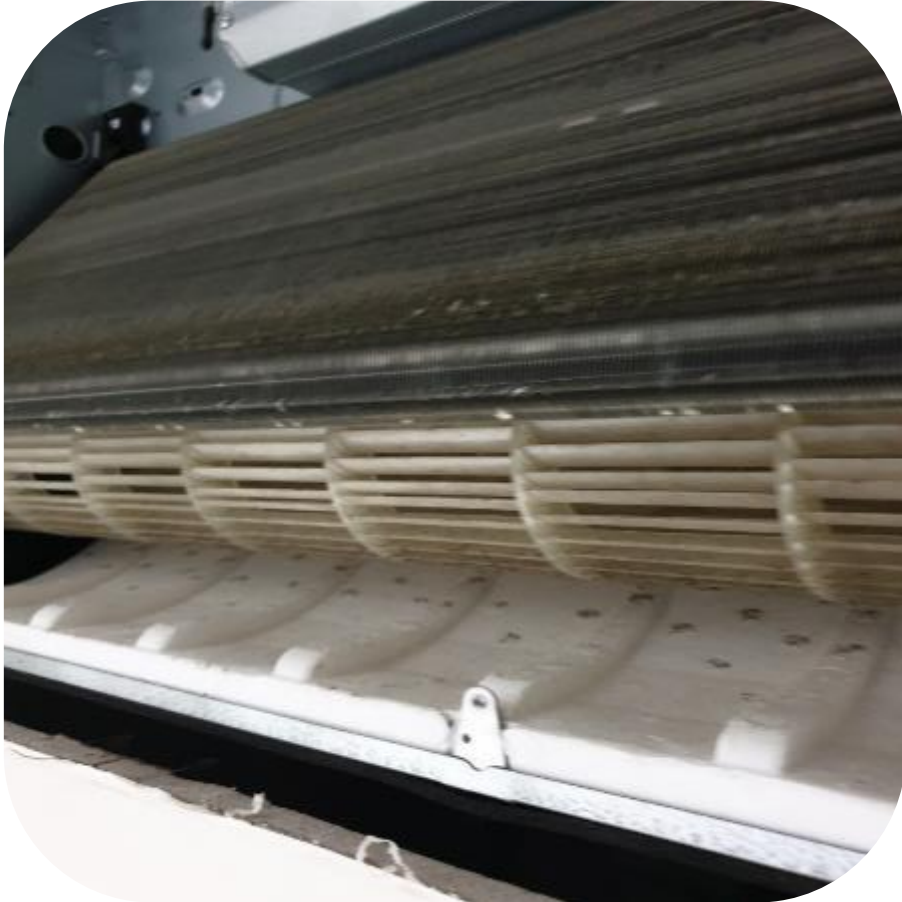


세척전



세척후



세척전

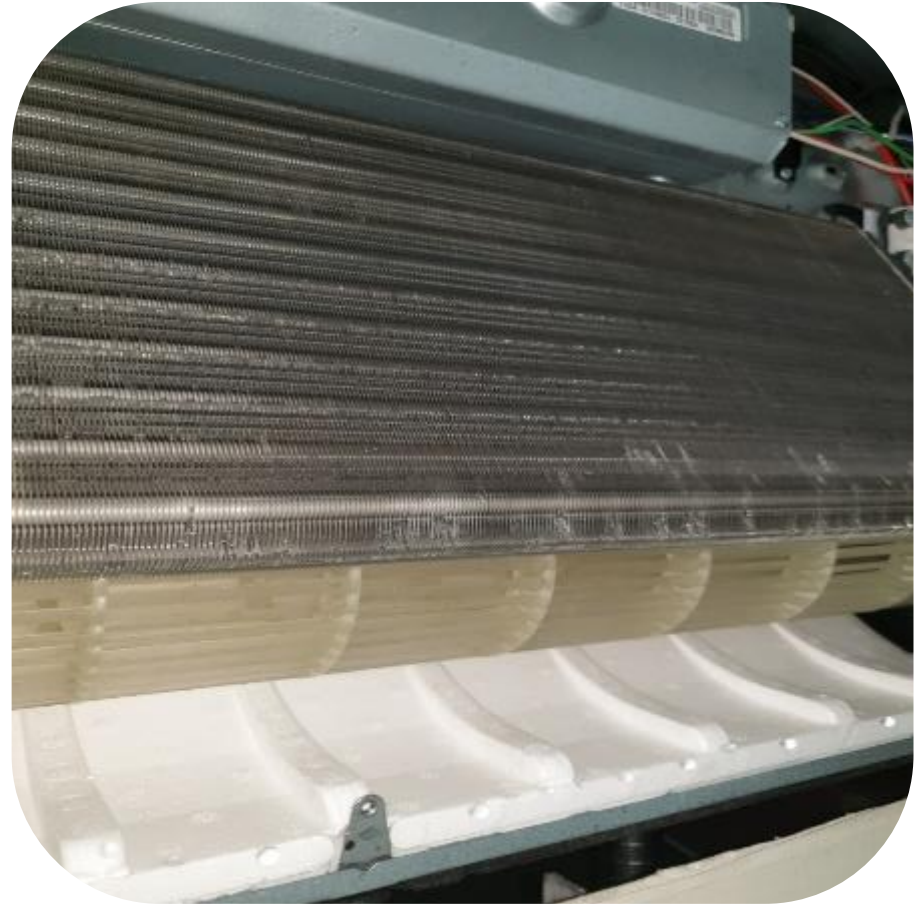

세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후




세척전



세척후



세척전

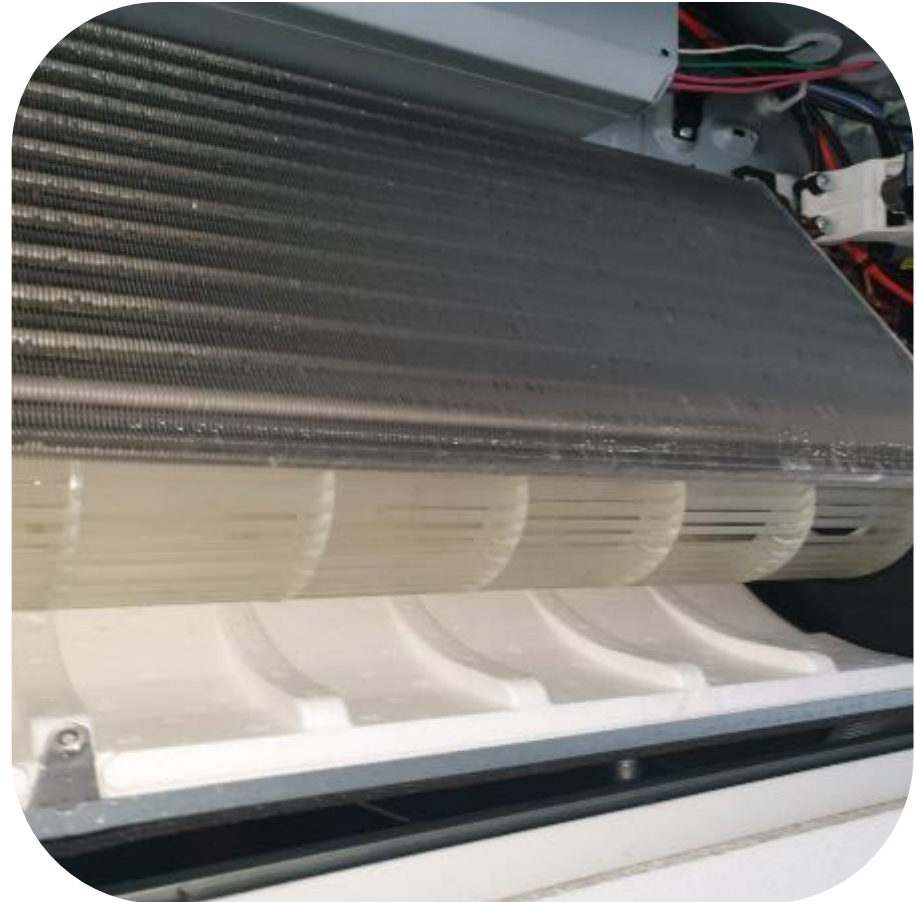

세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전




세척후



세척전



세척후

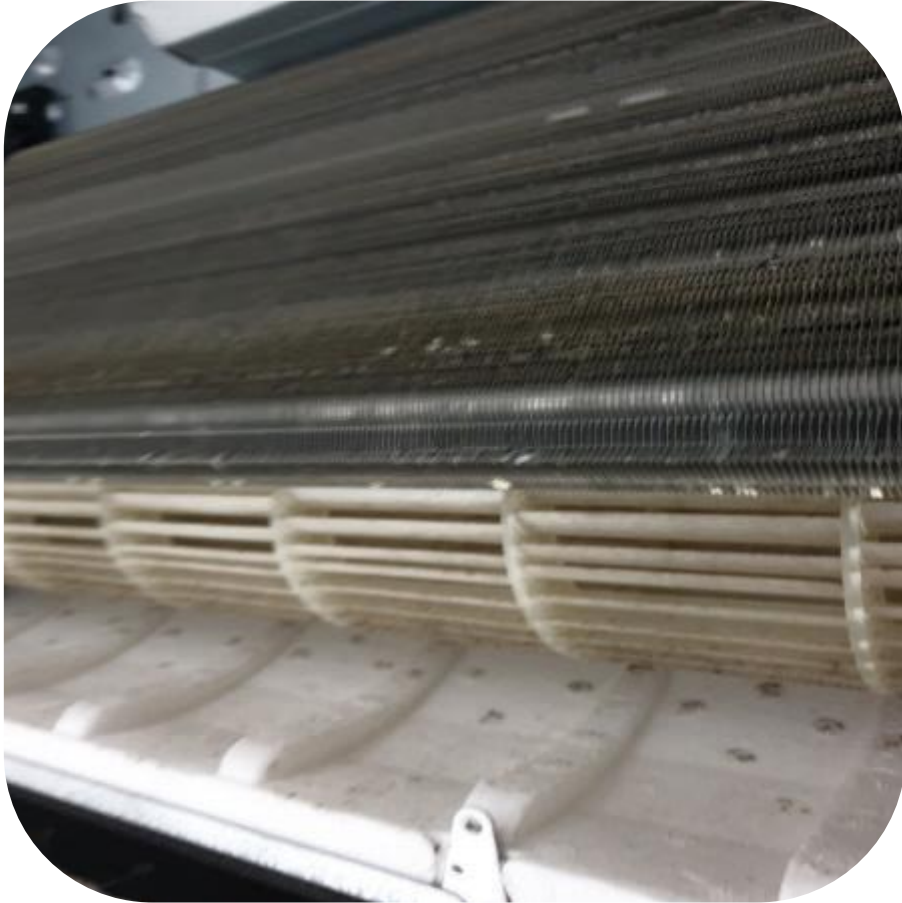


세척전




세척후



세척전

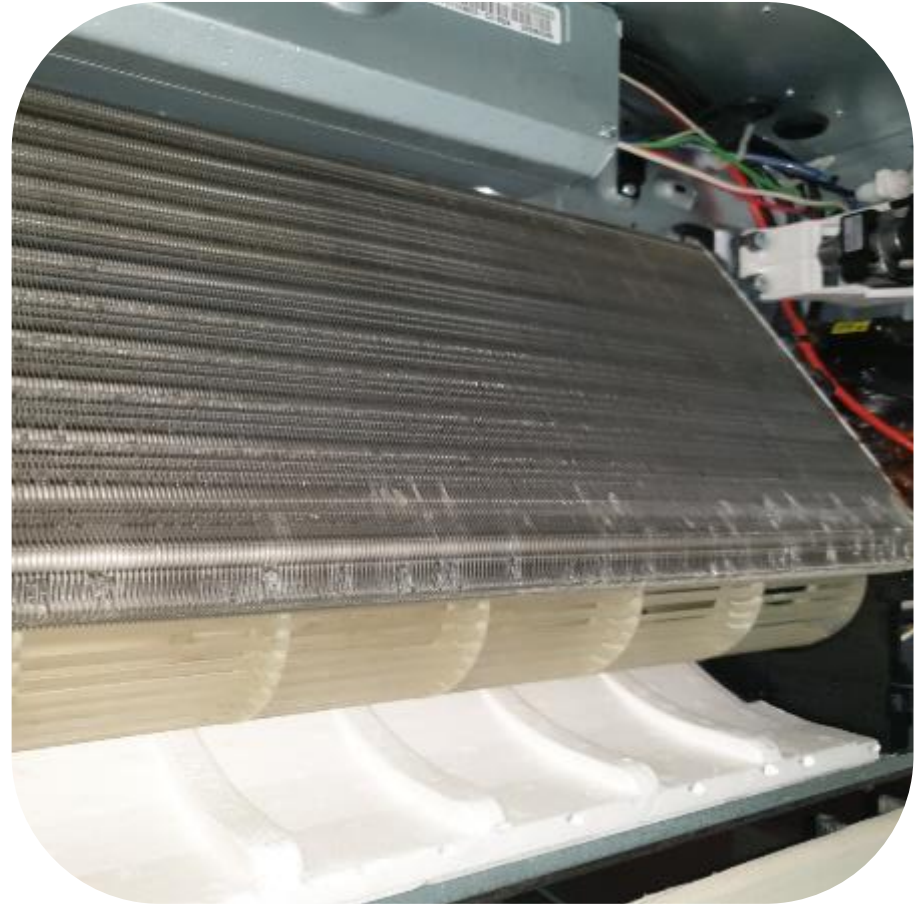


세척후

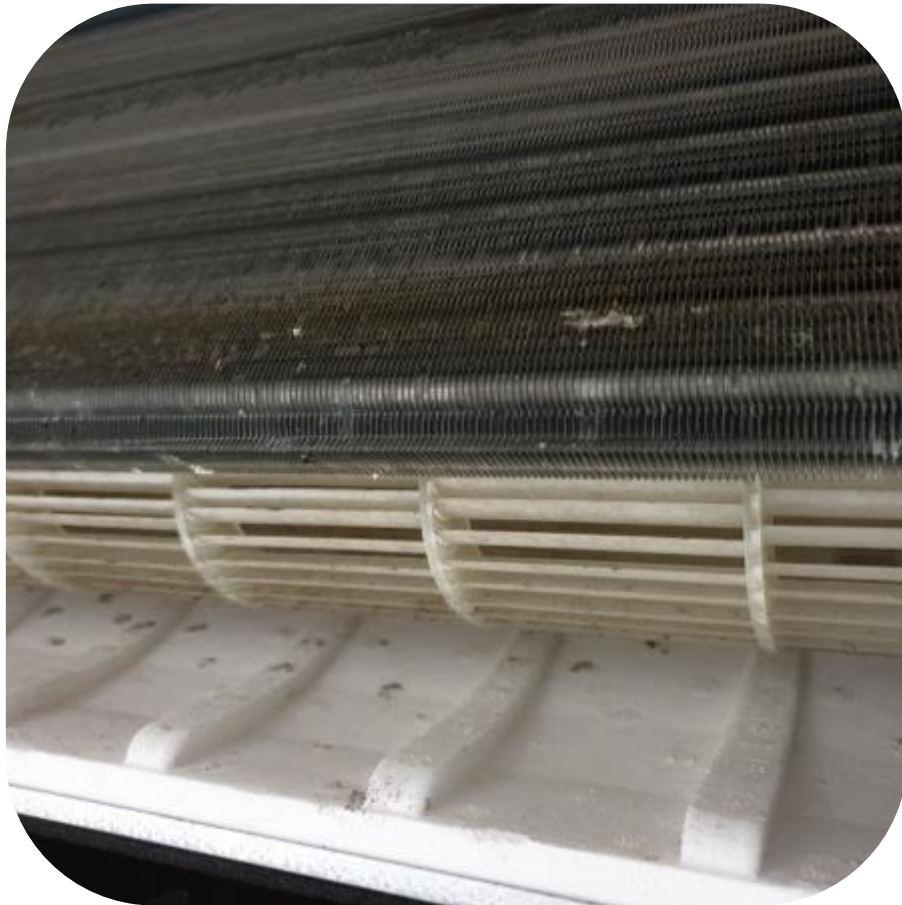

세척전




세척후

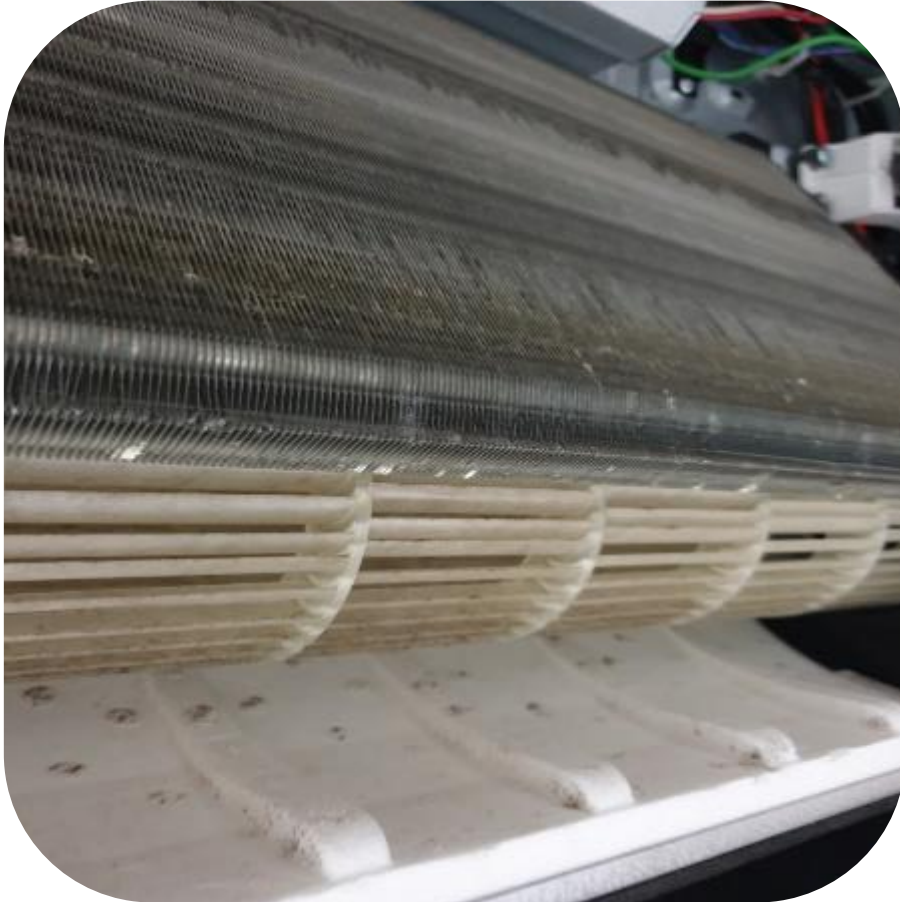

세척전




세척후

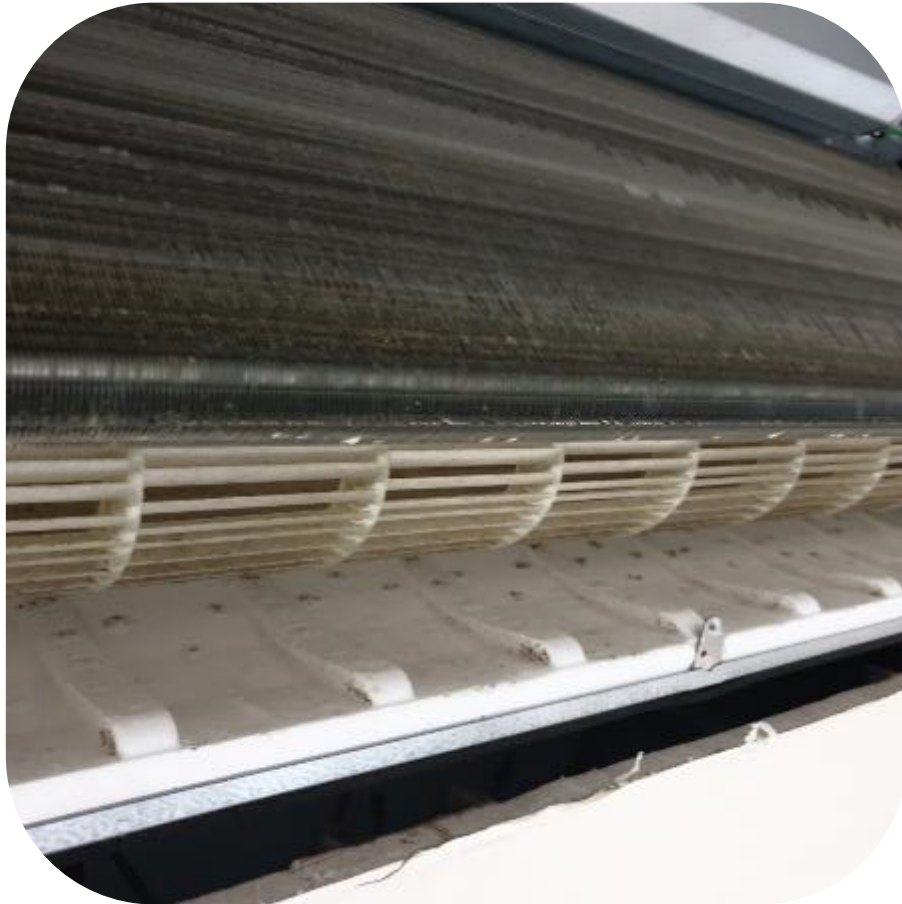

세척전



세척후

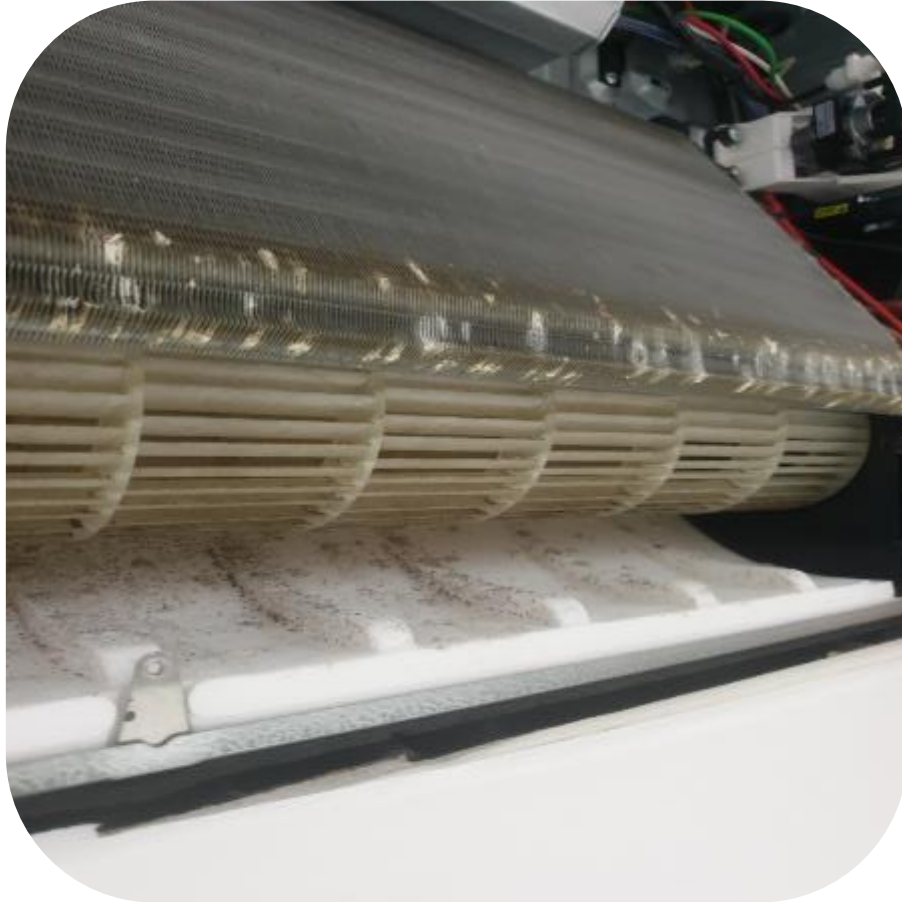

세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전



세척후



세척전




세척후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.01 - 2023.08.10
공 사 명	사택 104-301 수장공사		제출일자	2023.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

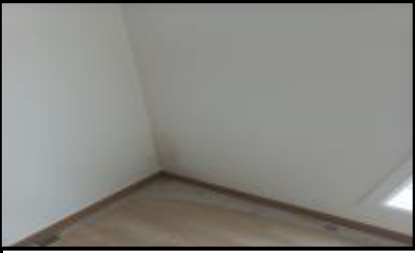업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.31 - 2023.07.31
공 사 명	사택 104-301 단열작업		제출일자	2023.08.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.08.08- 2023.08.08
공 사 명	기숙사 B동 세대용 공동현관 방화문 보수		제출일자	2023.08.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2023.07.26- 2023.07.26
공 사 명	임차사택 수장공사 부혜리(양극제 개발)		제출일자	2023.08.20
작업사진				
내 용	장판(작업전)	장판(철거후)	장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	구 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_104동-301호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70	✓	✓			
5.기타	거실샤시벽면 누수점검 및 단열재시공, 안방 천정들뜸 석고보강, 문골림(안방화장실문)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인) (23.08.22)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공사명 : 임차사택 수장공사 부해리												
1.도배	LG휘앙세 광폭											
	거실 벽면	㎡										
	거실 천정	㎡										
	방A 벽면	㎡										
	방A 천정	㎡										
	방B 벽면	㎡										
	방B 천정	㎡										
	방C 벽면	㎡										
	방C 천정	㎡										
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡										
소 계			0		0		0				0	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 칠거	㎡	15			3,849	57,735				57,735	
	방A 바닥 칠거	㎡	8			3,849	30,792				30,792	
	방B 바닥 칠거	㎡	7			3,849	26,943				26,943	
	방C 바닥 칠거	㎡	6			3,849	23,094				23,094	
	접착제(부분접착)	kg	4	16,157	64,628						64,628	
	거실 바닥	㎡	15	14,003	210,045	3,515	52,725				262,770	
	방A 바닥	㎡	8	14,003	112,024	3,515	28,120				140,144	
	방B 바닥	㎡	7	14,003	98,021	3,515	24,605				122,626	
	방C 바닥	㎡	6	14,003	84,018	3,515	21,090				105,108	
소 계			36		568,736		265,104			833,840		
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡										
소 계						0				0		
합 계					568,736		265,104		0		833,840	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩909,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 부해리 근무부서: 양주재개발 전화번호: 616-3401-5557 사택명: 3호 101호 304호
