

목록

5월 마감자료 목록_솔루션	1
5월 상반기 정산_솔루션	2
00 상반기 총괄_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축_기계))	3
슬라이드 1	3
슬라이드 2	4
01 상반기 정산_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축))	5
01 상반기 접수_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축))	6
02 상반기 매입계약_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축))	10
03 4월29일 상반기_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축))	11
04 5월08일 상반기_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축))	15
02 상반기 정산_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계))	19
01관리소 목록_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	20
02상반기 노임단가_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	21
03상반기 매입계약_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	22
04상반기 정산 갑지_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	23
05상반기 정산 내역서_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	24
06상반기 정산 증빙_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	27
5월 완료사진_솔루션	33
01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축))	34
02완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계))	35
03완료사진_(기숙사 3동 및 사택 102동 부스터 펌프용 압력탱크 교체)	40
04완료사진_(사택 5-104 화장실 이중천장 설치 및 돛천장 교체)	44
05완료사진_(사택 5-104 화장실 이중천장 유도배관 및 오배수 교체)	45
06완료사진_(사택 2-101 수장공사)	47
07완료사진_(사택 8-210 수장공사)	48
08완료사진_(사택 103-101 수장공사)	49
09완료사진_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체)	50
10완료사진_(기숙사 A동 301-2호 도배보수외 9세대)	61
11완료사진_(기숙사 3동 급탕 순환 펌프 교체)	62
12완료사진_(사택 7-508 외벽세대 단열작업)	63
13완료사진_(사택 9-505 베란다 다용도실 및 뒷 베란다 단열)	64
14완료사진_(임차사택 수장공사 김상우(Cell선행))	65
5월 완료확인서_솔루션	66
5월 체크시트_솔루션	67
06 체크시트_(사택 2-101 수장공사)	67
5월 체크시트_솔루션	67
07 체크시트_(사택 8-210 수장공사)	68
5월 체크시트_솔루션	68
08 체크시트_(사택 103-101 수장공사)	69

기숙사 및 사택 5월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

24-5-16

[illegible]

목 록

00	상반기 총괄_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축_기계))	1
	슬라이드 1: 건축	1
	슬라이드 2: 기계	2
01	상반기 정산_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축))	3
	01 상반기 접수_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축))	4
	02 상반기 매입계약_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축))	8
	03 4월29일 상반기_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축))	9
	04 5월08일 상반기_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축))	13
02	상반기 정산_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계))	17
	01관리소 목록_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	18
	02상반기 노임단가_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	19
	03상반기 매입계약_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	20
	04상반기 정산 갑지_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	21
	05상반기 정산 내역서_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	22
	06상반기 정산 증빙_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	25

[4월29일 접수]

견 적 서

수신인 : 주식회사 에스엔아이 엡스퍼트

공사명 : 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)

견적일 : 2024 년 04월 29일

등록번호

상 호

대표 이사

사업장

업 태

종 목

TEL, FAX

314-86-35718

㈜일성건축

상 석 회

대전 서구 도마동 107 (도마동)

건설업

실내건축,인테리어공사

042)527-0995, 042)527-0996

금액: 이천오백칠만팔천 원정

원정

NO	품명	규격	수량	단위	금액	비고
	직접비					
	재료비				3,510,778	
	노무비				17,618,130	
	기계/기타경비				-	
	소계				21,128,909	
	간접비					
	국민연금	노무비*4.5%	1	식	792,816	모든공사에 적용
	건강보험료	노무비*3.545%	1	식	624,563	모든공사에 적용
	장기요양보험료	건강보험료*12.95%	1	식	80,881	모든공사에 적용
	고용보험료	노무비*1.01%	1	식	177,943	모든공사에 적용
	산재보험료	노무비*3.56%	1	식	627,205	모든공사에 적용
	산업안전보건관리비	(재료비+노무비)*2.93%	1	식	619,077	모든공사에 적용
	일반관리비/이윤	(노무비+간접공사비)*5%	1	식	1,027,031	
	소계				3,949,516	
					25,078,424	
	합계(단수조정)				25,078,000	
	VAT별도					

25,078,000

- 1.순 작업시간 (404시간(특별인부)/일 8시간)=50.5일
- 2.작업 준비시간, 일일 01시간=31일, (31시간/8시간)=3.87일
- 3.현장 관리자 작업일 (31일 *현장관리자 일 0.8)=24.8일
- 4.식대=(작업자 69인+관리자 31인)*7,000=700,000
(식대700,000/특별인부208,527로 환산)=3.356일
- 5.긴급대응 인력 총 인원(82.5인)=50.5+3.87+24.8+3.356

*상기 M/D는 긴급대응을 위한, 최저 인건비를 반영한 것입니다.

[5월8일 접수]

견 적 서

수신인 : 주식회사 에스엔아이 엡스퍼트

공사명 : 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)

견적일 : 2024 년 05월 08일

등록번호

상 호

대표 이사

사업장

업 태

종 목

TEL, FAX

314-86-35718

㈜일성건축

상 석 회

대전 서구 도마동 107 (도마동)

건설업

실내건축,인테리어공사

042)527-0995, 042)527-0996

금액: 이천구십팔만칠천 원정

NO	품명	규격	수량	단위	금액	비고
	직접비					
	재료비				3,473,871	
	노무비				14,290,799	
	기계/기타경비				-	
	소계				17,764,671	
	간접비					
	국민연금	노무비*4.5%	1	식	643,086	모든공사에 적용
	건강보험료	노무비*3.545%	1	식	506,609	모든공사에 적용
	장기요양보험료	건강보험료*12.95%	1	식	65,606	모든공사에 적용
	고용보험료	노무비*1.01%	1	식	144,337	모든공사에 적용
	산재보험료	노무비*3.56%	1	식	508,752	모든공사에 적용
	산업안전보건관리비	(재료비+노무비)*2.93%	1	식	520,505	모든공사에 적용
	일반관리비/이윤	(노무비+간접공사비)*5%	1	식	833,985	
	소계				3,222,880	
					20,987,550	
	합계(단수조정)				20,987,000	
	VAT별도					

20,987,000

20,987,550

※ 산출근거 접수 예정 :우수관(4월29일X)+도어보수(4월29일X)+인원

- 정 산: 9,061,000(매입) * 7.5% = 9,740,575
- 이 월: 9,061,000(매입) * 7.5% = **11,246,425**

● 정 산: 8,897,000(매입) * 7.5% = 9,564,275 ● 이 월 : 배관(4)+보통(5)+차액(12,000) = 2,248,000 원

목록

01 상반기 접수_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)).....	1
02 상반기 매입계약_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)).....	5
03 4월29일 상반기_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)).....	6
04 5월08일 상반기_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)).....	10

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소 / 방충망 7개소 / 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
1	일성건축	3	1/25	13:00	1/25	16:30	9	406	관리소장	방충망 (구명수) 4개 문보수 (구진희, 이정민) 2개	
2	일성건축	4	1/26	13:00	1/26	16:10	9	406	관리소장	방충망 (구명수) 3개 누수배관교체 (구진희) 2개소 문보수 (정연두, 이정민) 1개 주방라임교체 (정연두) 1개소	교체완료 교체완료
3	일성건축	1	1/26	08:30	1/26	09:20	7	303	관리소장	주방 라임부분도배 (한명석)	
4	일성건축	1	1/26	09:30	1/26	10:30	8	205	관리소장	주방방 누수부분도배 (한명석)	
5	일성건축	3	1/29	09:00	1/29	16:20	8	408	관리소장	방충망 (구명수) 2개 주방라임부분보수 (구진희, 이정민) 보수완료. 뒷배관다시트지교체 (구명수) 교체완료	
6	일성건축	3	1/30	09:00	1/30	16:20	8 7	408 401	관리소장	도어보수 (구진희, 이정민) 보수완료 방충망 (구명수) 1개 방파라임보수 (구진희, 이정민) 방 2개소 불발장임완료.	
							5 5	404 205	관리소장	방충망 (구명수) 2개 화장실틀림철거 (구진희) 화장실틀림철거 (구진희)	
7	일성건축	3	1/31	09:30	1/31	16:30	5 5	404 205	관리소장	주방라임교체 (구진희, 이정민) 교체완료 화장실틀림교체 (구진희, 이정민) 틀림교체완료 뒷배관다시트지교체 (구명수, 구진희) 완료. 방충망 (구명수) 2개	
8	일성건축	3	2/1	09:00	2/1	16:30	5 2	205 104	관리소장	주방라임교체 (이정민, 구진희) 문틀물임사양 (이정민, 구진희) 교체완료 물림교체완료 방충망 (구명수) 5개	
9	일성건축	3	2/2	08:50	2/2	16:00	기숙사 AB동		관리소장	차량충입구 천정 집진구 설치 (구명수, 이정민) < 천정 집진구 2개소 설치완료 > 구진희	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
10	일성건축	1	2/6	10:30	2/6	11:30	9동 105호	105호	관리소장	거실. 부엌도배보수 (한명석)	
11	일성건축	2	2/7	13:00	2/7	16:00	101동	103호	관리소장	현관문 전진 및 보수 (구진회, 이정민)	
12	"	1	2/8	09:00	2/8	16:00	5동	203	관리소장	현관문 보수 완료. (이정민) 창고 문보수.	
						"	2동	305	관리소장	완료 (이정민) 질러 붙어 교체	
13	일성건축	2	2/22	09:00	2/22	16:20	5동	301	관리소장	방충망 7개 (구진회) 주방타일 보수 (이정민, 구진회)	
14	"	2	2/23	09:00	2/23	16:26	5동	301	관리소장	화장실 타일 보수, 거울 교체, 수납장 교체, (이정민, 구진회) 우수배관 교체 (구진회)	
15	"	2	2/26	09:00	2/26	16:20	5동	301	관리소장	현관 방화문 보수 (이정민, 구진회) 앞 드레싱 베란다 문보수. 화장실 우수배관보수	
16	"	2	2/27	14:00	2/27	16:20	2동	104	관리소장	화장실 문파손 및 뒤틀림보수. (구진회, 이정민)	
17	"	2	2/28	09:00	2/28	16:20	2동	104	관리소장	화장실 거울 교체, 수납장 교체 (구진회, 이정민) 화장실 문파손 및 뒤틀림보수	
18	"	2	3/4	09:00	3/4	16:20	A동	402-1 403-2	관리소장	바닥 데코타일보수, 벽체 석고보드 보수, 도어보수 도어보수, 발코니 창문 양면테이프로 제거 (구진회, 이정민.)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

샘플>	일성	3 (관리제외)	1월1일	14시30분	1월2일	15시30분	사택 5동	201	관리소 담당자	- 문골림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수	
건수	업체명	인원	시작		종료		건물동	호실	작업지시	보수 내용	비 고
			일자	시간	일자	시간					
19	일성건축	2	3/6	09:00	3/6	16:20	5	402	화장실	방충망 7개소 뒤편 베란다 상단 크랙보수 > (구진회, 김용철)	
						11	A-904	5	화장실	화장실 도어보수 천장보수(천장누수에 의한 보수) > (이성민, 김용철)	
20	"	2	3/8	13:00	3/8	16:20	A-701	1	화장실	벽채 세그먼트보수 화장실 배수처리 > (이성민, 구진회)	
21	"	2	3/11	09:00	3/11	16:40	A-701 704 B 701	1 4	화장실	화장실 타일공사 문보수 7개소 문보수 1개소 > (이성민, 구진회)	
						11	704	2	화장실	문보수 1개소 발코니 수납장 공판이 청소	
22	"	1	3/12	09:00	3/12	16:20	A-701	1	화장실	화장실 타일공사 (구진회)	
23	"	2	3/14	13:00	3/14	15:20	A-304 403	5 2	화장실	블라인드 블라인드 > (구진회, 김용철)	
24	"	2	3/18	09:00	3/18	16:00	1	306	화장실	방충망 2개소 양베란다 문수배관 보수 베란다 크랙보수 베란다 외부 창호 실리콘 작업 방충망 높이 조정 보수 4개소 > (구진회, 김용철)	
25	"	2	3/19	09:00	3/19	16:20	2	101	화장실	방충망 3개소 전선 걸레반이 부분 보수 벽면 크랙보수 문보수 2개소 > (구진회, 김용철)	
26	"	2	3/21	09:00	3/21	16:20	2	101	화장실	방충망 3개소 불바닥상 난방재 철거 및 시공 2개소 문당필름 제거 > (구진회, 김용철)	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

[illegible]

해당년도	1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월	
	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적
2024		○		○		○		○		○													○	

▲ 해당년도 입력 후 엔터 클릭시 해당년도 실적확인이 가능합니다

*견적제안방식이

매출계약정보

매입계약정보

작업계획

시공평가확인

이행증권

작업완료증빙

- 총액 : ①매출정보입력 ②매입정보입력 ③작업계획 ④작업완료증빙 으로 이동

- Cost-fee : ①매입정보입력 ②매출정보입력 ③작업계획 ④작업완료증빙 으로 이동

※ 변경계약시 낙찰매입계약정보에서 입력한 "정산시작일" 기준으로 계약 차수가 변경되니,
변경계약시 정산시작일을 정확히 명기바랍니다.

직접수행공사금액

PO요청

통합입찰발주요청

신규입찰내역서

시설보수입찰내역서

입찰내역서수정

발주/입찰생성

No.	☐	중공종	입찰명	계약방식	진행상태	매입계약기간	입찰담당자	매입예가	매입계약금액	협력업체	발주번호	입찰번호
1	☐	시설보수	[ESPR:92708454]기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)	표준단가계약	계약체결완료	2024-01-19 ~ 2024-12-31	이종근	9,061,000	9,061,000	(주)일성건축		FB24000742

4월29일 접수 견적

견 적 서

수신인 : 주식회사 에스엔아이 엣스퍼트

공사명 : 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)

견적일 : 2024 년 04월 29일

등록번호	314-86-35718
상 호	(주)일성건축
대표 이사	상 석 희
사업장	대전 서구 도마6길 107 (도마동)
업 태	건설업
종 목	실내건축,인테리어공사
TEL, FAX	042)527-0995, 042)527-0996

금액: 이천오백칠만팔천

원정

NO	품명	규격	수량	단위	금액	비고
	직접비					
	재료비				3,510,778	
	노무비				17,618,130	
	기계/기타경비				-	
	소계				21,128,909	
	간접비					
	국민연금	노무비*4.5%	1	식	792,816	모든공사에 적용
	건강보험료	노무비*3.545%	1	식	624,563	모든공사에 적용
	장기요양보험료	건강보험료*12.95%	1	식	80,881	모든공사에 적용
	고용보험료	노무비*1.01%	1	식	177,943	모든공사에 적용
	산재보험료	노무비*3.56%	1	식	627,205	모든공사에 적용
	산업안전보건관리비	(재료비+노무비)*2.93%	1	식	619,077	모든공사에 적용
	일반관리비/이윤	(노무비+간접공사비)*5%	1	식	1,027,031	
	소계				3,949,516	
					25,078,424	
	합계(단수조정)				25,078,000	
	VAT별도					

							▼낙찰율			▼낙찰율		
							83.5%			83.5%		
	주요내역		단위	수량	재료비		노무비		합계		합증기준	
합계	품목	규격			품셈/표단	금액	단가	금액				
L003	긴급보수 대응		특별인부(	M/D	82.5		-	208,527	17,203,478	17,203,478		
M011102302700101	개보수전용창		방충망 AL	m'	61.0	36,500	1,859,128		-	1,859,128		
M030209201300601	일반용 PVC관(직관)			본	3.0	31,000	77,655		-	77,655		
M010501400200101	W/T(벽타일)		IH, 250×400	m'	9.5	10,000	79,325		-	79,325		
M010501400300201	F/T(바닥타일)		GD, 200×200	m'	6	15,000	75,150		-	75,150		
M023900102300101	쌍공 세라픽스 9500F		합판 보드용 고급 타일본드(18kg)	Can	1	32,500	27,138		-	27,138		
M010603200600102	다우실 1000		1액형 실리콘, 발코니 창호 주위 조인트용(창틀용)	300ml CTG	21	8,000	140,280		-	140,280		
M011300902000101	항균결레받이		W:100×2.1T,	m	7.2	2,800	16,834		-	16,834		
M011300902000101	항균결레받이		W:100×2.1T,	m	14.4	2,800	33,667		-	33,667		
M023900402700101	REMIFLOW FS100		일반 바닥미장용, 40kg	포	1	6,000	5,010		-	5,010		
M011500101100101	알루미늄점검구450×450		450×450 (금속공사 시공=건설업등록)	개	2.0	6,500	10,855		-	10,855		
M012100500900101	롤스크린(단면암막)		방염, 기본면적: 2m'	m'	10.0	55,000	459,250		-	459,250		
M030700905100401	욕실수납장		KBC-030, 양문여닫이형(600×800)	개	2.0	74,200	123,914		-	123,914		
M030700905100601	욕실화장경		KBM-010, 전면거울(800×800)	개	2.0	33,300	55,611		-	55,611		
M011800900100101	석고평보드		9.5T× 900×1,800	매	4.0	5,000	16,700		-	16,700		
M012101000300101	단열벽지		두께 5mm, 1m×20m	R/L	2.0	46,400	77,488		-	77,488		
M041001200300601	NEW MULTI DAMPER		D150(렌지후드 전용)	개	1.0	83,000	69,305		-	69,305		
D02859	제 3호표 건축물 구조체별 철거(바닥 및 수장부분) 9-305호 1/30일 완료		리노룸	m'	23.0		-	4,855	93,240	93,240		
D02558	제 3호표 PVC계 바닥재 설치(바닥 깔기) 9-305호 1/30일 완료		시트(부분접합 방식)	m'	23.0		-	4,453	85,520	85,520		
M012003400500101	진양룸펄트 72"9-305호 1/30일 완료		주택용 바닥재 1.6T×1,830mm	m'	23.0	15,000	288,075		-	288,075		
M010602702400101	IPALG 조인트용 접착제(TB-100) 9-305호 1/30일 완료		시트용 접착제,	kg	1.0	15,000	12,525		-	12,525		
D02641	제 1호표 도배바름(벽면) 7-303호+8-205호+9-105호 부분도배		합판-석고보드면	m'	34.0		-	6,691	189,957	189,957		
D02873	제 6호표 건축물 구조체별 철거(벽) 7-303호+8-205호+9-105호 부분도배		벽지떼어내기	m'	34.0		-	1,618	45,935	45,935		
999999	베란다 우수배관 트랩		100A	EA	3.0	10,500	26,303		-	26,303		
999999	빨래건조대		베란다용(봉형)	Set	1.0	23,545	19,660		-	19,660		
999999	합지벽지(LG하우스스 위양세) 7-303호+8-205호+9-105호 부분도배		합지벽지(LG하우스스 위양세)	m'	34.0	1300	36,907		-	36,907		
							3,510,778		17,618,130	21,128,909		

1.순 작업시간 (404시간(특별인부)/일 8시간)=50.5일

2.작업 준비시간, 일일 01시간=31일, (31시간/8시간)=3.87일

3.현장 관리자 작업일 (31일 *현장관리자 일 0.8)=24.8일

4.식대=(작업자 69인+관리자 31인)*7,000=700,000

(식대700,000/특별인부208,527로 환산)=3.356일

5.긴급대응 인력 총 인원(82.5인)=50.5+3.87+24.8+3.356

*상기 M/D는 긴급대응을 위한, 최저 인건비를 반영한 것입니다.

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

건수	업체명	인원	시작		종료		작업시간 (종료-시작)	총시간 (인원*작업시간)	건물동	호실	작업지시	보수 내용	자재수량																	기타				
			일자	시간	일자	시간							방충망(개)	문수관(4m)	문수관트랩(개)	벽타일(m²)	바닥타일(m²)	타일본드(통)	코킹제(개)	길레받이(m)	문선물딩(m)	모르터(포)	점점구	블라인드(m²)	창수납장(개)	화장경(개)	석고보드	단열벽지(m²)	건조대(개)		앵크루트(개)	장판교제(m²)	도배(m²)	
1	일성건축	3	01월 25일	13:00	01월 25일	16:30	3:30	10 시간 30 분	9	406	남해권	방충망(주방수) : 4개 문보수 (구진회,이정만) : 2개	4																					
2	일성건축	4	01월 26일	13:00	01월 26일	16:10	3:10	12 시간 40 분	9	406	남해권	방충망(주방수): 3개/문수관(구진회): 2개소 문보수(정연두,이정만): 1개 주방타일교제(정연두,이정만)	3	2	2	0.5																우수관교제 2EA		
3	일성건축	0	01월 26일	8:30	01월 26일	9:20	표준단가 적용		7	303	남해권	주방 부분 도배(현명석)																				10	표준단가 적용	
4	일성건축	0	01월 26일	9:30	01월 26일	10:30	표준단가 적용		8	205	남해권	작은방 부분 도배(현명석)																				3	표준단가 적용	
5	일성건축	3	01월 29일	9:00	01월 29일	16:20	7:20	22 시간 00 분	8	408	남해권	방충망(주방수) : 7개 주방타일교제(정연두,이정만) 뒤배란다 시트 교체 (주영수) 문보수 (구진회,이정만)	7			0.5																	주방타일	
6	일성건축	3	01월 30일	9:00	01월 30일	16:20	7:20	22 시간 00 분	7/8	8-408 7-401	남해권	방충망(주방수) : 1개 방 바닥 보수 (구진회,이정만)	1						2.4		1												물딩=2.4m*1EA	
	일성건축								5	404 205	남해권	방 2개소 물딩 작업 방충망(주방수) : 7개 화장실 물딩 철거 (구진회)	7																				5-404 방충 7개	
7	일성건축	3	01월 31일	9:30	01월 31일	16:30	7:00	21 시간 00 분	5	404 205	남해권	방충망(주방수): 7개/주방타일교제(구진회,이정 만) 화장실 물딩 교제(구진회,이정만) 뒤배란다, 실리프(구진회,이정만)	7			0.5		2															물딩=2.4m*3EA=7.2	
8	일성건축	3	02월 01일	9:00	02월 01일	16:30	7:30	22 시간 30 분	2/5	2-104 5-205	남해권	방충망 (주방수): 5개 주방타일 교제(이정만,구진회) 문선물딩 교제(이정만,구진회) 주자장 임구록 누수 전장점점구 2개 (주영수,이정만,구진회)	5			0.5																	물딩=2.4m*1EA	
9	일성건축	3	02월 02일	8:50	02월 02일	16:00	7:10	21 시간 30 분	A8		남해권	거실 부분 도배 보수(현명석)										2												
10	일성건축	0	02월 06일	10:30	02월 06일	11:30	표준단가 적용		9	105	남해권	거실 부분 도배 보수(현명석)																					21	표준단가 적용
11	일성건축	2	02월 07일	13:00	02월 07일	16:00	3:00	06 시간 00 분	101	103	남해권	현관문 점검 및 보수(주영수,이정만)																						
12	일성건축	1	02월 08일	9:00	02월 08일	16:00	7:00	07 시간 00 분	5	203	남해권	현관 및 창고 문보수(이정만)																						
	일성건축								2	305	남해권	창고문 보수 및 길레받이 교체(이정만)							2.4														물딩=2.4m*1EA	
13	일성건축	2	02월 22일	9:00	02월 22일	16:20	7:20	14 시간 40 분	5	301	남해권	방충망 7개소(구진회) 주방타일 보수(이정만,구진회)	7			0.5																		
14	일성건축	2	02월 23일	9:00	02월 23일	16:26	7:26	14 시간 52 분	5	301	남해권	화장실타일 거름,수납장교제(이정만,구진회) 우수관 교체(구진회)		1	1			1						1	1									
15	일성건축	2	02월 26일	9:00	02월 26일	16:20	7:20	14 시간 40 분	5	301	남해권	현관 방화문보수(이정만,구진회) 배란다 창고문 및 화장실 우측방 문보수																						
16	일성건축	2	02월 27일	14:00	02월 27일	16:20	2:20	04 시간 40 분	2	104	남해권	화장실 문파손 및 뒤돌림보수(구진회,이정만)																						
17	일성건축	2	02월 28일	9:00	02월 28일	16:20	7:20	14 시간 40 분	2	104	남해권	화장실 거름,수납장 교제(구진회,이정만) 화장실 문파손 및 뒤돌림 보수 (배란다와 도어백제) 석고보드 보수													1	1							거름+수납장교제+도어경첩교제+도어틀들부분교제	
18	일성건축	2	03월 04일	9:00	03월 04일	16:20	7:20	14 시간 40 분	A	402-1 403-2	남해권	발코니 창문 양면테이프 제거 (구진회,이정만)															1							A402-1 석고보드
19	일성건축	2	03월 06일	9:00	03월 06일	16:20	7:20	14 시간 40 분	5	402	남해권	방주방 7개소(구진회,김용철) 뒤배란다 상단 크랙보수	7					2															코킹 철거후 재시공-코킹제	
	일성건축								A	904-5	남해권	화장실 도어 보수(구진회,김용철) 천장 보수(전남 누수) 백제석고물들보수															1						석고보드-1EA	
20	일성건축	2	03월 08일	13:00	03월 08일	16:20	3:20	06 시간 40 분	A	701-1	남해권	화장실 바닥 타일 철거 (이정만,구진회)																						석고보드-1EA
21	일성건축	2	03월 11일	9:00	03월 11일	16:40	7:40	15 시간 20 분	A B	A701-1 A704-4 8701-2	남해권	화장실 바닥 타일 설치 문 보수 2개소 (이정만,구진회)				4		10																바닥타일 전체교제+코킹제
	일성건축								8	704-2	남해권	문보수 1개소 발코니 수납장 곱팡이 제거 (이정만,구진회)																						
22	일성건축	1	03월 12일	9:00	03월 12일	16:20	7:20	07 시간 20 분	A	701-1	남해권	화장실 타일보수(구진회)					2		4															
23	일성건축	2	03월 14일	13:00	03월 14일	15:20	2:20	04 시간 40 분	A	304-5 403-2	남해권	블라인드 2개소(구진회,김용철)											10											
24	일성건축	2	03월 18일	9:00	03월 18일	16:00	7:00	14 시간 00 분	1	308	남해권	방충망 (주방수): 5개/배란다 누수방수교제 배란다 크랙보수 및 천장, 창문 창문문 방충망, 물막이조인트보수 4개소																						화확 작업 식재
25	일성건축	2	03월 19일	9:00	03월 19일	16:20	7:20	14 시간 40 분	2	101	남해권	방충망 3개 교제 거실 길레받이 부분 보수 백면 크랙 및 문 보수 2개소 (구진회,김용철) 방충망 3개 교제	3					2	2.4															물딩=2.4m*1EA
26	일성건축	2	03월 21일	9:00	03월 21일	16:20	7:20	14 시간 40 분	2	101	남해권	불박이창 단열재 철거 및 시공 2개소 물딩 필름 제거 (구진회,김용철)	3														20						불박이창 2개소 단열	
27	일성건축	2	03월 22일	13:00	03월 22일	15:00	2:00	04 시간 00 분	3	지하	남해권	여차 미화왕 욕실타일 철거(구진회,김용철)																						
28	일성건축	3	03월 25일	9:00	03월 25일	16:30	7:30	22 시간 30 분	3 2	지하 101	남해권	여차 미화왕 욕실타일 설치(이정만) 물딩 필름 시공,크랙보수,불박이창 단열재시공 (구진회,김용철)				6		1									20							벽타일 +타일본드+불박이창 2개소-단열 백지
29	일성건축	2	03월 26일	13:00	03월 26일	16:30	3:30	07 시간 00 분	8	210	남해권	방충망 3개소(구진회) 화장실 타일 철거(이정만) 방충망 4개소 / 화장실 타일 교제 (구진회,이정만)	3																					
30	일성건축	2	03월 27일	9:00	03월 27일	15:30	6:30	13 시간 00 분	8	210	남해권	방문 보수 2개소 (구진회,이정만)	4			0.5																		화장실 타일
31	일성건축	2	04월 04일	9:00	04월 04일	11:30	2:30	05 시간 00 분	A	301-2 401-2	남해권	문보수 3개소(구진회,이정만)																						
	일성건축	2	04월 04일	13:00	04월 04일	16:20	3:20	06 시간 40 분	5	204	이종근	화장실 타일 보수(구진회,이정만)				0.5																		
32	일성건축	2	04월 05일	9:00	04월 05일	16:40	7:40	15 시간 20 분	A	401-2 401-5 703-5 901-2	남해권	문보수 4개소 석고보드 백제 들뜸(401-5) (구진회,이정만)														1								A401-5 석고보드
33	일성건축	2	04월 08일	9:00	04월 08일	16:30	7:30	15 시간 00 분	8 2 103	903-2 101 103	남해권	문보수 1개소(903-2) 빨래건조대, 가스렌지 후드(2-101) 백제 단열재 보수(103-101) (구진회,이정만)																1	1					2-101 건조대+가스렌지 후드
34	일성건축	0	01월 30일		01월 30일		표준단가 적용		9	305	남해권	거실+주방 장판보수+누수에 의한 오염으로 교제..관리사무소 요청전, 1.3m*1.8=23.4㎡ 수량																		23			표준단가 적용	
합 계		69					합계	182 시간 16 분	403	계합 62 분			61	3	3	9.5	6	1	21	7.2	14.4	1	2	10	2	2	4	40	1	1	23	34		

표준내역 구분	세부공종	품명	규격	단위	수량	재료비단가
999999	수장공사	시중가	빨래건조대	EA	1	25,900
999999	수장공사	시중가	베란다 우수배관 트랩	EA	3	10,500
999999	수장공사	벽지(LG 휘양세 장폭합지)물가자료 2023.11	(LG 휘양세 장폭합지)	M2	34	1,086

표준내역선택

구분 | 물가정보

구분 | 전체 | 전체 | 전체 | 코드 | 품명 | 방종 | 규격 | 단위

입찰내역상세 - 물가정보

조회시 구분, 코드, 품명 중에 1개 이상 입력후 조회바랍니다.

No.	물가정보코드	구분종	구분소	품명	규격	단위	조사단계	가격	페이지	메이커명
1	☐	MD11101101500101	창포재	일루이브단열창문틀	방종양	Set	가중격	51,600	563	세라렘
2	☐	MD11101400800101	창포재	플라스틱창문틀(2	DBF-116N 미서기(방충망제일패)	Set	가중격	72,630	565	대우하이원사시
3	☐	MD111014003400101	창포재	플라스틱창문틀(2	DBF-116N 미서기(방충망제일패)	Set	가중격	81,270	565	대우하이원사시
4	☐	MD111014006000101	창포재	플라스틱창문틀(2	DBF-116N 미서기(방충망제일패)	Set	가중격	93,530	565	대우하이원사시
5	☐	MD111014008200101	창포재	플라스틱창문틀(2	DBF-116N 미서기(방충망제일패)	Set	가중격	102,820	565	대우하이원사시
6	☐	MD11101410800101	창포재	플라스틱창문틀(2	DBF-116N 미서기(방충망제일패)	Set	가중격	115,070	565	대우하이원사시

구분 | 물가정보

구분 | 전체 | 전체 | 전체 | 코드 | 품명 | 방종용 PVC | 규격 | 100 | 단위

입찰내역상세 - 물가정보

조회시 구분, 코드, 품명 중에 1개 이상 입력후 조회바랍니다.

No.	물가정보코드	구분대	구분종	구분소	품명	규격	단위	조사단계	가격	페이지	메이커명	
1	☒	M030209201300601	급배수·위생설비	배관재(II)	MID내충격PVC하수관(46-VG1.2)	일반용 PVC관-VG1(직관)	100A	본/4m	가중격	40,040	763	유영화학

표준내역선택

구분 | 표준노임

직종코드 | 직종명 |

입찰내역상세 (123 건)

No.		직종코드	직종명	기준단가	단위	
1	☐	L002	보통인부	153,671	인	
2	☐	L009	철공	211,415	인	
3	☐	L003	특별인부	192,375	인	



하드웰 천장 베란다 빨래건조대 스틸프레임 코팅봉 표준형 설치 국내 자체 생산 [오늘출발](#)

10% ~~28,900원~~ **25,900원**

하드웰 직영몰 고객을 위한 혜택

최대 적립 포인트

1,359원 ?

기본적립

259원

TIP. 포인트 더 받는 방법

+최대 2,331 원

N+ 멤버십

최대 5% 적립, 무료 시작 >

1,036원

N+ 멤버십

네이버, 현대카드로 결제 시 >

1,295원

N 2%

네이버페이 머니로 결제 시 >

518원

N+ 놓치고 있는 5% 적립 포기하시겠어요?

>

무이자할부 | 카드 자세히보기 ?

이벤트 | 5만원 이상 3개월 무이자 할부

SSG.COM / 육실용품 | / 기타육실용품 |

OMT >

OMT 3중차단 베란다 하수구 냄새차단 우수관 개폐기 날파리트랩

★★★★★ 4.7 (4건)

10,500원~

UNIVERSE

유니버스 클럽은 가입하자마자 3만원에 매일 최대, 11만원 할인까지

신세계 유니버스 클럽 시작하기 >

카드혜택가

9,177 원~

무이자

카드사별 무이자 혜택

최대 7% 적립 + 매일 3,900원 쉼머니 제공, SSG.COM카드 Edition2

>

배송정보

택배배송 한정택배

12/14(목) 도착 예정

배송비

2500원

제주 3,000원, 도서산간 5,000원 추가

5월08일 접수 견적

견 적 서

수신인 : 주식회사 에스엔아이 엡스퍼트

공사명 : 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)

견적일 : 2024 년 05월 08일

등록번호	314-86-35718
상 호	(주)일성건축
대표 이사	상 석 희
사업장	대전 서구 도마6길 107 (도마동)
업 태	건설업
종 목	실내건축,인테리어공사
TEL, FAX	042)527-0995, 042)527-0996

금액: 이천구십팔만칠천 원정

NO	품명	규격	수량	단위	금액	비고
	직접비					
	재료비				3,473,871	
	노무비				14,290,799	
	기계/기타경비				-	
	소계				17,764,671	
	간접비					
	국민연금	노무비*4.5%	1	식	643,086	모든공사에 적용
	건강보험료	노무비*3.545%	1	식	506,609	모든공사에 적용
	장기요양보험료	건강보험료*12.95%	1	식	65,606	모든공사에 적용
	고용보험료	노무비*1.01%	1	식	144,337	모든공사에 적용
	산재보험료	노무비*3.56%	1	식	508,752	모든공사에 적용
	산업안전보건관리비	(재료비+노무비)*2.93%	1	식	520,505	모든공사에 적용
	일반관리비/이윤	(노무비+간접공사비)*5%	1	식	833,985	
	소계				3,222,880	
					20,987,550	
	합계(단수조정)				20,987,000	
	VAT별도					

							▼낙찰율		▼낙찰율	
							83.5%		83.5%	
	주요내역		단위	수량	재료비		노무비		합계	할증기준
합계	품목	규격			품셈/표단	금액	단가	금액		
L003	긴급보수 대응	특별인부(	M/D	57.0		-	208,527	11,886,039	11,886,039	산출근거
M011102302700101	개보수전용창	방충망 AL	m²	61.0	36,500	1,859,128		-	1,859,128	
M030209201300601	일반용 PVC관(직관)		본	3.0	31,000	77,655		-	77,655	
M010501400200101	W/T(벽타일)	IH, 250×400	m²	9.5	10,000	79,325		-	79,325	
M010501400300201	F/T(바닥타일)	GD, 200×200	m²	6	15,000	75,150		-	75,150	
M023900102300101	쌍공 세라픽스 9500F	합판 보드용 고급 타일본드(18kg)	Can	1	32,500	27,138		-	27,138	
M010603200600102	다우실 1000	1액형 실리콘, 발코니 창호 주위 조인트용(창틀용)	300ml CTG	21	8,000	140,280		-	140,280	
M011300902000101	항균걸레받이	W:100×2.1T,	m	7.2	2,800	16,834		-	16,834	
M011300902000101	항균걸레받이	W:100×2.1T,	m	14.4	2,800	33,667		-	33,667	
M023900402700101	REMIFLOW FS100	일반 바닥미장용, 40kg	포	1	6,000	5,010		-	5,010	
M011500101100101	알루미늄점검구450×450	450×450 (금속공사 시공=건설업등록)	개	2.0	6,500	10,855		-	10,855	
M012100500900101	롤스크린(단면암막)	방염, 기본면적: 2m²	m²	10.0	55,000	459,250		-	459,250	
M030700905100401	욕실수납장	KBC-030, 양문여닫이형(600×800)	개	2.0	74,200	123,914		-	123,914	
M030700905100601	욕실화장경	KBM-010, 전면거울(800×800)	개	2.0	33,300	55,611		-	55,611	
M011800900100101	석고평보드	9.5T× 900×1,800	매	4.0	5,000	16,700		-	16,700	
M012101000300101	단열벽지	두께 5mm, 1m×20m	R/L	2.0	46,400	77,488		-	77,488	
M041001200300601	NEW MULTI DAMPER	D150(렌지후드 전용)	개	1.0	83,000	69,305		-	69,305	
D02859	제 3호표 건축물 구조체별 철거(바닥 및 수장부분) 9-305호 1/30일 완료	리노룸	m²	23.0		-	4,855	93,240	93,240	
D02558	제 3호표 PVC계 바닥재 설치(바닥 깔기) 9-305호 1/30일 완료	시트(부분접합 방식)	m²	23.0		-	4,453	85,520	85,520	
M012003400500101	진양름펫트 72"9-305호 1/30일 완료	주택용 바닥재 1.6T×1,830mm	m²	23.0	15,000	288,075		-	288,075	
M010602702400101	IPALG 조인트용 접착제(TB-100) 9-305호 1/30일 완료	시트용 접착제,	kg	1.0	15,000	12,525		-	12,525	
999999	도어 보수	개소당	EA	26.0		-	72,000	1,872,000	1,872,000	산출근거
999999	베란다 우수배관 트랩	100A	EA	3.0	10,500	26,303		-	26,303	
999999	우수관 교체	개소당	EA	3.0		-	118,000	354,000	354,000	산출근거
999999	빨래건조대	베란다용(봉형)	Set	1.0	23,545	19,660		-	19,660	
						3,473,871		14,290,799	17,764,671	

긴급보수 및 비품성 작업 관리대장 (건축)

건수	업체명		인원	시작		종료		작업시간	총시간	건물종	호실	작업지시	보수 내용	자재수량																							
				일자	시간	일자	시간	(종료-시간)	(인원*작업시간)					기타 장공 사(특별인 부)	방충망(개)	도어보수 (개소)	우수관(4m 본)	우수관트랩 (개)	벽타일(㎡)	벽타일방 (㎡)	타일본드 (통)	코킹재(개)	걸레받이 (㎡)	윤선물딩 (㎡)	모르터(포)	점결구	불라인드 (㎡)	화장수납장 (개)	화장경(개)	석고보드	단열벽지 (㎡)	전조대(개)	형크후드 (개)	장판교제 (㎡)	기타		
1	일성건축	4	3	01월 25일	13:00	01월 25일	16:30	3:30	10 시간 30 분	9	406	남해원	방충망(중형수) : 4개 문보수 (구진회,이정민) : 2개 방충망(중형수): 3개/우수관(구진회): 2개소 문보수(정연두, 이정민): 1개 주방타일교체(정연두, 이정민)		4	2																					
2	일성건축	5	4	01월 26일	13:00	01월 26일	16:10	3:10	12 시간 40 분	9	406	남해원	방충망(중형수): 7개 주방타일교제(정연두, 이정민) 틸베란다 시트 교체 (주연수) 문보수 (구진회,이정민)	3	3	1	2	2	0.5															우수관교제-2EA			
3	일성건축		1	01월 26일	8:30	01월 26일	9:20	0:50	00 시간 50 분	7	303	남해원	주방 부분 도배(한명식)	0.5																				재료비 포함			
4	일성건축		1	01월 26일	9:30	01월 26일	10:30	1:00	01 시간 00 분	8	205	남해원	작업방 부분 도배(한명식)	0.5																				재료비 포함			
5	일성건축	4	3	01월 29일	9:00	01월 29일	16:20	7:20	22 시간 00 분	8	408	남해원	방충망(중형수): 7개 주방타일교제(정연두, 이정민) 틸베란다 시트 교체 (주연수) 문보수 (구진회,이정민)	2	7				0.5															주방타일			
6	일성건축	4	3	01월 30일	9:00	01월 30일	16:20	7:20	22 시간 00 분	7/8	8-408 7-401	남해원	방충망(중형수) : 1개 방 2개소 용단 작업 방충망(중형수): 7개 화장실 용단 철거 (구진회)	3	1	1					2.4		1											물딩=2.4m*1EA			
	일성건축									5	404 205	남해원	방충망(중형수): 7개/주방타일교제(구진회,이정민)		7																			5-404 방충 7개			
7	일성건축	4	3	01월 31일	9:30	01월 31일	16:30	7:00	21 시간 00 분	5	404 205	남해원	방충망(중형수): 7개/주방타일교제(구진회,이정민) 화장실 용단 교체(구진회, 이정민) 틸베란다 실리콘(구진회, 이정민)	3	7				0.5		2		7.2											물딩=2.4m*3EA=7.2			
8	일성건축	4	3	02월 01일	9:00	02월 01일	16:30	7:30	22 시간 30 분	2/5	2-104 5-205	남해원	방충망 (중형수): 5개 주방타일 교체(이정민, 구진회) 문서용단 교체(이정민, 구진회) 주차장 입구쪽 누수 전장점검구 2개 (주연수,이정민,구진회)	3	5			0.5				7.2												물딩=2.4m*1EA			
9	일성건축	4	3	02월 02일	8:50	02월 02일	16:00	7:10	21 시간 30 분	A8		남해원	거실 부분 도배 (문보수,한명식)	3											2										재료비 포함		
10	일성건축		1	02월 06일	10:30	02월 06일	11:30	1:00	01 시간 00 분	9	105	남해원	현관문 점검 및 보수(주영수,이정민)	1																							
11	일성건축	3	2	02월 07일	13:00	02월 07일	16:00	3:00	06 시간 00 분	101	103	남해원	현관 및 창고 문보수(이정민)	2			1																				
12	일성건축	2	1	02월 08일	9:00	02월 08일	16:00	7:00	07 시간 00 분	5	203	남해원	현관 및 창고 문보수(이정민)	2			1																				
	일성건축									2	305	남해원	창고문 보수 및 걸레받이 교체(이정민)	1		1								2.4											물딩=2.4m*1EA		
13	일성건축	3	2	02월 22일	9:00	02월 22일	16:20	7:20	14 시간 40 분	5	301	남해원	방충망 7개소(구진회) 주방타일 보수(이정민, 구진회)	2	7				0.5																		
14	일성건축	3	2	02월 23일	9:00	02월 23일	16:26	7:26	14 시간 52 분	5	301	남해원	화장실타일,거실,수납장교제(이정민,구진회) 우수관 교체(구진회)	2			1	1			1				1	1											
15	일성건축	3	2	02월 26일	9:00	02월 26일	16:20	7:20	14 시간 40 분	5	301	남해원	현관 방충망보수(이정민, 구진회) 배란다 창고문 및 화장실 유체발 문보수	2		2																					
16	일성건축	3	2	02월 27일	14:00	02월 27일	16:20	2:20	04 시간 40 분	2	104	남해원	화장실 문바스 및 뒤돌림보수(구진회,이정민)			1																					
17	일성건축	3	2	02월 28일	9:00	02월 28일	16:20	7:20	14 시간 40 분	2	104	남해원	화장실 거실,수납장 교체(구진회,이정민) 화장실 문바스 및 뒤돌림 보수 대코타일도어,벽체석고보드 보수 발코니 창문 양면테이프 제거 (구진회,이정민)	2																					거실+수납장교제+도어양면테이프+도어뒤돌림부분교제		
18	일성건축	3	2	03월 04일	9:00	03월 04일	16:20	7:20	14 시간 40 분	A	402-1 403-2	남해원	방충망 7개소(구진회,김용철) 틸베란다 창단 크랙보수	2		1																			A402-1 석고보드		
19	일성건축	3	2	03월 06일	9:00	03월 06일	16:20	7:20	14 시간 40 분	5	402	남해원	방충망 7개소(구진회,김용철) 화장실 도어 보수(구진회,김용철)	1	7						2														코킹 철거후 재시공-코킹재		
	일성건축									A	904-5	남해원	화장실 도어 보수(구진회,김용철) 천장 보수(천장 누수) 벽체석고돌림보수	1		1														1				석고보드-1EA			
20	일성건축	2	2	03월 08일	13:00	03월 08일	16:20	3:20	06 시간 40 분	A	701-1	남해원	화장실 벽타일 철거 (이정민,구진회)	2																					석고보드-1EA		
21	일성건축	2	2	03월 11일	9:00	03월 11일	16:40	7:40	15 시간 20 분	A B	A701-1 A704-4 B701-2	남해원	화장실 벽타일 설치 문 보수 2개소 (이정민,구진회) 문보수 1개소	1		2			4		10													벽타일 +타일본드+불박이장 2개소-단열 벽지			
	일성건축									B	704-2	남해원	발코니 수납장 공방이 제거 (이정민,구진회)	1		1																					
22	일성건축	1	1	03월 12일	9:00	03월 12일	16:20	7:20	07 시간 20 분	A	701-1	남해원	화장실 타일보수(구진회)	1								4															
23	일성건축	2	2	03월 14일	13:00	03월 14일	15:20	2:20	04 시간 40 분	A	304-5 403-2	남해원	화장실 타일보수(구진회,김용철)													10											
24	일성건축		2	03월 18일	9:00	03월 18일	16:00	7:00	14 시간 00 분	1	306	남해원	방충망 교체 2개/틸베란다 우수관교제 배란다 크랙보수 및 외부 상부 실리콘 방충망 높이 조정보수 4개소 (구진회,김용철)	화학 작업 삭제																							
25	일성건축	3	2	03월 19일	9:00	03월 19일	16:20	7:20	14 시간 40 분	2	101	남해원	방충망 3개 교체 거실 걸레받이 부분 보수 벽면 크랙 및 문 보수 2개소 (구진회,김용철) 방충망 3개 교체	2	3	2					2	2.4													물딩=2.4m*1EA		
26	일성건축	3	2	03월 21일	9:00	03월 21일	16:20	7:20	14 시간 40 분	2	101	남해원	불박이장 단열재 철거 및 시공 2개소 용단 필름 제거 (구진회,김용철)	2	3												20								불박이장 2개소 단열		
27	일성건축	3	2	03월 22일	13:00	03월 22일	15:00	2:00	04 시간 00 분	3	지하	남해원	여차 미화물 육살타일 철거(구진회,김용철)	1																							
28	일성건축	4	3	03월 25일	9:00	03월 25일	16:30	7:30	22 시간 30 분	3 2	101	남해원	여차 미화물 육살타일 설치(이정민) 용단 필름 시공,크랙보수,불박이장 단열재시공 (구진회,김용철)	3					6		1					20									벽타일 + 타일본드+불박이장 2개소-단열 벽지		
29	일성건축	3	2	03월 26일	13:00	03월 26일	16:30	3:30	07 시간 00 분	8	210	남해원	방충망 3개소(구진회) 화장실 타일 철거(이정민)	1	3																						
30	일성건축	3	2	03월 27일	9:00	03월 27일	15:30	6:30	13 시간 00 분	8	210	남해원	방충망 4개소 / 화장실 타일 교체 방문 보수 2개소 (구진회,이정민)	1	4	2		0.5																	화장실 타일		
31	일성건축	3	2	04월 04일	9:00	04월 04일	11:30	2:30	05 시간 00 분	A	301-2 401-2	남해원	문보수 3개소(구진회,이정민)			3																					
	일성건축	3	2	04월 04일	13:00	04월 04일	16:20	3:20	06 시간 40 분	5	204	이종근	화장실 타일 보수(구진회,이정민)	2					0.5																		
32	일성건축	3	2	04월 05일	9:00	04월 05일	16:40	7:40	15 시간 20 분	A	401-2 401-5 703-5 901-2	남해원	문보수 4개소 석고보드 벽체 돌출(401-5) (구진회,이정민)	2		4														1					A401-5 석고보드		
33	일성건축	3	2	04월 08일	9:00	04월 08일	16:30	7:30	15 시간 00 분	8 2 103	101 101	남해원	문보수 1개소(903-2) 블래건조대, 가스렌지 후드(2-101) 벽체 단열재 보수(103-101) (구진회,이정민)	2		1											1			1				2-101 건조대+가스렌지 후드			
34	일성건축		0	01월 30일		01월 30일			표준단가 적용	9	305	남해원	거실+주방 장판보수+누수예 요형으로 교체, 관리사무소 요청건, 13m*1.8=23.4㎡ 수합+																				23	표준단가 적용			
합 계		93	72					합계	188 시간 88 분	496	시간 42 분			57	61	26	3	3	9.5	6	1	21	7.2	14.4	1	2	10	2	2	4	40	1	1	23			

표준내역코드	세부공종	품명	규격	단위	수량	재료비단가	재료비소계	노무비단가	노무비소계
999999	수장공사	시중가	빨래건조대	EA	1	25,900			
999999	수장공사	시중가	란다 우수배관 트	EA	3	10,500			
999999	수장공사	시중가	도어보수	EA	3			72,000	
999999	수장공사	시중가	우수관 교체	EA	3			118,000	

표준내역선택

구분
물가정보

구분
전체

전체

전체

코드

품명
방충

규격

단위

입찰내역상세 - 물가정보
조희시 구분, 코드, 품명 중에 1개 이상 입력후 조회바랍니다.

No.		물가정보코드	구분종	구분소	품명	규격	단위	조사단계	가격	페이지	메이커명
1	☐	M011101101500101	창호재	알루미늄단열창문틀	방충망	1,000×1,000mm 나노세라믹코트 창호재(압출바,커튼블/신기술 제284호 인증	Set	가공격	51,600	563	세라현
2	☐	M011101400800101	창호재	플라스틱창문틀(2)	DBF-116N 미서기(방충망레일함)	벽색, 98×1,000×1,000mm	Set	가공격	72,630	565	대우하이원사시
3	☐	M011101403400101	창호재	플라스틱창문틀(2)	DBF-116N 미서기(방충망레일함)	내부합평(일반), 98×1,000×1,000mm	Set	가공격	81,270	565	대우하이원사시
4	☐	M011101406000101	창호재	플라스틱창문틀(2)	DBF-116N 미서기(방충망레일함)	양면(일반), 98×1,000×1,000mm	Set	가공격	93,530	565	대우하이원사시
5	☐	M011101408200101	창호재	플라스틱창문틀(2)	DBF-116N 미서기(방충망레일함)	벽색+외부합평(고내후), 98×1,000×1,000mm	Set	가공격	102,820	565	대우하이원사시
6	☐	M011101410800101	창호재	플라스틱창문틀(2)	DBF-116N 미서기(방충망레일함)	내부합평+외부합평(고내후), 98×1,000×1,000mm	Set	가공격	115,070	565	대우하이원사시

구분
물가정보

구분
전체

전체

전체

코드

품명
일반용 PVC

규격
100

단위

입찰내역상세 - 물가정보
조희시 구분, 코드, 품명 중에 1개 이상 입력후 조회바랍니다.

표준내역선택

구분
표준노임

직종코드

직종명

입찰내역상세 (123 건)

No.		직종코드	직종명	기준단가	단위	
1	☐	L002	보통인부	153,671	인	
2	☐	L009	철공	211,415	인	
3	☐	L003	특별인부	192,375	인	

SSG.COM / 욕실용품 ☎ / 기타욕실용품 ☎



OMT >

OMT 3중차단 베란다 하수구 냄새차단 우수관 개폐기 날파리트랩

★★★★★ 4.7 (4건)

10,500원~

UNIVERSE

유니버스 클럽은 가입하자마자 3만원에 배틀 치대. 11만원 할인까지

신세계 유니버스 클럽 시작하기 >

카드혜택가

9,177 원~

무이자

카드사별 무이자 혜택 ☎

최대 7% 적립 + 매달 3,900원 쓱머니 제공, SSG.COM카드 Edition2 >

배송정보

택배배송 한정택배 ☎

12/14(목) 도착 예정 ☎

배송비

2500원

제주 3,000원, 도서산간 5,000원 추가 ☎

BEST



하드웰 천장 베란다 빨래건조대 스틸프레임 코팅봉 표준형 설치 국내 자체 생산

오늘출발

10%

28,900원 25,900원

하드웰 직영몰 고객을 위한 혜택

최대 적립 포인트

1,359원 ?

기본적립

250원

TIP. 포인트 더 받는 방법

+최대 2,331 원

N +

멤버십

최대 5% 적립, 무료 시약 >

1,036원

N +

멤버십

네이버, 현대카드로 결제 시 >

1,295원

☎ 2%

네이버페이,머니루 결제 시 >

518원

N +

놓치고 있는 5% 적립 포기하시겠어요?

>

무이자할부 | 카드 자세히보기 ?

이벤트 5만원 이상 3개월 무이자 할부

목록

01관리소 목록_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계).....	1
02상반기 노임단가_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계).....	2
03상반기 매입계약_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계).....	3
04상반기 정산 감지_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계).....	4
05상반기 정산 내역서_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계).....	5
06상반기 정산 증빙_기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계).....	6

긴급보수 관리 현황 목록 (사택 관리소 접수분)

상반기 정산: 10건 / 무상: 10건(부분포함) / 하반기 이월(부분포함) : 5건

긴급 투입인원 환산 (S&I)

이월(미정산)

번호	일자	호실	점검유무	누수위치	보수내용	보수업체	보수인원	특이사항	정산 현황	구분	배관공	보통인부	보온공	화기감시 (보통인부)	안전관찰자 (보통인부)	누수탐지	배관공	보통인부	
1	1월 2일	5-405	x	주방	5동 405호 주방 난방분배기 교체 및 주방 싱크수전 이설	동운	2	PR발행	N/A	-									
2	1월 18일	9-205	O	화장실	9동 205호 화장실문 입구 바닥 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업	아트 ENG(미래)	2	산소용접	대상	2				1		1			
3	1월 19일	9-106	O	화장실	9동 106호 화장실 샤워수전아래 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업	아트 ENG(미래)	2	산소용접	대상	2				1		1			
4	2월 5일	8-109	O	화장실	8동 109호 화장실 양변기뒤 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감 작업	아트 ENG(미래)	2	산소용접	대상	2				1		1			
5	2월 6일	9-406	x	주방	9동 406호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2		대상	2	1	1							
6	2월 6일	AB동	x	AB동 지하기계실	AB동 지하기계실 급탕대류펌프(예비2번) 보수 작업 (매커니컬설,배어링,임펠라 교체)	아트 ENG(신흥)	2		대상	2	2								
7	2월 6일	AB동	x	AB동 1층 공용 남자화장실	AB동 1층 공용 남자화장실 소변기(지하주차장 상부) 배관 교체 및 소변기 설치	아트 ENG	2		무상	-									
8	2월 13일	AB동	x	AB동 지하주차장 램프구간	AB동 지하주차장 램프 구간 천장 오수배관 PPI DRF 원터치 Y 소켓 100A PVC 이음관 3개 교체	아트 ENG	4		대상	4	1	3							
9	2월 13일	8-408	x	주방	8동 408호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2		무상	-									
10	2월 14일	5-301	x	주방	5동 301호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2		대상	2	1	1							
11	2월 14일	5-404	x	주방	5동 404호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2		무상	-									
12	2월 21일	AB동	x	AB동 지하주차장 램프구간	AB동 지하주차장 램프 구간 천장 오수배관 교체한 부분 보온작업	아트 ENG	2		대상	2		1	1						
13	2월 21일	5-205	x	화장실	5동 205호 화장실 양변기 교체	아트 ENG	2		무상	-									
14	2월 26일	5-205	x	주방	5동 205호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2		대상	2	1	1							
15	2월 27일	8-506	O	주방	8-506호 작년 주방 누수 보수한 배관부위 미세하게 비쳐서 부속 조이고 미장처리함	아트 ENG(미래)	2		무상	1							1		
16	2월 27일	3동	x	기계실	3동 지하 기계실 난방배관 누수로 인하여 배관 보수	아트 ENG	3	산소용접	대상	3	1	1		1					
17	3월 6일	5-402	x	주방	5동 402호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2		부분이월	1	1							1	
18	3월 6일	9-104	x	주방	9동 104호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2		무상	-									
19	3월 6일	3동	x	기계실	3동 지하 기계실 난방배관 보수부위 보온작업 (2.27 작업건 마무리 작업)	아트 ENG	2		무상	-									
20	3월 7일	8-210	x	주방, 앞,뒤베란다	1. 8동 210호 주방 5구 난방분배기 교체(완료) 2.. 앞,뒤베란다 수전배관(3개)및 배관부분 교체작업(미완료) 철거만 진행(배관부속 없어서 익일진행예정)	아트 ENG	2		이월	-							1	1	
21	3월 8일	8-210	x	앞,뒤베란다	8동 201호 앞뒤베란다 수전배관 부분 교체, 철거부분 미장작업 (수전3개는 도색공사 완료후 설치예정)	아트 ENG	2		이월	-							1	1	
22	4월 2일	2-306	x	주방	2동 306호 난방분배기(마감캡 부식으로 교체) 보수	아트 ENG	2		이월	-							1	1	
23	4월 2일	2-402	x	주방	2동 402호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2		무상	-									
24	4월 2일	5-104	x	주방	5동 104호 주방 4구 난방분배기 교체	아트 ENG	2		무상	-									
25	4월 2일	8-305	x	주방	8동 305호 주방 5구 난방분배기 교체	아트 ENG	2		무상	-									
26	4월 3일	5-104	x	주방	5동 104호 주방 난방분배기(리턴) 바닥매립 난방배관 누수로 인한 배관 보수	아트 ENG	2		이월	-							1	1	
										집계 ↑	8	8	1	4	-	4	4	5	

▶ 자재 및 인건비 보정 : 1,746,217 (위생공으로 보정)

▶ 차액 : 12,000
(간접비포함)

No.	☐	상태	*표준내역 코드▲	*세부공종	*품명	*규격	*단위	*수량	노무비	
									단가	금액
			직접공사비 합계							1,000,016
1	☐	☒	L002	유지관리(장비)	노무비	보통인부	인	1	161,858	161,858
2	☐	☒	L003	유지관리(장비)	노무비	특별인부	인	1	208,527	208,527
3	☐	☒	L039	유지관리(장비)	노무비	배관공	인	1	224,209	224,209
4	☐	☒	L042	유지관리(장비)	노무비	위생공	인	1	204,242	204,242
5	☐	☒	L044	유지관리(장비)	노무비	보온공	인	1	201,180	201,180

■ 낙찰목록 (1 건)

No.	☐	진행상태	매입계약 유형	계약방식	계약번호	공사번호	계약명	낙찰업체	계약금액	낙찰품의 번호	낙찰품의 완료일	계약체결 일자
1	☐	계약체결완료	유지관리	표준단가계약	FC24-000557	CI24-001099	[ESPR:92708453]기숙사 및 사택 긴급보수 직	(주)아트이엔지	8,897,000	RM00000511750	2024-01-18	2024-01-18

견 적 서

수신인 : 주식회사 에스엔아이 코퍼레이션
공사명 : 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)
견적일 : 2024 년 04월 20일

등록번호	513-81-40808
상 호	 (주)아트이엔지 CONSTRUCTION TECHNOLOGY
대표 이사	이 성 철 
사업장	경북 칠곡군 석적읍 동중리1길(중리 97-2)
업 태	건설업/제조업/도매및소매업
종 목	기계설비공사/플랜트구조물,철구조물/금속구조물,창호
TEL, FAX	☎(054)977-8100 FAX(054)977-8102

금액: 팔백구십만구천 원정

NO	품명	규격	수량	단위	금액	비고
	직접비					
	재료비					
	노무비				5,673,205	
	기계/기타경비				2,000,000	
	소계				7,673,205	
	간접비					
	국민연금	노무비*4.5%	1	식	255,294	모든공사에 적용
	건강보험료	노무비*3.495%	1	식	198,279	모든공사에 적용
	장기요양보험료	건강보험료*12.95%	1	식	25,677	모든공사에 적용
	고용보험료	노무비*1.01%	1	식	57,299	모든공사에 적용
	산재보험료	노무비*3.56%	1	식	201,966	모든공사에 적용
	산업안전보건관리비	(재료비+노무비)*2.93%	1	식	166,225	모든공사에 적용
	일반관리비/이윤	(노무비+간접공사비)*5%	1	식	328,897	
	소계				1,233,637	
					8,909,842	
	합계(단수조정)				8,909,000	
	VAT별도	상반기 매입 계약 체결			8,897,000	
		차액			12,000	

▼낙찰율

▼낙찰율

합계	주요내역		단위	수량	노무비		기타경비(부자재비)		합계	노무비 할증	할증기준
	품목	규격			단가	금액	단가	금액			
L039	긴급 보수 대응	배관공	인	8	224,209	1,793,672		-	1,793,672		
L042	긴급 보수 대응	위생공	인	8.5	204,242	1,736,057		-	1,736,057	자재비 보정	
L044	긴급 보수 대응	보온공	인	1	201,180	201,180		-	201,180		
L002	긴급 보수 대응	보통인부	인	8	161,858	1,294,864		-	1,294,864		
L002	긴급 보수 대응	화기감시자 (보통인부)	인	4	161,858	647,432		-	647,432		
L002	긴급 보수 대응	안전관찰자 (보통인부)	인	-	161,858	-		-	-		
	누수탐지 및 보수 작업	누수탐지 및 보수	건	4		-	500,000	2,000,000	2,000,000	누수탐지 정산	
						-		-	-		

5,673,205

2,000,000

7,673,205

투입 자재비 : 1,746,217원

9동 106호,205호 : 110만원+8동 109호 : 60만원+8동 506호 : 30만원 = 200만원

합 계	주요 내역		단 위	수 량	재료비	
	품 목	규 격			품셈/표단	금액
	기숙사 사택 긴급보수 작업(기계)					
	-9동 205호 화장실문 입구 바닥 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감작업 (01월 18일)					-
L002	보통인부	화기감시자	인	1.0		-
E999999	누수탐지	누수탐지 작업 및 보수	식	1.0		-
	-9동 106호 화장실 샤워위전아래 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감작업 (01월 19일)					-
L002	보통인부	화기감시자	인	1.0		-
E999999	누수탐지	누수탐지 작업 및 보수	식	1.0		-
	-8동 109호 화장실 양변기뒤 온수배관 엘보 누수로 용접 및 마감작업 (02월 05일)					-
L002	보통인부	화기감시자	인	1.0		-
E999999	누수탐지	누수탐지 작업 및 보수	식	1.0		-
	-9동 406호 주방 5구 난방분배기 교체 (02월 06일)					-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	10.0	3,000	26,400
L039	배관공	최소인건비	인	1.0		-
L002	보통인부	최소인건비	인	1.0		-
E999999	STS온수분배기	5구	개	1.0	92,000	92,000
	-AB동 지하기게실 금탕대류펌프(예비2번) 보수작업 (02월 06일)					-
E999999	펌프 메카니칼셀	22mm 2HP용	Set	1.0	132,000	132,000
E999999	모터 베어링	6305zz6204zz	Set	1.0	45,000	45,000
E999999	펌프 케이스 패킹	1.5KW2HP	Set	1.0	10,000	10,000
E999999	펌프 임펠러	1.5KW2HP	Set	1.0	145,000	145,000
L039	배관공	최소인건비	인	2.0		-
	-AB동 1층 공용 남자화장실 소변기(지하주차장 상부) 배관 교체 및 소변기 설치 (02월 06일)					-
M030200400300701	경질염화비닐관(일반용배수관)-VG1 (두꺼운 관)	호칭경50mm, 외경60mm, 두께4.1(최소)mm, 중량4.488g/보	본	1.0	17,900	15,752
M030200700400301	PVC이음관-90°엘보(DL)	50mm(DRF)	개	4.0	2,370	8,342
	-AB동 지하주차장 램프 구간 천장 오수배관 PPI DRF 원터치 Y 소켓 100A PVC 이음관 3개 교체 (02월 13일)					-
M030200700601101	PVC이음관-와이(Y)	100X100(DRF)	개	3.0	14,100	37,224
L039	배관공	최소인건비	인	1.0		-
L002	보통인부	최소인건비	인	3.0		-
	-8동 408호 주방 5구 난방분배기 교체 (02월 13일)					-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	10.0	3,000	26,400
E999999	STS온수분배기	5구	개	1.0	92,000	92,000
	-5동 301호 주방 4구 난방분배기 교체 (02월 14일)					-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	8.0	3,000	21,120
L039	배관공	최소인건비	인	1.0		-
L002	보통인부	최소인건비	인	1.0		-
E999999	STS온수분배기	4구	개	1.0	62,000	62,000
	-5동 404호 주방 4구 난방분배기 교체 (02월 14일)					-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	8.0	3,000	21,120
E999999	STS온수분배기	4구	개	1.0	62,000	62,000
	-AB동 지하주차장 램프 구간 천장 오수배관 교체 한 부분 보온작업 (02월 21일)					-
M031000100120101	가교발포폴리에틸렌보온재	카이론, 20T 난연, 강관 100	m	3.0	3,970	10,481
M031002001100101	매직테이프(난열,내열)	0.20mm X 4' X 15m	R/L	4.0	1,950	6,864
L044	보온공	최소인건비	인	1.0		-
L002	보통인부	최소인건비	인	1.0		-
	-5동 205호 화장실 양변기 교체 (02월 21일)					-
M030700100501101	절수형서양식탱크밀결형사이편변기	㉔1210CR, C-1051F(치마형)	조	1.0	219,000	192,720
M023900404700101	백시멘트	내장 줄눈 전용, 20kg	포	1.0	7,000	6,160
	-5동 205호 주방 4구 난방분배기 교체 (02월 26일)					-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	8.0	3,000	21,120
L039	배관공	최소인건비	인	1.0		-
L002	보통인부	최소인건비	인	1.0		-
E999999	STS온수분배기	4구	개	1.0	62,000	62,000

	주요 내역			단위	수량	재료비	
합 계	품 목	규격	품셈/표단			금액	
	-8-506호 작년 주방 누수 보수한 배관부위 미세하게 비쳐서 부속 조이고 미장처리함 (02월 27일)						-
E999999	누수탐지	누수탐지 작업 및 보수	식	1.0		-	
	-3동 지하 기계실 난방배관 누수로 인하여 배관 보수 (02월 27일)						-
L039	배관공	최소인건비	인	1.0		-	
L002	보통인부	최소인건비	인	1.0		-	
L002	보통인부	화기감시자	인	1.0		-	
	-5동 402호 주방 4구 난방분배기 교체 (03월 06일)						-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414	
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	8.0	3,000	21,120	
L039	배관공	최소인건비	인	1.0		-	
L002	보통인부	최소인건비	인	1.0		-	
E999999	STS온수분배기	4구	개	1.0	62,000	62,000	
	-9동 104호 주방 5구 난방분배기 교체 (03월 06일)						-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414	
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	10.0	3,000	26,400	
E999999	STS온수분배기	5구	개	1.0	92,000	92,000	
	-3동 지하 기계실 난방배관 보수부위 보온작업 (2.27 작업건 마무리 작업) (03월 06일)						-
M031000300100801	유리면 크린 파이프커버	파이프외경 80mm, Cover두께 25mm	m	1.0	4,520	3,978	
M031000300100601	유리면 크린 파이프커버	파이프외경 50mm, Cover두께 25mm	m	1.0	3,610	3,177	
M031000300100301	유리면 크린 파이프커버	파이프외경 25mm, Cover두께 25mm	m	1.0	2,110	1,857	
M031002001100101	매직테이프(난열,내열)	0.20mm× 4'× 15m	R/L	3.0	1,950	5,148	
	-1. 8동 210호 주방 5구 난방분배기 교체(완료) (03월 07일)						-
	2.. 앞,뒤베란다 수전배관(3개)및 배관부분 교체작업(미완료) 철거만 진행(배관부속 없어서 익일진행예정)						-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414	
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	10.0	3,000	26,400	
L039	배관공	최소인건비	인	1.0		-	
L002	보통인부	최소인건비	인	1.0		-	
E999999	STS온수분배기	5구	개	1.0	92,000	92,000	
	-8동 201호 앞뒤베란다 수전배관 부분 교체, 철거부분 미장작업(수전3개는 도색공사 완료후 설치예정) (03월 08일)						-
M030111300105101	황동이음식	링타입 C×F링 직, 20mm	개	3.0	6,250	16,500	
L039	배관공	최소인건비	인	1.0		-	
L002	보통인부	최소인건비	인	1.0		-	
	-2동 306호 난방분배기(마감캡 부식으로 교체) 보수 (04월 02일)						-
M030111400106201	황동이음식	플러그, 25mm	개	1.0	2,740	2,411	
L039	배관공	최소인건비	인	1.0		-	
L002	보통인부	최소인건비	인	1.0		-	
	-2동 402호 주방 4구 난방분배기 교체 (04월 02일)						-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414	
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	8.0	3,000	21,120	
E999999	STS온수분배기	4구	개	1.0	62,000	62,000	
	-5동 104호 주방 4구 난방분배기 교체 (04월 02일)						-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414	
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	8.0	3,000	21,120	
E999999	STS온수분배기	4구	개	1.0	62,000	62,000	
	-8동 305호 주방 5구 난방분배기 교체 (04월 02일)						-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414	
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	10.0	3,000	26,400	
E999999	STS온수분배기	5구	개	1.0	92,000	92,000	
	-5동 104호 주방 난방분배기(리턴) 바닥매립 난방배관 누수로 인한 배관 보수 (04월 02일)						-
M030216100100201	XL온돌파이프	ø15	m	1.0	470	414	
M030216200101201	XL온돌파이프이음관	유니온, ø15	개	1.0	3,000	2,640	
M023900409400101	미장용 레미탈	대외벽 일반 초벌, 정벌 마감용, 40kg	포	1.0	6,000	5,280	
L039	배관공	최소인건비	인	1.0		-	
L002	보통인부	최소인건비	인	1.0		-	
							-
							1,746,217

수정 전자세금계산서					승인번호		20240122-10240122-29980062			
공급자	등록번호	305-10-35096		종사업장번호		등록번호	513-81-40808		종사업장번호	
	상호(법인명)	대전누수 탐지미래설비		성명	조석철	상호(법인명)	(주)아트이엔지		성명	이성철
	사업장	대전광역시 동구 옛신탄진로55번길 30-1(홍도동)				사업장	경상북도 칠곡군 석척읍 동죽리1길 77			
	업태	건설업	종목	수도설비, 누수탐지, 수도설비 노후배관교체, 하수구뚫음, 고압세척, 욕실리모델링		업태	건설업	종목	기계설비공사	
	이메일	jsch59@naver.com				이메일	art3434@hanmail.net			
					공급받는자					
작성일자		공급가액			세액		수정사유			
2024/01/22		1,100,000			110,000		기재사항 착오정정			
비고		당초 승인번호 (20240122-10240122-29866143)								
월	일	품목			규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
01	19	엘지시택9동106호205호누수탐지					1,100,000	1,100,000	110,000	
합계금액		현금	수표	어음	외상미수금		이 금액을 (청구) 함			
1,210,000										



본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 발급 또는 전송 입력된 전자(세금)계산서입니다. 발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급>전자세금계산서>제3자 발급사실 조회"를 이용하시기 바랍니다.

전자세금계산서					승인번호		20240205-10240205-44384041				
공급자	등록번호	305-10-35096		종사업장번호		수요자	등록번호	513-81-40808		종사업장번호	
	상호 (법인명)	대전누수 탐지미래설비		성명	조석철		상호 (법인명)	(주)아트이엔지		성명	이성철
	사업장	대전광역시 동구 옛신탄진로55번길 30-1(홍도동)					사업장	경상북도 칠곡군 석척읍 동죽리1길 77			
	업태	건설업	종목	수도설비, 누수탐지, 수도설비 노후배관교체, 하수구뚫음, 고압세척, 욕실리모델링			업태	건설업	종목	기계설비공사	
	이메일	jsch59@naver.com					이메일	art3434@hanmail.net			
작성일자		공급가액			세액			수정사유			
2024/02/05		600,000			60,000						
비고											
월	일	품목			규격	수량	단가	공급가액	세액	비고	
02	05	엘지시택 8동109호 누수탐지					600,000	600,000	60,000		
합계금액		현금	수표	어음	외상미수금		이 금액을 (청구) 함				
660,000											



본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 발급 또는 전송 입력된 전자(세금)계산서입니다. 발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급>전자세금계산서>제3자 발급사실 조회"를 이용하시기 바랍니다.

거래명세서

(주)아트이엔지 貴 中

공 급 자	일련번호	2024/04/01 -16	TEL	042-626-1008
	사업자등록 번호	305-81-83453	성명	서준식
	상호	(주)세한상사		
	주소	대전광역시 대덕구 대전로 1076(오정동)		

금 액 : 이십삼만칠천육백원 정

(W237,600)

[illegible]

수량	3	공급가액	216,000	VAT	21,600	합계	237,600	인수	인
비고									

전자세금계산서					승인번호		20240227-10240227-60810366						
공급자	등록번호	305-10-35096		종사업장번호			공급받는자	등록번호	513-81-40808		종사업장번호		
	상호 (법인명)	대전누수 탐지미래설비		성명	조석철			상호 (법인명)	(주)아트이엔지		성명	이성철	
	사업장	대전광역시 동구 옛신탄진로55번길 30-1(홍도동)				사업장		경상북도 칠곡군 석척읍 동족리1길 77					
	업태	건설업	종목	수도설비, 누수탐지, 수도설비 노후배관교체, 하수구뚫음, 고압세척, 욕실리모델링		업태		건설업	종목	기계설비공사			
	이메일	jsch59@naver.com				이메일		art3434@hanmail.net					
작성일자		공급가액		세액		수정사유							
2024/ 02/ 27		300,000		30,000									
비고													
월	일	품목			규격	수량	단가	공급가액	세액	비고			
02	27	엘지시택 8동506호 누수검사					300,000	300,000	30,000				
합계금액		현금	수표	어음		외상미수금		이 금액을 (청구) 함					
330,000													

거래명세서

공 급 자	일련번호	2024/02/05 -24	TEL	042-626-1008
	사업자등록 번호	305-81-83453	성명	서준필
	상호	(주)세한상사		
	주소	대전광역시 대덕구 대전로 1076(오정동)		

금 액 : 일십만일천이백원 정

[illegible]

거래명세표

발행번호 : 20240206-002

㈜아트이엔지

貴下

신 흥 산 업 전기

<등록번호 306-02-66374>

代表 김 성 완



본사/공장 : 대전광역시 대덕구 오정동 427-16

T E L. : 042-285-3569 F A X. : 042-285-3519

E-Mail : ksw6374@hanmail.net

담당자: 대표 김 성 완 010-5407-2195

발행일	2024년 02월 06일
발주담당	김영배 부장님
연락처	010-7537-7504
인도장소	발주처 지정장소
납품방법	현장배송

아래와 같이 공급 합니다.

공금가액 : 일금 삼십삼만이천원정

(₩332,000)

부가세별도

품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
펌프 메카니칼씰	22mm 2HP용	1	Set	132,000	132,000	
모터 베어링	6305zz6204zz	1	Set	45,000	45,000	
펌프 케이스 패킹	1.5KW2HP	1	Set	10,000	10,000	
펌프 임펠러	1.5KW2HP	1	Set	145,000	145,000	
합계					332,000	

거래명세서

(주)아트이엔지 貴 中

공 급 자	일련번호	2024/03/05 -03	TEL	042-626-1008
	사업자등록 번호	305-81-83453	성명	서준우
	상호	(주)세한상사		
	주소	대전광역시 대덕구 대전로 1076(오정동)		

금 액 : 일십육만구천사백원 정

(₩169,400)

[illegible]

거래명세서

(주)아트이엔지 貴 中

공 급 자	일련번호	2024/03/06 -08	TEL	042-626-1008
	사업자등록 번호	305-81-83453	성명	서준우 
	상호	(주)세한상사		
	주소	대전광역시 대덕구 대전로 1076(오정동)		

금 액 : 일십만일천이백원 정

(W101,200)

[illegible]

목 록

01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)).....	1
02완료사진_(기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)).....	2
03완료사진_(기숙사 3동 및 사택 102동 부스터 펌프용 압력탱크 교체).....	7
04완료사진_(사택 5-104 화장실 이중천장 설치 및 돔천장 교체).....	11
05완료사진_(사택 5-104 화장실 이중천장 유도배관 및 오배수 교체).....	12
06완료사진_(사택 2-101 수장공사).....	14
07완료사진_(사택 8-210 수장공사).....	15
08완료사진_(사택 103-101 수장공사).....	16
09완료사진_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체).....	17
10완료사진_(기숙사 A동 301-2호 도배보수의 9세대).....	28
11완료사진_(기숙사 3동 급탕 순환 펌프 교체).....	29
12완료사진_(사택 7-508 외벽세대 단열작업).....	30
13완료사진_(사택 9-505 베란다 다용도실 및 뒷 베란다 단열).....	31
14완료사진_(임차사택 수장공사 김상우(Cell선행)).....	32

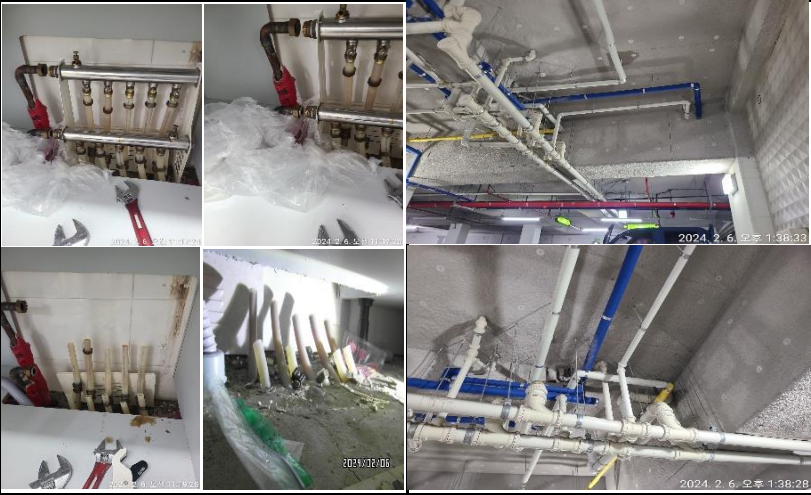
공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.01.25- 2024.04.08
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)		제출일자	2024.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업전)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	보수(작업후)

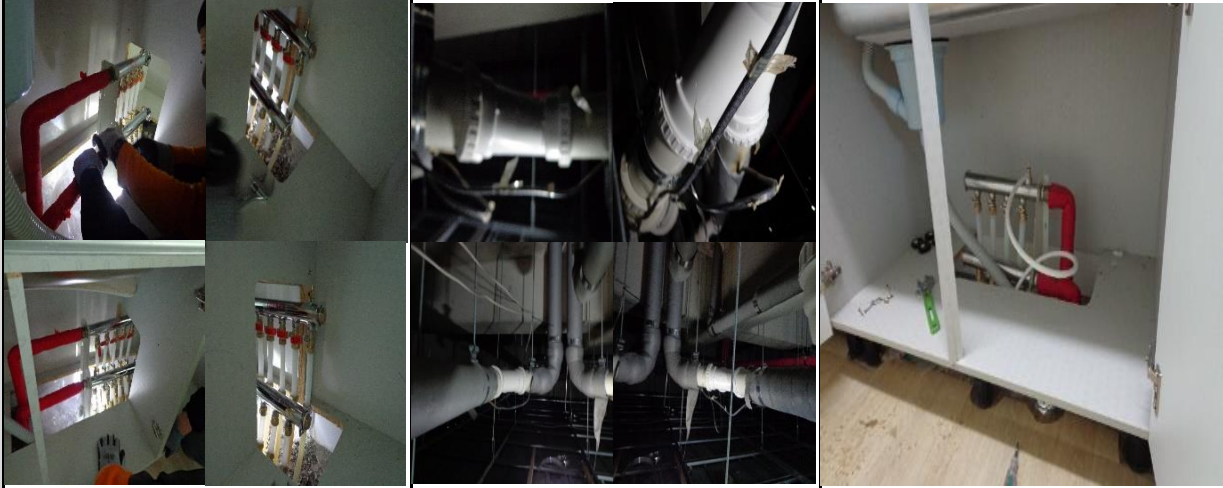
공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	01월 18,19일, 2월 05,06, 13,14,21,26,27일, 3월 06일
공 사 명	[ESPR:92708453]기숙사 및 사택 긴급보수 작업 (기계)	제출일자	2024/05/16
작업사진 (전)			
내 용	작업 전 01/18	작업 전 01/19	작업 전 02/05
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	01월 18,19일, 2월 05,06, 13,14,21,26,27일, 3월 06일
공 사 명	[ESPR:92708453]기숙사 및 사택 긴급보수 작업 (기계)		제출일자	2024/04/18
작업사진 (전)				
내 용	작업 전 02/06		작업 전 02/06	
작업사진 (중)				
내 용	작업 중		작업 중	
작업사진 (후)				
내 용	작업 후		작업 후	

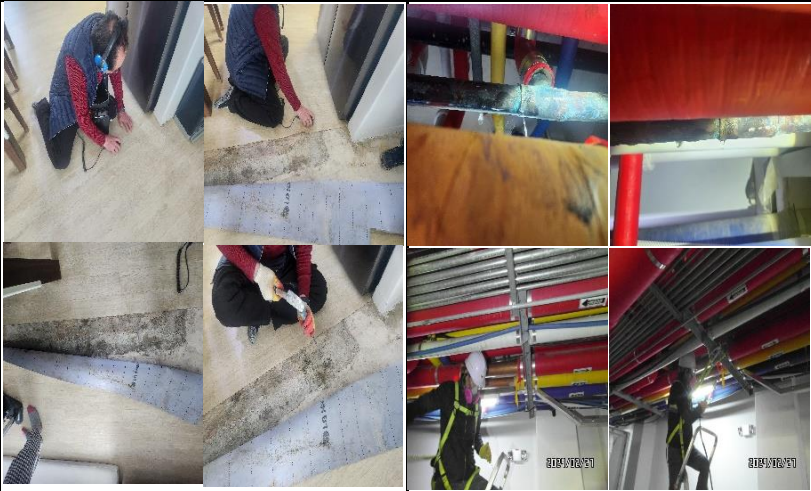
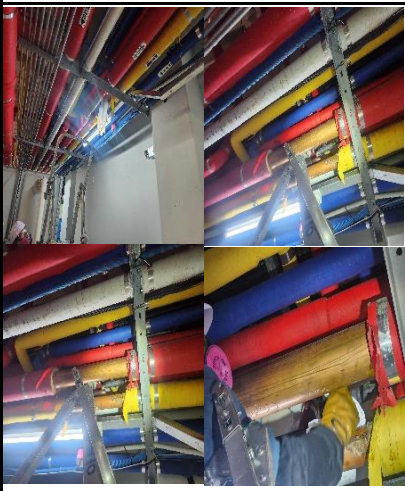
공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	01월 18,19일, 2월 05,06, 13,14,21,26,27일, 3월 06일
공 사 명	[ESPR:92708453]기숙사 및 사택 긴급보수 작업 (기계)	제출일자	2024/04/18
작업사진 (전)			
내 용	작업 전 02/13	작업 전 02/13	작업 전 2/14
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중 2/21	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	01월 18,19일, 2월 05,06, 13,14,21,26,27일, 3월 06일
공 사 명	[ESPR:92708453]기숙사 및 사택 긴급보수 작업 (기계)		제출일자	2024/04/18
작업사진 (전)				
				
				
				
내 용	작업 전 02/14		작업 전 02/21	
작업사진 (중)				
				
				
				
내 용	작업 중		작업 중	
작업사진 (후)				
				
				
				
내 용	작업 후		작업 후	

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	01월 18,19일, 2월 05,06, 13,14,21,26,27일, 3월 06일
공 사 명	[ESPR:92708453]기숙사 및 사택 긴급보수 작업 (기계)	제출일자	2024/04/18
작업사진 (전)			
내 용	작업 전 02/27	작업 전 02/27	작업 전 03/06
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

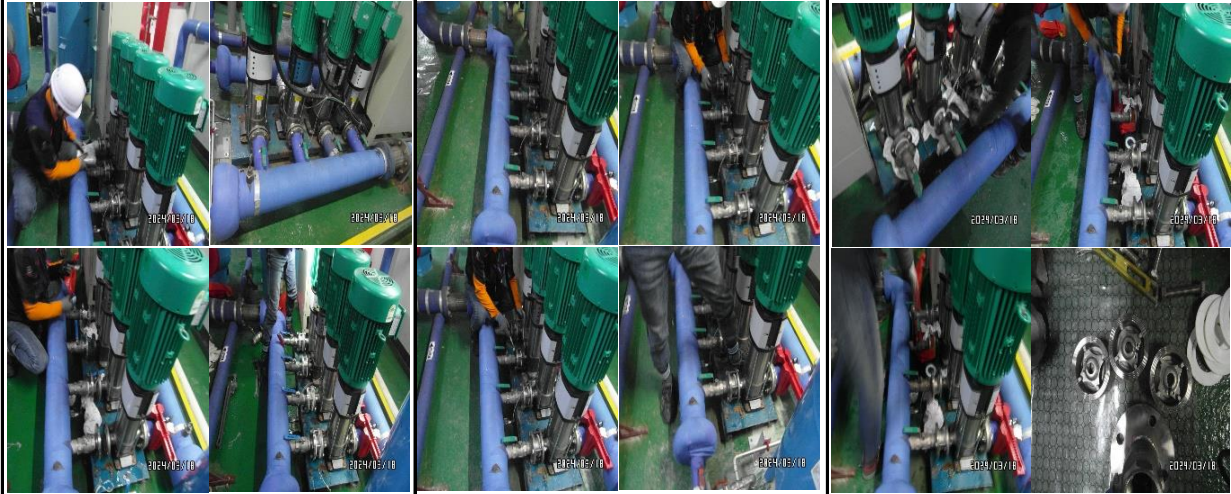
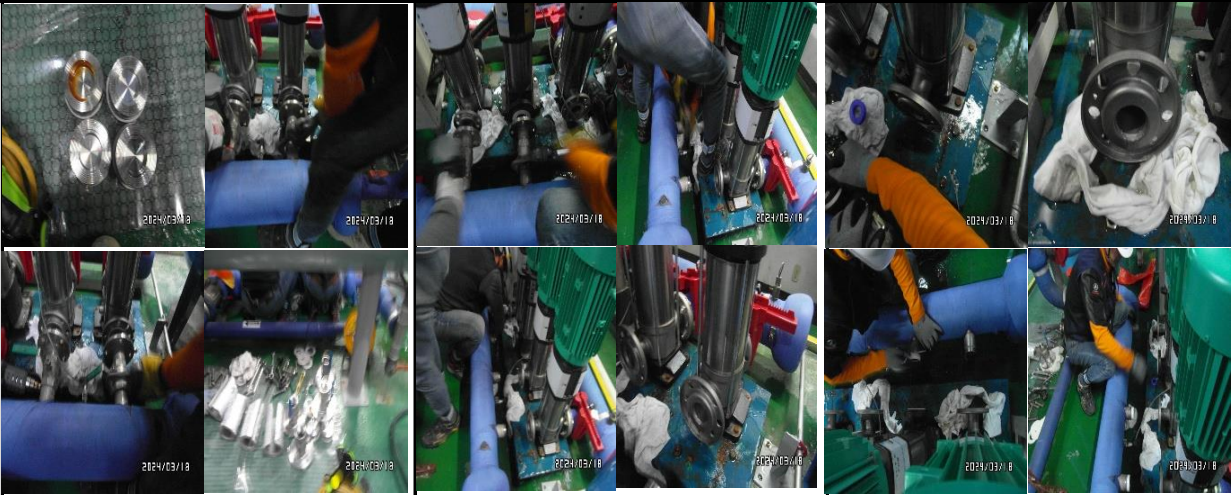
공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	3월 15일, 18일
공 사 명	[ESPR:92716694]기숙사 3동 및 사택 102동 부스터 펌프용 압력탱크 교체	제출일자	2024/05/16
작업사진 (전)	 2024/03/15	 2024/03/15	 2024/03/15
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)	 2024/03/15	 2024/03/15	 2024/03/15
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)	 2024/03/15	 2024/03/15	 2024/03/15
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	3월 15일, 18일
공 사 명	[ESPR:92716694]기숙사 3동 및 사택 102동 부스터 펌프용 압력탱크 교체	제출일자	2024/05/16
작업사진 (전)	  		
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)	     		
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)	  		
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	3월 15일, 18일
공 사 명	[ESPR:92716694]기숙사 3동 및 사택 102동 부스 터 펌프용 압력탱크 교체	제출일자	2024/05/16
작업사진 (전)			
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후



공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	3월 15일, 18일
공 사 명	[ESPR:92716694]기숙사 3동 및 사택 102동 부스 터 펌프용 압력탱크 교체	제출일자	2024/05/16
작업사진 (전)			
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.03.22- 2024.04.17
공 사 명	사택 5-104 화장실 이중천장 설치및 돔천장 교체		제출일자	2024.05.20
작업사진				
내 용	설치(작업전)		차수판(설치후)	돔천장(설치중)
작업사진				
내 용	설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지		공사일자	04월 04일,08일,16일
공 사 명	[ESPR:92718716]사택 5-104 화장실 이중천장 유 도배관 및 오배수 교체		제출일자	2024/05/16
작업사진 (전)	  			
내 용	작업 전		작업 전	작업 전
작업사진 (중)	           			
내 용	작업 중		작업 중	작업 중
작업사진 (후)	           			
내 용	작업 후		작업 후	작업 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	04월 04일,08일,16일
공 사 명	[ESPR:92718716]사택 5-104 화장실 이중천장 유 도배관 및 오배수 교체	제출일자	2024/05/16
작업사진 (전)			
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)			
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)			
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.04.03- 2024.04.16
공 사 명	사택 2-101 수장공사		제출일자	2024.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.04.04- 2024.04.15
공 사 명	사택 8-210 수장공사		제출일자	2024.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.04.03- 2024.04.08
공 사 명	사택 103-101 수장공사		제출일자	2024.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

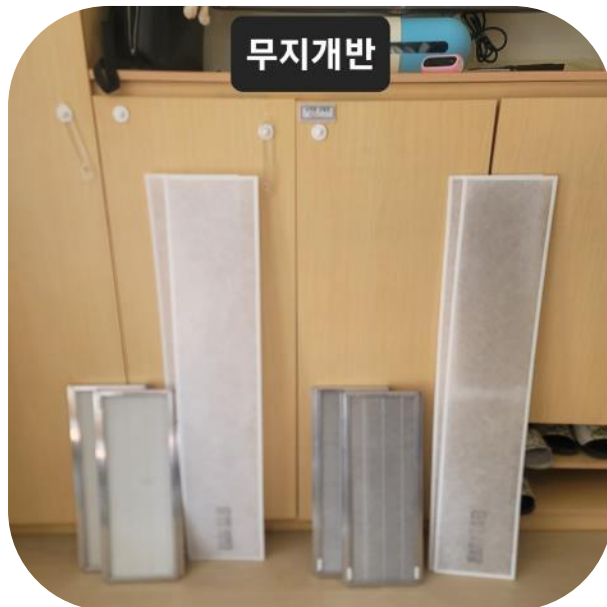
교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
달님반	40.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	22.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8:40	17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-23.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	30.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8:40	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-22.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
해님반	35.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8:40	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	29.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8:40	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	25.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8:40	19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	31.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8:40	22.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8:40	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8:40	2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교사실	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8:40	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
원장실	38.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8:40	23.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	26.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8:40	14.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-7.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 49 PM2.5기준 37 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : `24.04.27 / 권용주 매니저

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

전열교환기 필터 교체 작업 준비 및 교체품 사진



교사실



해님반



달님반



별님반

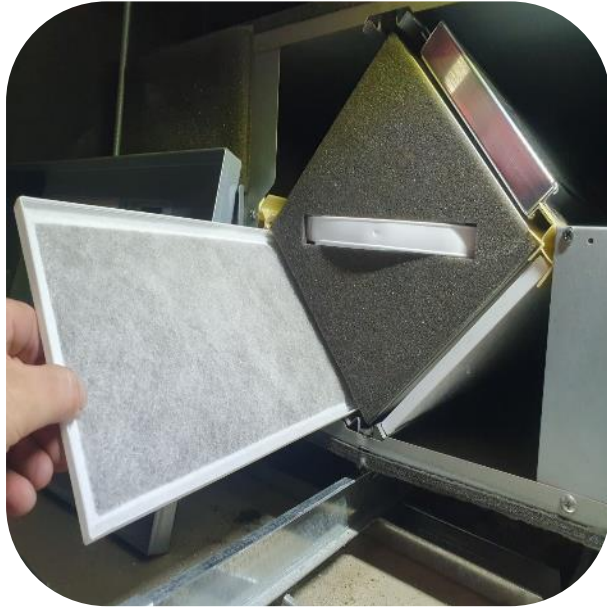


유희실



창조교실





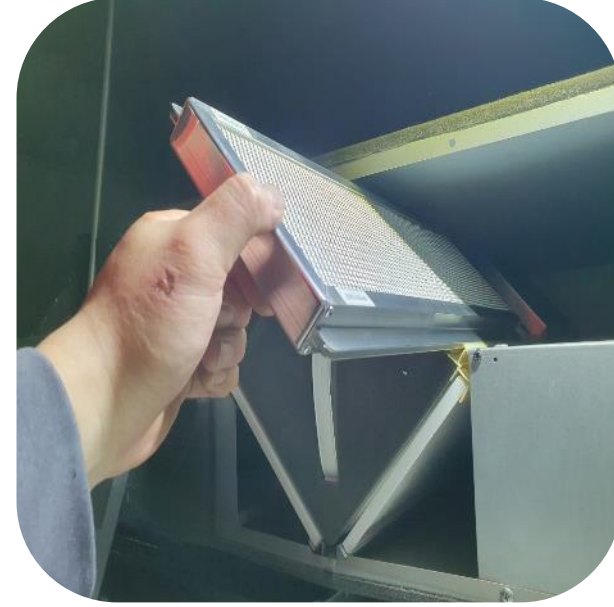
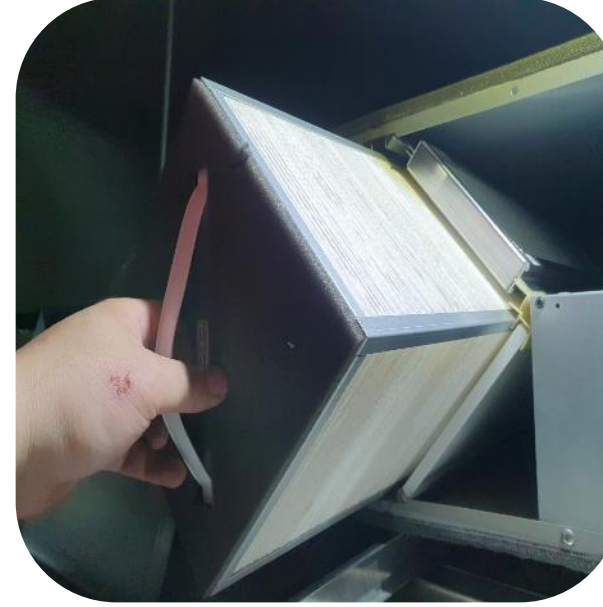
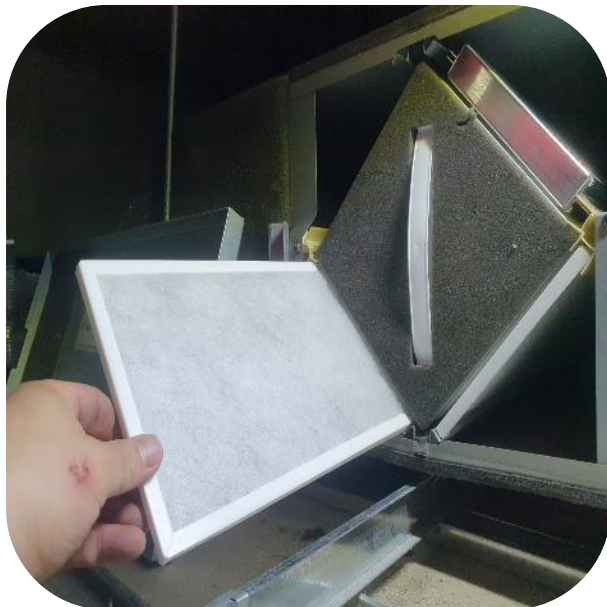
오염 필터 제거



필터 조립



고효율 필터 조립







에어세척 전



에어세척 중



에어세척 후



작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



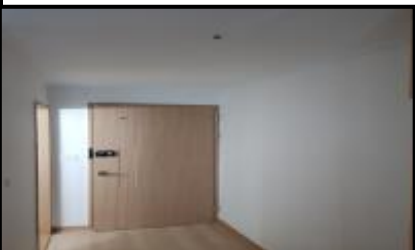
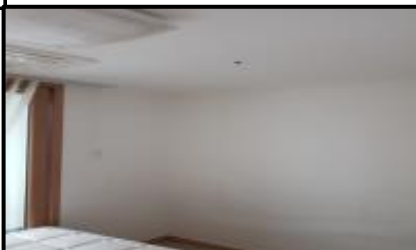
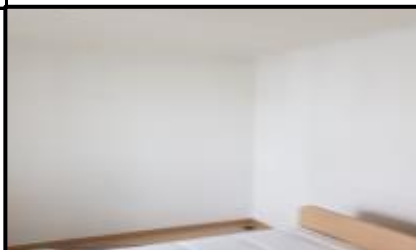
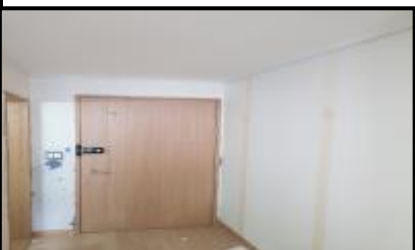
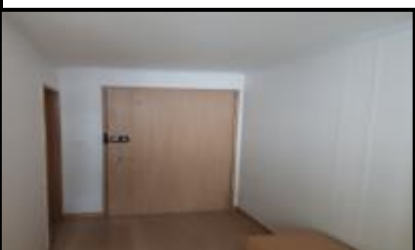
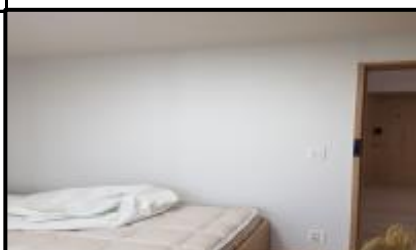
작업 후




원장실



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.04.15- 2024.04.29
공 사 명	기숙사 A동 301-2호 도배보수외 9세대		제출일자	2024.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)

공사 완료 사진

업 체 명	(주)아트이엔지	공사일자	04월 16일
공 사 명	[ESPR:92722370]기숙사 3동 급탕 순환 펌프 교체	제출일자	2024/05/16
작업사진 (전)			
내 용	작업 전	작업 전	작업 전
작업사진 (중)	     	   	 
내 용	작업 중	작업 중	작업 중
작업사진 (후)	   		
내 용	작업 후	작업 후	작업 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.04.09 - 2024.05.08
공 사 명	사택 7-508 외벽세대 단열작업		제출일자	2024.05.20
작업사진				
내 용	철거(작업후)		철거(작업후)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.04.26 - 2024.04.30
공 사 명	사택 9-505 베란다 다용도실 및 뒷 베란다 단열		제출일자	2024.05.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2024.04.03 - 2024.04.03
공 사 명	임차사택 수장공사 김상우(Cell 선행)		제출일자	2024.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

내역서

품명	규격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 김상우(Cell 선행)										
1.도배	거실 벽면	㎡	40	1,086	43,440	5,587	223,480		266,920	광복합지 벽지(LX하우시스, 휘양세), 23년 11월 물가자료
	거실 천정	㎡	24	1,086	26,064	7,263	174,312		200,376	
	방A 벽면	㎡	32	1,086	34,752	5,587	178,784		213,536	
	방A 천정	㎡	16	1,086	17,376	7,263	116,208		133,584	
	방B 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825	
	방B 천정	㎡	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839	
	방C 벽면	㎡	25	1,086	27,150	5,587	139,675		166,825	
	방C 천정	㎡	11	1,086	11,946	7,263	79,893		91,839	
	벽지 패어내기 40% 적용	㎡	74			1,351	99,434		99,434	
소 계			184		199,824		1,231,354		1,431,178	
2.바닥재	거실 바닥 칠거	㎡	15							LX하우시스, 청맥 1.8T
	방A 바닥 칠거	㎡	8							
	방B 바닥 칠거	㎡	7							
	방C 바닥 칠거	㎡	6							
	접착제(부분접착)	kg	4							
	거실 바닥	㎡	15							
	방A 바닥	㎡	8							
	방B 바닥	㎡	7							
	방C 바닥	㎡	6							
소 계			36		0		0		0	
합 계					199,824		1,231,354		1,431,178	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,706,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명:

김상우

근무부서:

실QC

전화번호:

010 3790

사택명:

35원

선정기술팀

7167

수장공사 체크리스트

2 동 101 호 20평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌름, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-6개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 거실(좌측방,우측방)불박이장 단열재 재시공, 주방(렌지후드)교체, 싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장포함)전체교체(하부장옆판(2개)포함)), 앞,뒤베란다(벽면,창틀)전체크랙보수, 거실좌측방 창틀 몰딩 전체교체, 거실걸레받이 보수 또는 교체, 문골림-2개(거실우측방문, 뒤베란다문), 빨래건조대설치		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 5 월 2 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

수장공사 체크리스트

8 동 210 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방(싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장포함)전체교체, 난방분배기교체), 화장실타일 부분교체, 앞, 뒤베란다 냉수, 온수 배관(3개)교체, 문걸림-2개(화장실 좌측방문, 화장실 우측방문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2024 년 5 월 2 일					
현장점검인		이정호 점검인 (인)					
최종점검인		김태현 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

103 동 101 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찌힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥몰딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	주방좌측방 창문천정 누수점검 및 보수, 현관바닥타일 보수 또는 교체, 싱크대 하부장 슬라이드 레일보수, 거실화장실 욕조 배수관 교체, 거실 및 뒤베란다 창문시트지 제거, 거실우측방 불박이장 옷걸이 스테봉(1개)설치		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2024 년 5 월 2 일

현장점검인

이광호 점검인 (인)

최종점검인

남태원 점검인 (인)
