기숙사 및 사택 4월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
				7,010,000	6,314,550	==>일성-일반(3 건)	-11%
				13,471,000	10,360,850	==>동운(2 건)	-30%
				20,481,000	**16,675,400**	**4월 마감건(5 건)**	**-23%**
1	04월30일	사택 104-401 수장공사	■ 작업축소에 따른 감액PO 전: PO 5,051,425 후: PO 4,584,875 사유: 앞뒷 베란다 도장 작업 취소	5,221,000	4,584,875	일성건축	-14%
2	04월30일	기숙사 B동 503-2호 도배보수		682,000	657,900	일성건축	-4%
3	04월30일	사택 1-106 안방 단열작업		1,107,000	1,071,775	일성건축	-3%
4	04월30일	사택 1동 배수관로 내시경 촬영 및 고압세척	■ 작업증가에 따른 증액PO 전: PO 3,342,175 후: PO 4,000,075 사유: 오수 폐수량이 많아 처리비 증액	4,016,000	4,000,075	동운	-0.4%
5	04월30일	사택 1동 지하 1층 드레인 배관 교체 작업	■ 작업축소에 따른 감액PO 전: PO 7,976,500 후: PO 6,360,775 사유: 교체배관 축소 비용 감액	9,455,000	6,360,775	동운	-49%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.12.13- 2022.12.19
공 사 명	사택 104-401 수장공사	제출일자	2023.03.16
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	문보수(작업전)
작업사진			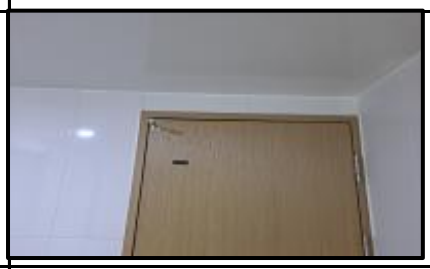
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	문보수(작업후)
작업사진			
내 용	보수(작업전)		
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_104동-401호 (23.01.31)- 입주								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	85	V				
	거실 천정(석고보드면)	㎡	40	V				
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	38	V				
	방A 천정(석고보드면)	㎡	10	V				
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	32	V				
	방B 천정(석고보드면)	㎡	8	V				
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	31	V				
	방C 천정(석고보드면)	㎡	8	V				
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	27	V				
	방A 바닥(부분접착)	㎡	9	V				
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	V				
	방C 바닥(부분접착)	㎡	7	V				
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	17					
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	70	V				
5.기타	주방우측방 단열재 교체, 씽크대 가스렌지 하부장 탈락보수, 방문끌림(3곳) 안방화장실 문끌림(1곳)			V				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SN! : 이종근 (인)							

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.02.24- 2023.02.24
공 사 명	기숙사 B동 503-2호 도배보수	제출일자	2023.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	문보수(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	문보수(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2023.03.21 - 2023.03.22
공 사 명	사택 1-106 안방 단열작업	제출일자	2023.04.20

작업사진			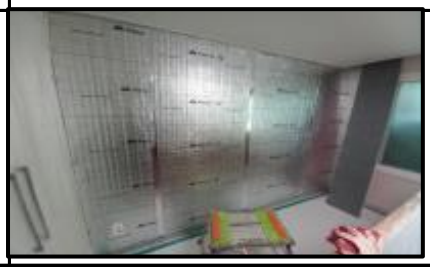
내 용	단열(작업전)	곰팡이 제거(작업후)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업후)	도배(작업전)	도배(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023.03.17
공 사 명	사택1동 배수관로 내시경 촬영 및 고압세척		제출일자	2023.03.29
작업사진		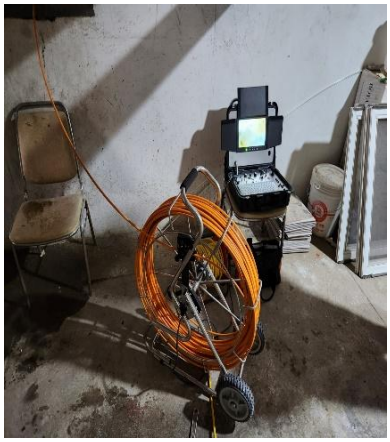		
내 용	내시경 촬영 작업	내시경 촬영 작업		내시경 촬영 작업
작업사진				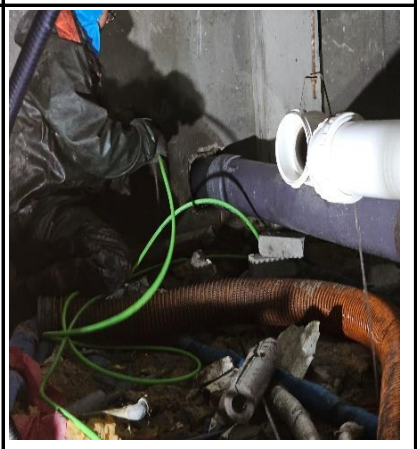
내 용	고압세척 작업	고압세척 작업		고압세척 작업
작업사진				
내 용	준설작업	준설작업		준설작업

관 련 서 류

하 수 관 거 이 상 조 사 종 합 집 계 표

공 사 명	사택1동 배수관로 내시경 촬영 및 고압세척				
발 주 처	LG화학	조 사 자	(주)동운		
공 사 기 간	2023-03-17 ~ 2023-03-17	시 공 자			
총 촬영 거리	7.0 M	총 맨홀 거리	7.0 M		

이 상 항 목		A	B	C	소 계	합 계
연 결 관	연결관 돌출	0	0	0	0	0
	연결관접합부		0	0	0	
본 관 부	이 음 부	0	0	0	0	1
	침 입 수		0	0	0	
	유 출 수		0	0	0	
	부 식	0	0	0	0	
	관파손및균열	0	0	0	0	
	곡 관 로		0	0	0	
	관 침 하	0	0	0	0	
	타 관 통 과	0	0	0	0	
	폐 유 부 착		0	0	0	
	모르타르부착		0	0	0	
	토 사 퇴 적	0	0	0	0	
	기타 장애물		1	0	1	
	유하능력부족	0	0	0	0	
합 계		0	1	0	총 합 계 =>	1

하 수 관 거 이 상 조 사 집 계 표

번호범위: LG화학사택1동 지하 배관 - LG화학사택1동 지하 배관
검색결과: 1건

NO	관 로 번 호	시 작 맨 홀	끝 맨 홀	배수방식	관종	규격	촬영거리	이상항목															
								연결관					본관										
								연결관 돌출			연결관 접합부		이음부		침입수		유출수		부 식			관파손 및 균열	
								A	B	C	B	C	A	B	C	B	C	B	C	A	B	C	A	B	C
1	사택1동 지하 배관	사택1동 지하	외부라인	오수	PVC	100	07.0																		
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
소 계								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계							7.0	0			0		0		0		0		0			0			

관 련 서 류

하 수 관 거 이 상 조 사 집 계 표

-3-

번호범위: LG화학사택1동 지하 배관 - LG화학사택1동 지하 배관
검색결과: 1건

NO	관 로 번 호	시 작 맨 홀	끝 맨 홀	매수 방식	관종	규격	활영 거리	이상항목																	
								본관																	
								곡관로		관침하			타 관 통 과			폐 유 부 착			모르타르 부착			토 사 퇴 적			기 타 장애물			유하능력 부 족		
								B	C	A	B	C	A	B	C	B	C	B	C	B	C	A	B	C	B	C	A	B	C
1	사택1동 지하 배관	사택1동 지하	외부라인	오수	PVC	100	07.0																		1				
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													
30																													
소 계								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
합 계						7.0		0		0			0			0		0		0		0			1		0		

관 련 서 류

하수관거 종합 조사 보고서

공 사 명	사택1동 배수관로 대시경 촬영 및 고압세척				조사번호	LG화학 사택1동 지하 배관			
발 주 처	LG화학	시 공 자			공사기간	2023-03-17 ~ 2023-03-17			
조사위치	대전광역시 유성구 대덕대로603번길20 1동				조 사 자	(주)동운			
배수구역		처리구역			처리분구				
조사목적	기타	조사일자	2023-03-17						
관로번호	사택1동 지하 배관	관 종	PVC		규 격	100	배수방식	오수	
맨홀거리	7.0	펼쳐거리	7.0		CD 번 호		도면번호		

맨 홀 부	번 호	맨홀E.L	관저고	깊 이	맨홀뚜껑	인버트	유 황	X 좌표	Y 좌표	Z 좌표
시작맨홀	사택1동 지하				기타	무	상			
끝 맨 홀	외부라인				기타	무	하			
조사비고										

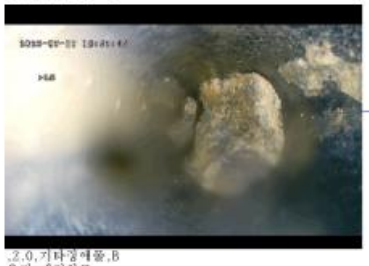

,2.0,기타침해물,B
유지 제거완료

,7.0,접속결함,

-1-

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2023-03-14
공 사 명	사택 1동 지하 1층 드레인 배관 교체		제출일자	2023-03-29
작업사진				
내 용	드레인 철거 전	드레인 철거 전	드레인 배관 철거 폐기	
작업사진				
내 용	신규 배관 준비	배관 자제 준비	배관 설치 중	
작업사진	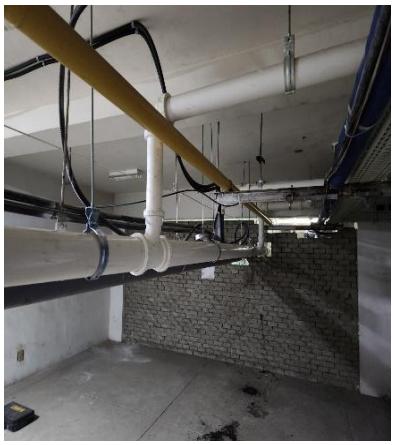			
내 용	배관 설치 중	배관 설치 중	배관 설치 완료	
